Id		Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Trabajos en Piso 13**	**25 días?**	**mié 21/10/09**	**mar 24/11/09**	
2		Inicio tareas piso 13	0 días	mié 21/10/09	mié 21/10/09	
3	✓	**Desmontajes y demoliciones**	**6 días?**	**mié 21/10/09**	**mié 28/10/09**	
4	✓	Retiro de mamparas y alfombras	2 días	mié 21/10/09	jue 22/10/09	2
5	✓	Desmontaje artefactos iluminación	2 días	mié 21/10/09	jue 22/10/09	2
6	✓	Desmontaje de puertas baños y placares	1 día	mié 21/10/09	mié 21/10/09	2
7	✓	Desconexionado y retiro artefactos sanitarios	1 día?	jue 22/10/09	jue 22/10/09	6
8	✓	Retiro divisores de baños	1 día	vie 23/10/09	vie 23/10/09	7
9	✓	Demolición cielorrasos	1 día	vie 23/10/09	vie 23/10/09	5
10	✓	Demolición mamposterias con adecuacion	3 días	lun 26/10/09	mié 28/10/09	9;7
11		**Obra gruesa**	**9 días**	**lun 26/10/09**	**jue 05/11/09**	
12		Nueva distribución de agua en baños	2 días	jue 29/10/09	vie 30/10/09	8;10
13		Refuerzos de mamposteria para inodoros	1 día	lun 26/10/09	lun 26/10/09	8
14		Nueva conexión cloacal en baños	2 días	mar 27/10/09	mié 28/10/09	13
15		Adecuación pisoducto	4 días	lun 26/10/09	jue 29/10/09	9
16		Adecuación instalacion electricidad baños	2 días	jue 29/10/09	vie 30/10/09	14
17		Nueva instalacion electricidad Kitchinette	1 día	jue 29/10/09	jue 29/10/09	10
18		Adecuación instalación electrica Fan coils	2 días	vie 30/10/09	lun 02/11/09	15
19		Cañeria instalacion deteccion de incendio y auto evacuación	5 días	mié 28/10/09	mar 03/11/09	9;15FC-2 días
20		Cañeria instalacion de alarma (Existente)	5 días	mié 28/10/09	mar 03/11/09	9;15FC-2 días
21		Cañeria instalacion control de accesos	5 días	mié 28/10/09	mar 03/11/09	9;15FC-2 días
22		Caneria instalacion de CCTV	5 días	mié 28/10/09	mar 03/11/09	9;15FC-2 días
23		Nueva cañeria de iluminacion en cielorraso	5 días	mié 28/10/09	mar 03/11/09	9;15FC-2 días
24		Extracción de baños	2 días	jue 29/10/09	vie 30/10/09	10
25		Adecuacion de Fan coils AA	4 días	lun 26/10/09	jue 29/10/09	9
26		Conductos de AA en cielorraso	5 días	vie 30/10/09	jue 05/11/09	15
27		**Obra fina**	**10 días**	**vie 30/10/09**	**jue 12/11/09**	
28		Revoque grueso e hidrofugo baños	3 días	lun 02/11/09	mié 04/11/09	16
29		Revoque grueso y fino kitchinette	2 días	vie 30/10/09	lun 02/11/09	17
30		Aislacion hidrofuga piso baños	1 día	jue 05/11/09	jue 05/11/09	28
31		Revestimiento y piso baños	3 días	vie 06/11/09	mar 10/11/09	30
32		Piso kitchinette	1 día	mar 03/11/09	mar 03/11/09	29
33		Cableado baños y kitchinette	1 día	mié 11/11/09	mié 11/11/09	31
34		Cableado instalaciones en cielorraso	3 días	mié 04/11/09	vie 06/11/09	23
35		Adecuacion muebles de madera para fan coil	5 días	mar 03/11/09	lun 09/11/09	18;25
36		Tabique durlok en pleno medianera	3 días	lun 09/11/09	mié 11/11/09	34
37		Colocacion de cielorrasos	4 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09	34
38		**Terminaciones**	**10 días**	**mié 11/11/09**	**mar 24/11/09**	
39		Colocación de puertas	1 día	mié 11/11/09	mié 11/11/09	31
40		Colocación de divisorios de baños	1 día	mié 11/11/09	mié 11/11/09	31
41		Colocacion de mesadas en baños	1 día	mié 11/11/09	mié 11/11/09	31
42		Colocación de nuevas mamparas	2 días	vie 13/11/09	lun 16/11/09	37
43		Colocacion de artefactos sanitarios	2 días	jue 12/11/09	vie 13/11/09	40
44		Colocacion de alfombra	3 días	vie 13/11/09	mar 17/11/09	37
45		Colocacion de zocalo de madera	1 día	mié 18/11/09	mié 18/11/09	44
46		Colocacion de artefactos de iluminación	3 días	mar 17/11/09	jue 19/11/09	44FC-1 día
47		Pintura	5 días	mar 17/11/09	lun 23/11/09	37;42;43
48		Limpieza	1 día	mar 24/11/09	mar 24/11/09	47
49		Fin piso 13	0 días	mar 24/11/09	mar 24/11/09	48

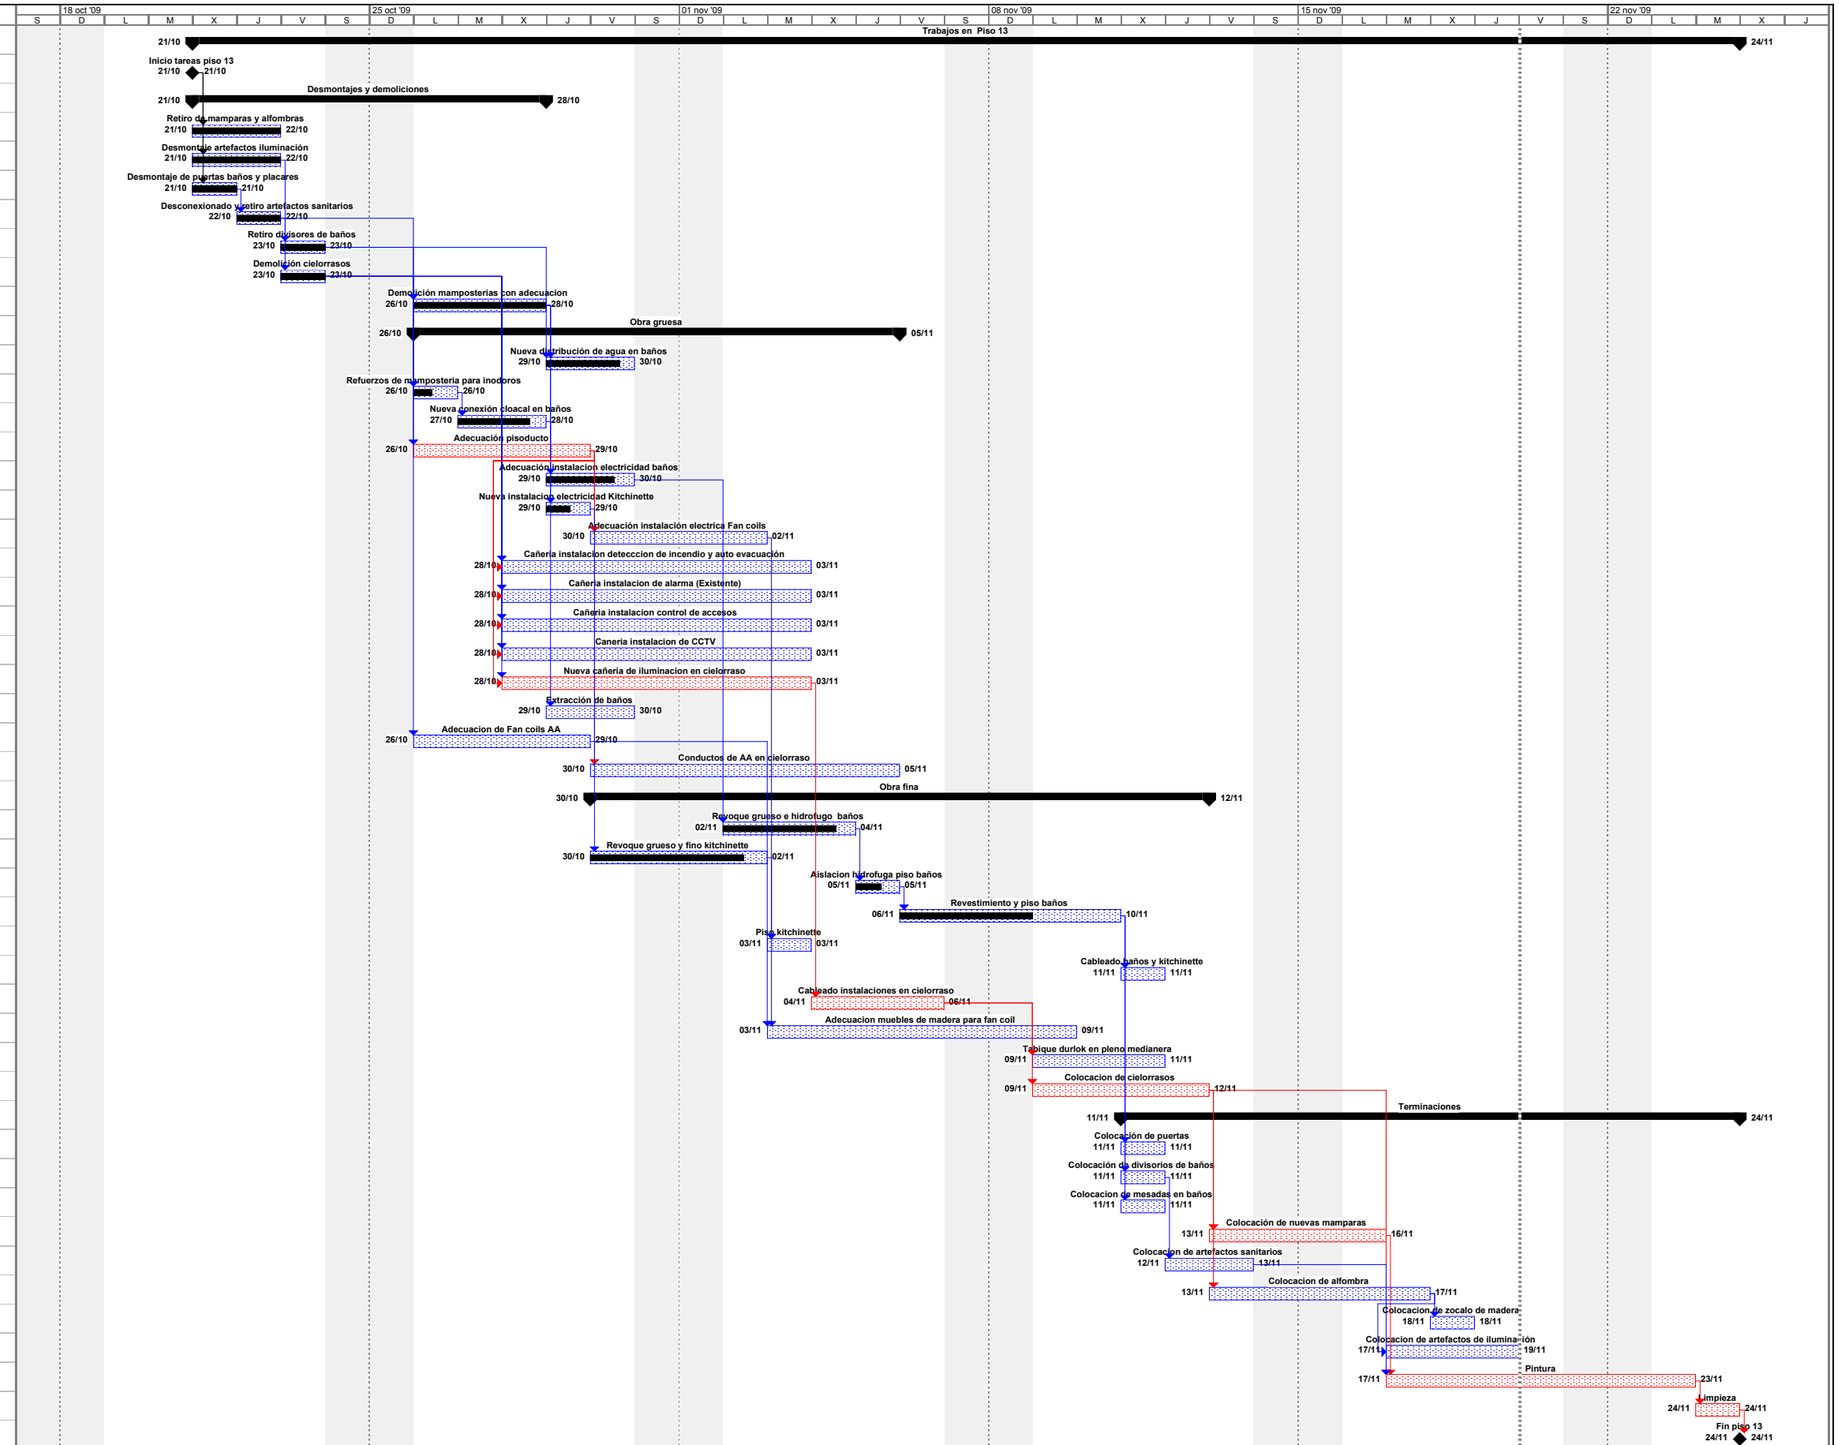

Project: programa200809
Date: vie 20/11/09

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite
