Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	SUCURSAL LA LUCILA	120 días	mié 04/11/09	mar 22/03/10
2	1ra ETAPA	47 días	mié 04/11/09	lun 28/12/09
3	Trabajos preliminares	0,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
4	Retiro de elementos del banco	0,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
5	Desmontes y demoliciones	10 días	mié 04/11/09	lun 16/11/09
6	Retiro de carpinterías	0,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
7	Retiro de artefactos y demás elementos no af	1 día	jue 05/11/09	jue 05/11/09
8	Desmonte y retiro de cielorrasos	1 día	mié 04/11/09	jue 05/11/09
9	Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	3 días	jue 05/11/09	lun 09/11/09
10	Elaboración de memoria de cálculo	3 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09
11	Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	jue 12/11/09	sáb 14/11/09
12	Demolición de muros portantes	1 día	sáb 14/11/09	lun 16/11/09
13	Albañilería	27 días	lun 09/11/09	jue 10/12/09
14	Picado de revoques flojos	1 día	lun 09/11/09	mar 10/11/09
15	Ejecución de nueva losa armada en sector PYME	3 días	mar 10/11/09	vie 13/11/09
16	Reparación de carpetas	4 días	mar 10/11/09	jue 19/11/09
17	Ejecución de revoque armado sobre taparroll	2 días	mar 10/11/09	jue 12/11/09
18	Reparación de revoques	2 días	jue 12/11/09	sáb 14/11/09
19	Ejecución de contrapisos en locales sanitario	2 días	sáb 21/11/09	mar 24/11/09
20	Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	sáb 21/11/09	lun 23/11/09
21	Ejecución de banquinas	1 día	lun 23/11/09	mar 24/11/09
22	Colocación de membrana geotextil en azotea	2 días	lun 30/11/09	mié 02/12/09
23	Colocación de porcelanato	4 días	lun 30/11/09	vie 04/12/09
24	Colocación de solías	1 día	vie 04/12/09	sáb 05/12/09
25	Colocación de solado en sanitarios	2 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
26	Colocación de revestimientos en sanitarios	3 días	lun 07/12/09	jue 10/12/09
27	Demolición y recualce de tabique en PB junto	3 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
28	Instalaciones sanitarias	26,5 días	lun 09/11/09	vie 11/12/09
29	Nuevo tanque de reserva (incluye colector y c	3 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09
30	Distribución de alimentación agua fría y calie	3 días	jue 12/11/09	lun 16/11/09
31	Instalación nuevo termotanque	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
32	Desagües cloacales	3 días	mié 18/11/09	sáb 21/11/09
33	Pruebas hidráulicas	1 día	sáb 21/11/09	lun 23/11/09
34	Colocación de artefactos y grifería	1,5 días	jue 10/12/09	vie 11/12/09
35	Escalera	6,5 días	jue 12/11/09	sáb 21/11/09
36	Ajuste proyecto escalera	0 días	jue 12/11/09	jue 12/11/09
37	Replanteo de nueva escalera	0,5 días	jue 12/11/09	jue 12/11/09
38	Montaje de escalera provisoria	6 días	vie 13/11/09	sáb 21/11/09
39	Demolición de escalera existente	1 día	vie 13/11/09	vie 13/11/09
40	Recualce por demolición escalera	2 días	sáb 14/11/09	lun 16/11/09
41	Colocación de perfiles estructurales de escal	3 días	sáb 14/11/09	mar 17/11/09
42	Montaje de alzadas y pedadas	2 días	mié 18/11/09	jue 19/11/09
43	Colocación de escalones de pórfido	2 días	vie 20/11/09	sáb 21/11/09
44	Durlock	5,5 días	lun 16/11/09	sáb 21/11/09
45	Estructura de tabiques	0,5 días	lun 16/11/09	lun 16/11/09
46	Emplacado y masillado de tabiques	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09
47	Estructura de cielorrasos continuos	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09
48	Emplacado y masillado de cielorrasos	3 días	jue 19/11/09	sáb 21/11/09
49	Cielorraso desmontable	2 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
50	Colocación y nivelación de perfilería	1,5 días	vie 04/12/09	sáb 05/12/09
51	Colocación de placas	0,5 días	lun 07/12/09	lun 07/12/09
52	Aire Acondicionado	14 días	lun 16/11/09	mié 02/12/09
53	Montaje de conductos	4 días	lun 16/11/09	vie 20/11/09
54	Instalación de cañerías	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
55	Desagüe de equipos	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
56	Elevación de equipos	1 día	lun 23/11/09	mar 24/11/09
57	Instalación de equipos y conexionado electri	2 días	vie 27/11/09	lun 30/11/09
58	Colocación de rejas y difusores	1 día	lun 30/11/09	mar 01/12/09
59	Puesta en marcha y regulación	1 día	mar 01/12/09	mié 02/12/09
60	Instalación eléctrica	30,5 días	lun 16/11/09	lun 21/12/09
61	Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
62	Tendido de cañería bajo piso	1 día	lun 23/11/09	mié 25/11/09
63	Cañería para circuitos de iluminación	2 días	mié 18/11/09	vie 20/11/09
64	Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
65	Alimentador para equipos A° A°	2 días	mié 25/11/09	vie 27/11/09
66	Colocación de cocatductos y unicanales	2 días	lun 23/11/09	mié 25/11/09
67	Canalización para tomacorrientes de servicio	2 días	mié 25/11/09	vie 27/11/09
68	Cableado de tensión en puestos	1 día	vie 27/11/09	sáb 28/11/09
69	Cableado de datos en puestos	1 día	sáb 28/11/09	lun 30/11/09
70	Cableado de iluminación	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
71	Colocación de artefactos	3 días	vie 18/12/09	lun 21/12/09
72	Armado de tablero seccional	2 días	sáb 26/11/09	mar 01/12/09
73	Patchiado de nuevo cableado de datos en ra	2 días	lun 30/11/09	mié 02/12/09
74	Herrería	19 días	lun 16/11/09	mar 08/12/09
75	Montaje de escalera gato a azotea inaccesible	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
76	Colocación de rejas y nuevas carpinterías	6 días	mié 02/12/09	mar 08/12/09
77	Vidrios y espejos	12,5 días	mar 08/12/09	mar 22/12/09
78	Colocación de vidrios laminados	2 días	mar 08/12/09	jue 10/12/09
79	Colocación de espejos en baños	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
80	Alfombra y zócalos	15 días	sáb 05/12/09	mié 23/12/09
81	Provisión de alfombra	0 días	sáb 05/12/09	sáb 05/12/09
82	Colocación de alfombra	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
83	Colocación de zócalos	2 días	mar 22/12/09	mié 23/12/09
84	Pintura	16 días	mar 08/12/09	vie 25/12/09
85	Preparación de paredes y cielorrasos	5 días	mar 08/12/09	sáb 12/12/09
86	Pintura de carpinterías y rejas	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09
87	Pintura de cielorrasos	2 días	mié 16/12/09	jue 17/12/09
88	Pintura de paredes	3 días	vie 18/12/09	lun 21/12/09
89	Retoques finales de pintura	2 días	jue 24/12/09	vie 25/12/09
90	Equipamiento office	6 días	lun 14/12/09	mar 22/12/09
91	Colocación de muebles bajo mesada	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09
92	Colocación de mesada en office	1 día	mié 16/12/09	mié 16/12/09
93	Colocación de estantes y alacenas	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
94	Cortinas	5 días	lun 14/12/09	mié 23/12/09
95	Medición y fabricación de cortinas Roller	6 días	lun 14/12/09	mar 22/12/09
96	Colocación de cortinas Roller	1 día	mié 23/12/09	mié 23/12/09
97	Limpieza Final	2 días	sáb 26/12/09	lun 28/12/09
98	2da ETAPA	44 días	mar 29/12/09	mié 17/02/10
99	Trabajos preliminares	1 día	mar 29/12/09	mar 29/12/09
100	Retiro de elementos del banco	1 día	mar 29/12/09	mar 29/12/09
101	Desmontes y demoliciones	11 días	mié 30/12/09	lun 11/01/10
102	Retiro de carpinterías	0,5 días	mié 30/12/09	mié 30/12/09
103	Retiro de artefactos y demás elementos no af	2 días	mié 30/12/09	vie 01/01/10
104	Desmonte y retiro de cielorrasos	2 días	mié 30/12/09	jue 31/12/09
105	Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	2 días	vie 01/01/10	sáb 02/01/10
106	Elaboración de memoria de cálculo	2 días	lun 04/01/10	mar 05/01/10
107	Colocación de refuerzos de perfiles IPN	3 días	mié 06/01/10	vie 08/01/10
108	Demolición de muros portantes	2 días	sáb 09/01/10	lun 11/01/10
109	Albañilería	23 días	lun 04/01/10	vie 29/01/10
110	Picado de revoques flojos	1 día	lun 04/01/10	lun 04/01/10
111	Reparación de carpetas	2 días	mar 05/01/10	mié 06/01/10
112	Reparación de revoques	2 días	mar 05/01/10	mié 06/01/10
113	Ejecución de contrapisos en locales sanitario	1 día	lun 11/01/10	lun 11/01/10
114	Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	lun 11/01/10	lun 11/01/10
115	Reparación de solado existente y reemplazo -	4 días	vie 22/01/10	mar 26/01/10
116	Colocación de solías	1 día	mié 27/01/10	mié 27/01/10
117	Colocación de solado en sanitarios	1 día	mié 27/01/10	mié 27/01/10
118	Colocación de revestimientos en sanitarios	2 días	jue 28/01/10	vie 29/01/10
119	Instalaciones sanitarias	21 días	jue 07/01/10	sáb 30/01/10
120	Distribución de alimentación agua fría y calie	2 días	jue 07/01/10	vie 08/01/10
121	Desagües cloacales	1 día	sáb 09/01/10	sáb 09/01/10
122	Pruebas hidráulicas	1 día	lun 11/01/10	lun 11/01/10
123	Colocación de artefactos y grifería	1 día	sáb 30/01/10	sáb 30/01/10
124	Durlock	12 días	mar 12/01/10	lun 25/01/10
125	Estructura de tabiques	2 días	mar 12/01/10	mié 13/01/10
126	Emplacado y masillado de tabiques	3 días	jue 14/01/10	sáb 16/01/10
127	Estructura de cielorrasos continuos	3 días	jue 14/01/10	sáb 16/01/10
128	Emplacado y masillado de cielorrasos	4 días	lun 18/01/10	jue 21/01/10
129	Ejecución de gargantas	3 días	vie 22/01/10	lun 25/01/10
130	Cielorraso desmontable	2 días	mié 27/01/10	jue 28/01/10
131	Colocación y nivelación de perfilería	1,5 días	mié 27/01/10	jue 28/01/10
132	Colocación de placas	0,5 días	jue 28/01/10	jue 28/01/10
133	Aire Acondicionado	10 días	mar 12/01/10	vie 22/01/10
134	Montaje de conductos	4 días	mar 12/01/10	vie 15/01/10
135	Instalación de cañerías	2 días	sáb 16/01/10	lun 18/01/10
136	Instalación de equipos split	4 días	sáb 16/01/10	mié 20/01/10
137	Colocación de rejas y difusores	1 día	jue 21/01/10	jue 21/01/10
138	Puesta en marcha y regulación	1 día	vie 22/01/10	vie 22/01/10
139	Instalación eléctrica	28 días	mar 12/01/10	vie 12/02/10
140	Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	mar 12/01/10	mié 13/01/10
141	Tendido de cañería bajo piso	1 día	jue 14/01/10	jue 14/01/10
142	Cañería para circuitos de iluminación	3 días	jue 14/01/10	sáb 16/01/10
143	Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	lun 18/01/10	mar 19/01/10
144	Alimentador para equipos A° A°	2 días	vie 19/01/10	sáb 16/01/10
145	Colocación de cocatductos y unicanales	2 días	mié 20/01/10	jue 21/01/10
146	Canalización para tomacorrientes de servicio	1 día	vie 22/01/10	vie 22/01/10
147	Cableado de tensión en puestos	1 día	sáb 23/01/10	sáb 23/01/10
148	Cableado de datos en puestos	1 día	lun 25/01/10	lun 25/01/10
149	Cableado de iluminación	2 días	lun 18/01/10	mar 19/01/10
150	Colocación de artefactos	2 días	jue 11/02/10	vie 12/02/10
151	Armado de tablero seccional	2 días	lun 25/01/10	mar 26/01/10
152	Patchiado de nuevo cableado de datos en ra	2 días	mar 26/01/10	mié 27/01/10
153	Herrería	9 días	lun 18/01/10	mié 27/01/10
154	Colocación de rejas y nuevas carpinterías	5 días	lun 18/01/10	vie 22/01/10
155	Colocación de nuevas carpinterías de acceso	4 días	sáb 23/01/10	mié 27/01/10
156	Recinto de Seguridad	5 días	jue 28/01/10	mar 02/02/10
157	Ejecución de tabiques de acuerdo a detalle	2 días	jue 28/01/10	vie 29/01/10
158	Colocación de placas de acero Antifal	2 días	sáb 30/01/10	lun 01/02/10
159	Montaje de puerta de seguridad	1 día	mar 02/02/10	mar 02/02/10
160	Vidrios y espejos	11 días	mié 03/02/10	lun 15/02/10
161	Colocación de vidrios laminados	2 días	mié 03/02/10	jue 04/02/10
162	Colocación de espejos en baños	1 día	lun 15/02/10	lun 15/02/10
163	Zócalos	2 días	lun 18/01/10	mar 19/01/10
164	Colocación de zócalos	2 días	lun 18/01/10	mar 19/01/10
165	Pintura	12 días	mar 02/02/10	lun 15/02/10
166	Preparación de paredes y cielorrasos	4 días	mar 02/02/10	vie 05/02/10
167	Pintura de carpinterías y rejas	2 días	sáb 06/02/10	lun 08/02/10
168	Pintura de cielorrasos	2 días	mar 09/02/10	mié 10/02/10
169	Pintura de paredes	3 días	jue 11/02/10	sáb 13/02/10
170	Retoques finales de pintura	1 día	lun 15/02/10	lun 15/02/10
171	Montaje de módulos de Cajas	1 día	lun 15/02/10	lun 15/02/10
172	Limpieza Final	2 días	mar 16/02/10	mié 17/02/10
173	3ra ETAPA	29 días	jue 18/02/10	mar 23/03/10
174	Trabajos preliminares	1 día	jue 18/02/10	jue 18/02/10
175	Retiro de elementos del banco	1 día	jue 18/02/10	jue 18/02/10
176	Desmontes y demoliciones	8 días	vie 19/02/10	sáb 27/02/10
177	Retiro de castillete	1 día	vie 19/02/10	vie 19/02/10
178	Retiro de artefactos y demás elementos no af	1 día	sáb 20/02/10	sáb 20/02/10
179	Desmonte y retiro de cielorrasos	2 días	vie 19/02/10	sáb 20/02/10
180	Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	1 día	lun 22/02/10	lun 22/02/10
181	Elaboración de memoria de cálculo	2 días	mar 23/02/10	mié 24/02/10
182	Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	jue 25/02/10	vie 26/02/10
183	Demolición de muros portantes	1 día	sáb 27/02/10	sáb 27/02/10
184	Albañilería	8 días	mar 23/02/10	jue 04/03/10
185	Picado de revoques flojos	1 día	mar 23/02/10	mar 23/02/10
186	Reparación de carpetas	2 días	mar 02/03/10	mié 03/03/10
187	Reparación de revoques	2 días	mié 24/02/10	jue 25/02/10
188	Ejecución de contrapisos en locales sanitario	1 día	mar 02/03/10	mar 02/03/10
189	Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	mar 02/03/10	mar 02/03/10
190	Colocación de solías	1 día	lun 01/03/10	lun 01/03/10
191	Colocación de solado en sanitarios	1 día	lun 01/03/10	lun 01/03/10
192	Colocación de revestimientos en sanitarios	2 días	lun 01/03/10	mar 02/03/10
193	Arreglos en vereda	2 días	mié 03/03/10	jue 04/03/10
194	Instalaciones sanitarias	4,5 días	vie 26/02/10	mié 03/03/10
195	Distribución de alimentación agua fría y calie	2 días	vie 26/02/10	sáb 27/02/10
196	Desagües cloacales	1 día	lun 01/03/10	lun 01/03/10
197	Pruebas hidráulicas	1 día	mar 02/03/10	mar 02/03/10
198	Colocación de artefactos y grifería	0,5 días	mié 03/03/10	mié 03/03/10
199	Durlock	6 días	lun 01/03/10	sáb 06/03/10
200	Estructura de tabiques	2 días	lun 01/03/10	mar 02/03/10
201	Emplacado y masillado de tabiques	3 días	mié 03/03/10	vie 05/03/10
202	Estructura de cielorrasos continuos	2 días	mié 03/03/10	jue 04/03/10
203	Emplacado y masillado de cielorrasos	2 días	vie 05/03/10	sáb 06/03/10
204	Aire Acondicionado	16 días	lun 01/03/10	jue 18/03/10
205	Montaje de conductos	4 días	lun 01/03/10	jue 04/03/10
206	Instalación de cañerías	2 días	vie 05/03/10	sáb 06/03/10
207	Colocación de rejas y difusores	1 día	mié 17/03/10	mié 17/03/10
208	Puesta en marcha y regulación	1 día	jue 18/03/10	jue 18/03/10
209	Instalación eléctrica	16 días	lun 01/03/10	jue 18/03/10
210	Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	lun 01/03/10	mar 02/03/10
211	Tendido de cañería bajo piso	1 día	mié 03/03/10	mié 03/03/10
212	Cañería para circuitos de iluminación	2 días	mié 03/03/10	jue 04/03/10
213	Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	vie 05/03/10	sáb 06/03/10
214	Colocación de cocatductos y unicanales	2 días	lun 08/03/10	mar 09/03/10
215	Canalización para tomacorrientes de servicio	1 día	mié 10/03/10	mié 10/03/10
216	Cableado de tensión en puestos	1 día	jue 11/03/10	jue 11/03/10
217	Cableado de datos en puestos	1 día	vie 12/03/10	vie 12/03/10
218	Cableado de iluminación	2 días	vie 05/03/10	sáb 06/03/10
219	Colocación de artefactos	2 días	mié 17/03/10	jue 18/03/10
220	Armado de tablero seccional	2 días	vie 12/03/10	sáb 13/03/10
221	Traslado de rack y patchiado de nuevos pue	2 días	lun 15/03/10	lun 16/03/10
222	Herrería	2 días	sáb 06/03/10	lun 08/03/10
223	Colocación de rejas y nuevas carpinterías	2 días	sáb 06/03/10	lun 08/03/10
224	Vidrios y espejos	11 días	mar 09/03/10	sáb 20/03/10
225	Colocación de vidrios laminados	2 días	mar 09/03/10	mié 10/03/10
226	Colocación de espejos en baños	1 día	sáb 20/03/10	sáb 20/03/10
227	Zócalos	2 días	sáb 06/03/10	lun 08/03/10
228	Colocación de zócalos	2 días	sáb 06/03/10	lun 08/03/10
229	Pintura	12 días	lun 08/03/10	sáb 20/03/10
230	Preparación de paredes y cielorrasos	4 días	lun 08/03/10	jue 11/03/10
231	Pintura de carpinterías y rejas	2 días	vie 12/03/10	sáb 13/03/10
232	Pintura de cielorrasos	2 días	lun 15/03/10	mar 16/03/10
233	Pintura de paredes	3 días	mié 17/03/10	vie 19/03/10
234	Retoques finales de pintura	1 día	sáb 20/03/10	sáb 20/03/10
235	Montaje de módulos de Cajas	1 día	sáb 20/03/10	sáb 20/03/10
236	Limpieza Final	2 días	lun 22/03/10	mar 23/03/10

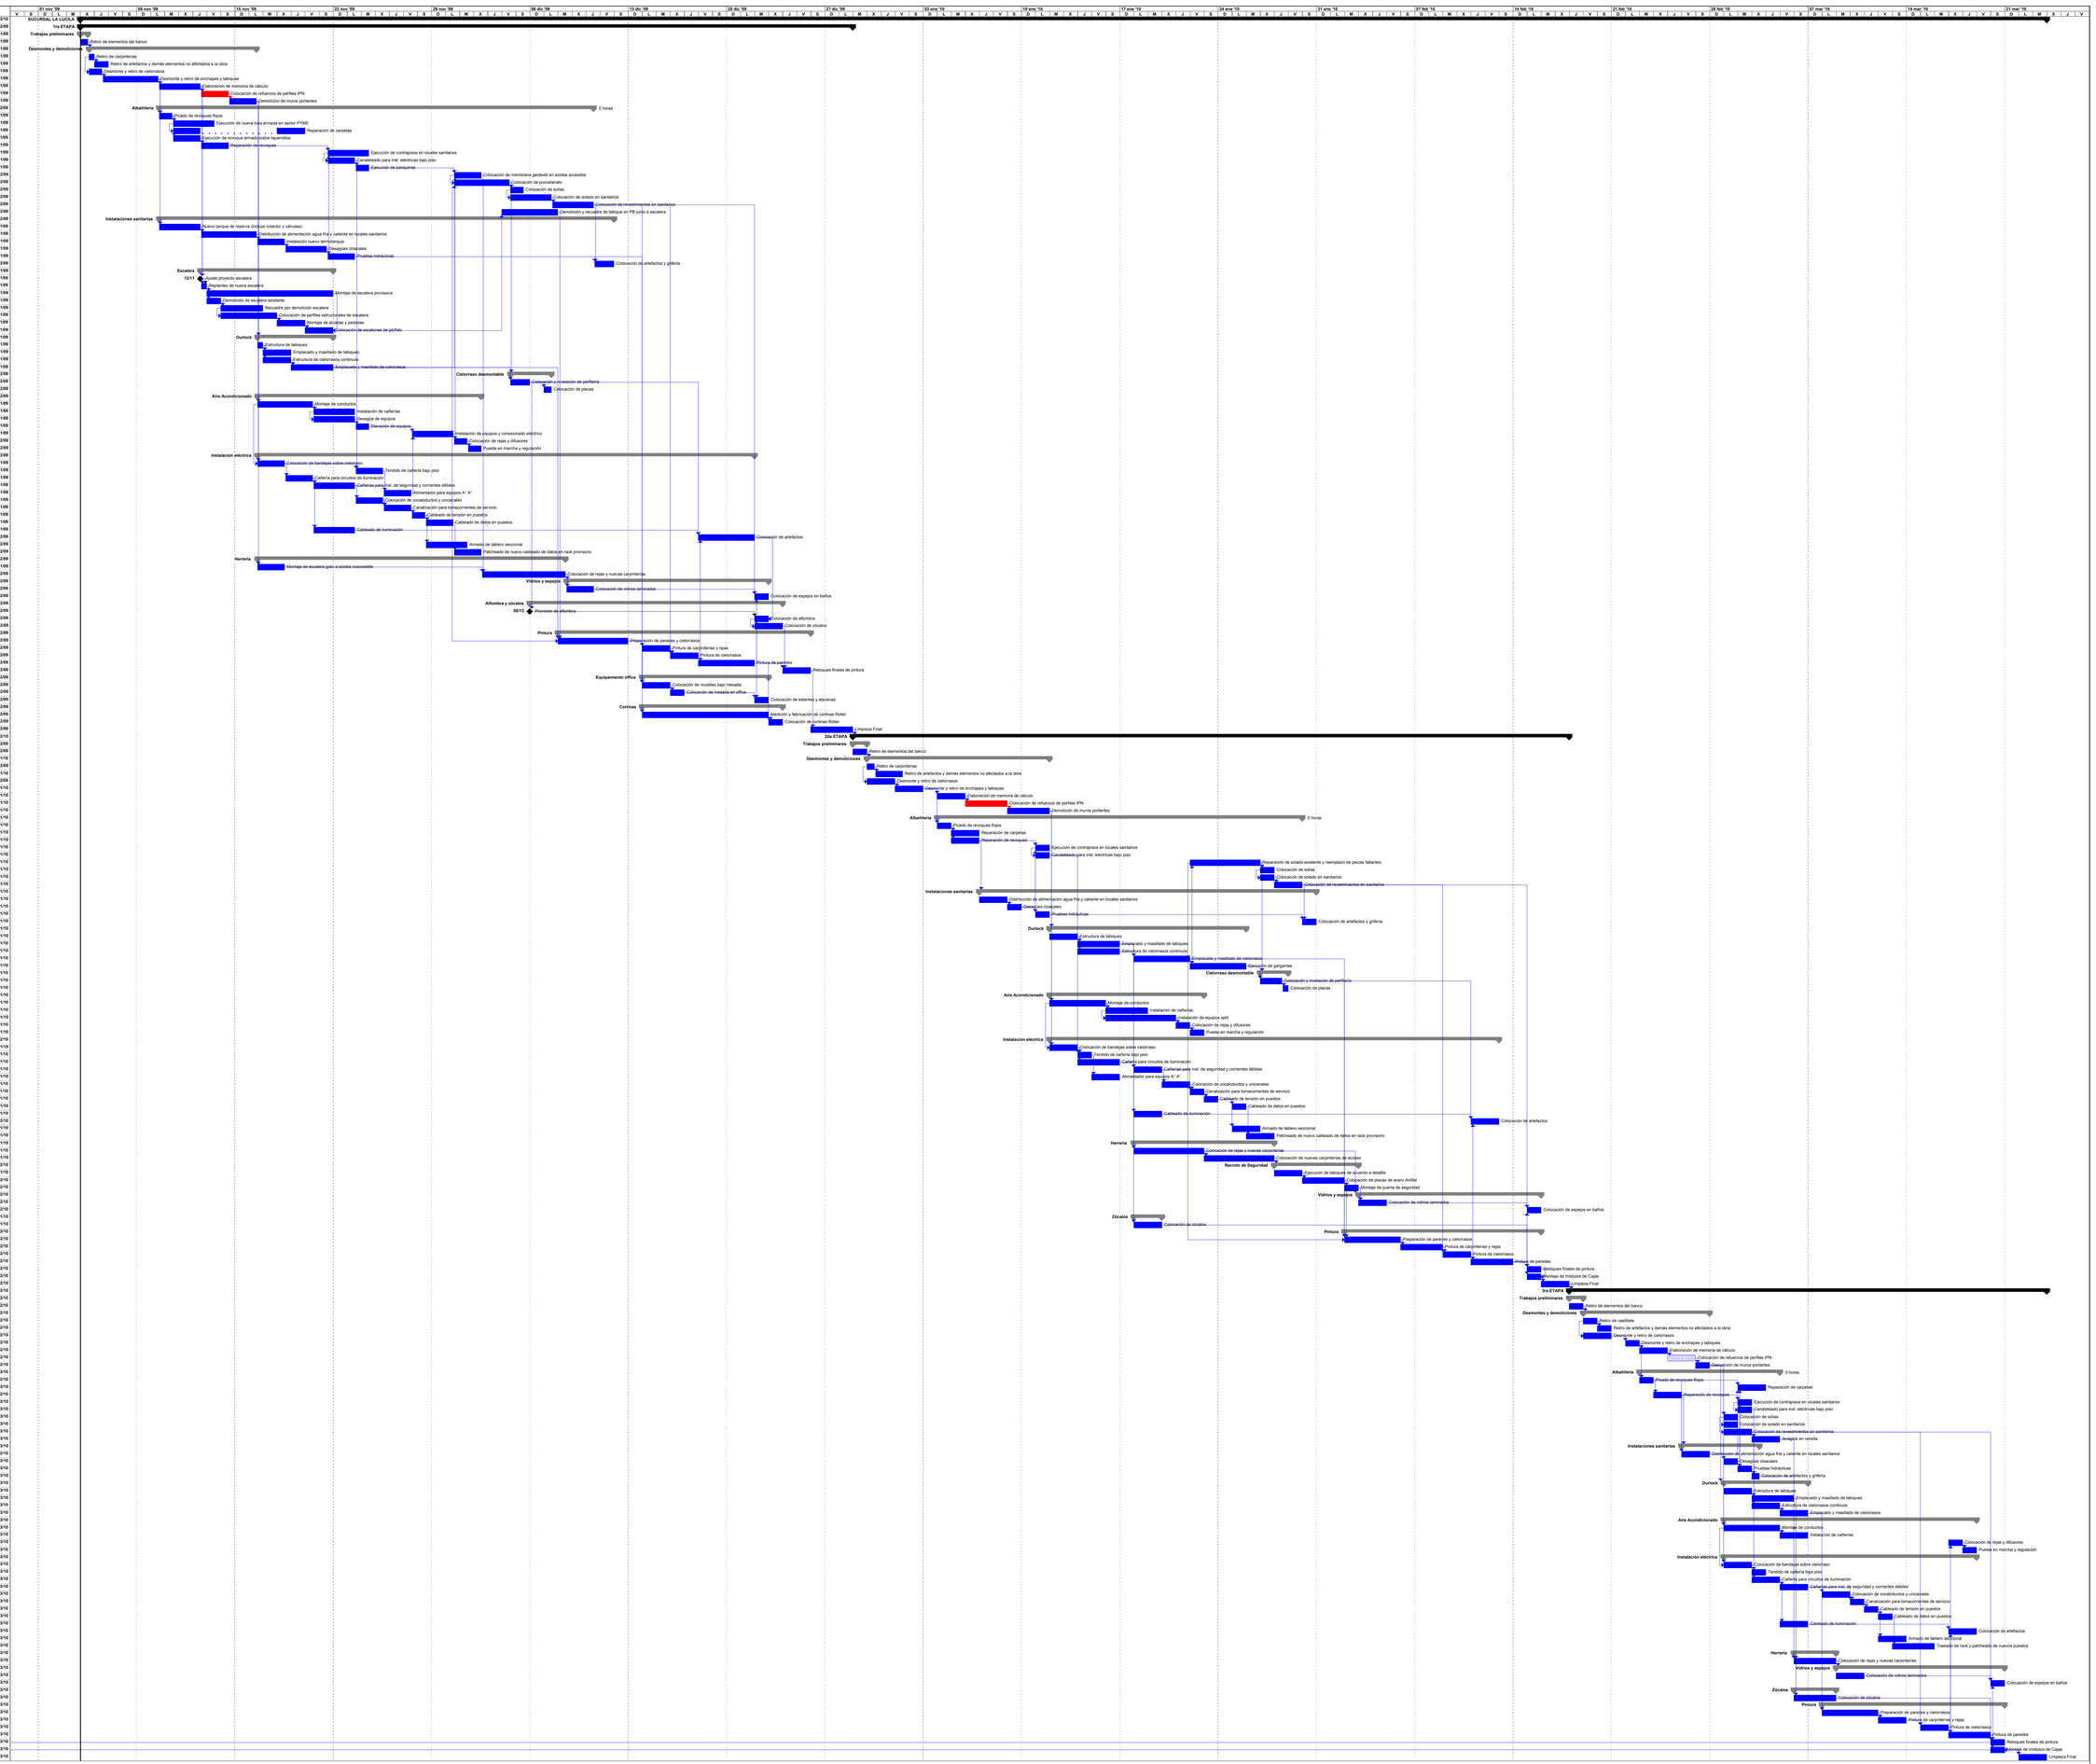

Proyecto: Bco Ciudad La Lucila_P
Fecha: mar 24/11/09

Tarea | División | Progreso | Hito | n | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite
