Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede
1	**Remodelación de oficinas Nextant**	**27 días**	**vie 08/01/10**	**lun 08/02/10**	
2	**Preliminares**	**6 días**	**vie 08/01/10**	**jue 14/01/10**	
3	Ordenes de compra	6 días	vie 08/01/10	jue 14/01/10	
4	Protección ascensores	1 día	vie 08/01/10	vie 08/01/10	3CC
5	Replanteos	3 días	vie 08/01/10	lun 11/01/10	3CC
6	**Tabiques en placa de roca de yeso**	**8 días**	**sáb 09/01/10**	**lun 18/01/10**	
7	Estructura y una placa	2 días	sáb 09/01/10	lun 11/01/10	3CC+
8	Emplacado	2 días	mar 12/01/10	mié 13/01/10	7
9	Enmasillado	4 días	jue 14/01/10	lun 18/01/10	8
10	**Cielorrasos**	**2 días**	**jue 14/01/10**	**vie 15/01/10**	
11	Adaptaciones y perforaciones	2 días	jue 14/01/10	vie 15/01/10	8
12	**Instalación eléctrica y cableado estructurado**	**12 días**	**vie 08/01/10**	**jue 21/01/10**	
13	Instalación de bandejas	4 días	vie 08/01/10	mar 12/01/10	3CC
14	Canalización control de acceso	1 día	mié 13/01/10	mié 13/01/10	13
15	Cañería vacía Wi Fi	1 día	jue 14/01/10	jue 14/01/10	14
16	Cableado de tensión eléctrica e iluminación	2 días	vie 15/01/10	sáb 16/01/10	15
17	Movimiento de artefactos de iluminación	1 día	lun 18/01/10	lun 18/01/10	16
18	Cableado de bandejas	1 día	mar 19/01/10	mar 19/01/10	17
19	Periscopios	1 día	mar 19/01/10	mar 19/01/10	17
20	Cableado portero eléctrico	1 día	mié 20/01/10	mié 20/01/10	18FF
21	Instalación de Rack	1 día	jue 21/01/10	jue 21/01/10	20
22	Adaptación de artefcatos de iluminación	3 días	mar 12/01/10	jue 14/01/10	3CC+
23	**Piso técnico**	**2 días**	**mié 13/01/10**	**jue 14/01/10**	
24	Calado de placas de piso técnico	2 días	mié 13/01/10	jue 14/01/10	13
25	**Pintura**	**17 días**	**mar 19/01/10**	**sáb 06/02/10**	
26	Enduido y lijado	4 días	mar 19/01/10	vie 22/01/10	9
27	Pintura paredes	3 días	sáb 23/01/10	mar 26/01/10	26
28	Pintura cielorrasos	2 días	sáb 23/01/10	lun 25/01/10	26
29	Terminaciones	2 días	mié 27/01/10	jue 28/01/10	27
30	Acabados finales y repasos	1 día	sáb 06/02/10	sáb 06/02/10	37
31	**Carpinterías interiores**	**15 días**	**mié 20/01/10**	**vie 05/02/10**	
32	Instalación de estructura	4 días	mié 20/01/10	sáb 23/01/10	9FC+
33	Instalación de vidrios	6 días	jue 21/01/10	mié 27/01/10	32CC
34	Instalación de Uglass	1 día	jue 04/02/10	jue 04/02/10	33FC
35	Instalación puertas de vidrio	1 día	lun 25/01/10	lun 25/01/10	32
36	Cerraduras puertas de vidrio	1 día	mar 26/01/10	mar 26/01/10	35
37	Sellados	1 día	vie 05/02/10	vie 05/02/10	34
38	**Aire acondicionado**	**2 días**	**vie 29/01/10**	**sáb 30/01/10**	
39	Reparación equipo split	1 día	vie 29/01/10	vie 29/01/10	29
40	Puesta en marcha y pruebas	1 día	sáb 30/01/10	sáb 30/01/10	39
41	**Herrería**	**2 días**	**mar 12/01/10**	**mié 13/01/10**	
42	Refuerzo para plasma	2 días	mar 12/01/10	mié 13/01/10	7
43	Instalación de guía roma para puerta corrediza	2 días	mar 12/01/10	mié 13/01/10	7
44	Refuerzo para frentes de oficina	2 días	mar 12/01/10	mié 13/01/10	7
45	**Pisos y zócalos**	**16 días**	**mar 19/01/10**	**vie 05/02/10**	
46	Zócalos de madera	2 días	mar 19/01/10	mié 20/01/10	9
47	Piso de goma	2 días	vie 29/01/10	sáb 30/01/10	28;29
48	Piso flotante	2 días	lun 01/02/10	mar 02/02/10	47
49	Alfombra	2 días	mié 03/02/10	jue 04/02/10	48
50	Solia	1 día	vie 05/02/10	vie 05/02/10	49
51	**Gráfica y señalización**	**4 días**	**lun 01/02/10**	**jue 04/02/10**	
52	Instalación de vinilos	2 días	mié 03/02/10	jue 04/02/10	33FC
53	Instalación de logo	2 días	lun 01/02/10	mar 02/02/10	28FC
54	**Mobiliario**	**3 días**	**vie 05/02/10**	**lun 08/02/10**	
55	Recepción de mobiliario	1 día	vie 05/02/10	vie 05/02/10	49
56	Armado de puestos de trabajo	2 días	sáb 06/02/10	lun 08/02/10	55
57	**Limpieza de obra**	**1 día**	**lun 08/02/10**	**lun 08/02/10**	
58	Limpieza final de obra	1 día	lun 08/02/10	lun 08/02/10	30
59	Repasos finales	1 día	lun 08/02/10	lun 08/02/10	30
60	Entrega de obra	0 días	lun 08/02/10	lun 08/02/10	59

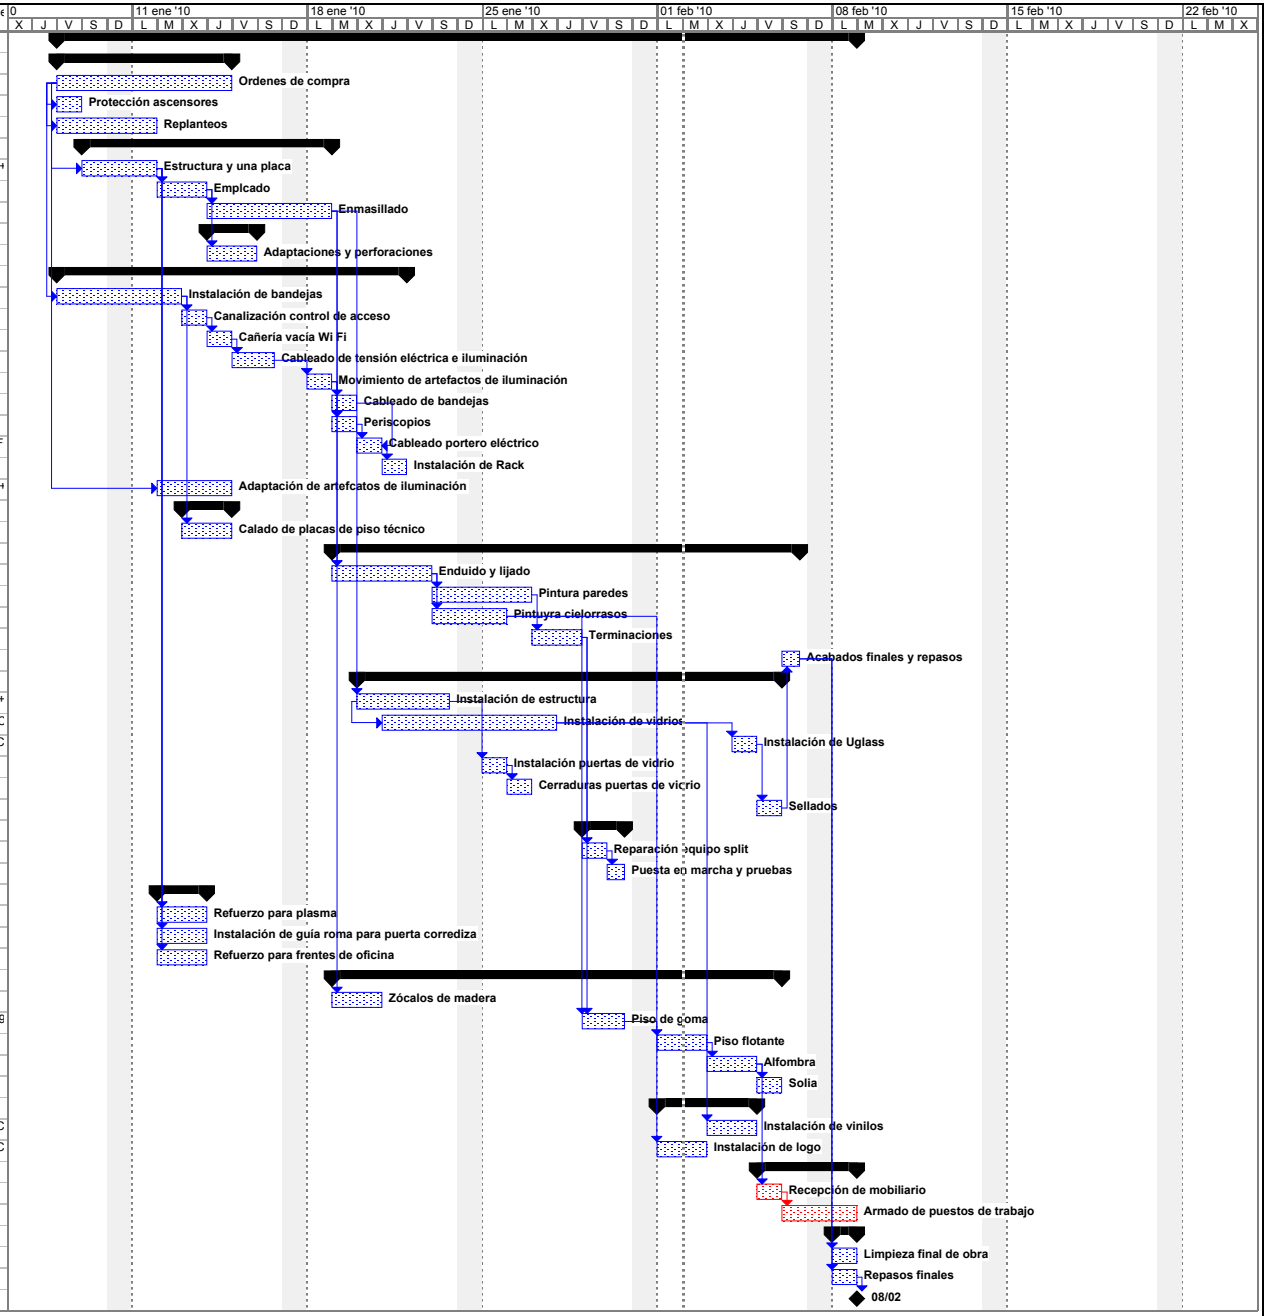

Proyecto: ComConst
Fecha: mar 02/02/10

Tarea | Progreso | Resumen | Tareas externas | Fecha límite
División | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo
