Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		SUCURSAL LA LUCILA	134 días	mié 04/11/09	jue 08/04/10
2	✓	1ra ETAPA	48 días	mié 04/11/09	mar 29/12/09
3	✓	Trabajos preliminares	0,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
4	✓	Retiro de elementos del banco	0,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
5	✓	Desmontes y demoliciones	10 días	mié 04/11/09	lun 16/11/09
6	✓	Retiro de carpinterías	0,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
7	✓	Retiro de artefactos y demás elementos no al	1 día	jue 05/11/09	jue 05/11/09
8	✓	Desmonte y retiro de cielorrasos	1 día	mié 04/11/09	jue 05/11/09
9	✓	Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	3 días	jue 05/11/09	lun 09/11/09
10	✓	Elaboración de memoria de cálculo	3 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09
11	✓	Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	jue 12/11/09	sab 14/11/09
12	✓	Demolición de muros portantes	1 día	sab 14/11/09	lun 16/11/09
13	✓	Albañilería	27 días	lun 09/11/09	jue 10/12/09
14	✓	Picado de revoques flojos	1 día	lun 09/11/09	mar 10/11/09
15	✓	Ejecución de nueva losa armada en sector P1	3 días	mar 10/11/09	vie 13/11/09
16	✓	Reparación de carpetas	4 días	mar 10/11/09	jue 19/11/09
17	✓	Ejecución de revoque armado sobre tapamiñ	2 días	mar 10/11/09	jue 12/11/09
18	✓	Reparación de revoques	2 días	jue 12/11/09	sab 14/11/09
19	✓	Ejecución de contrapisos en locales sanitario	2 días	sab 21/11/09	mar 24/11/09
20	✓	Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	sab 21/11/09	lun 23/11/09
21	✓	Ejecución de banquinas	1 día	lun 23/11/09	mar 24/11/09
22	✓	Colocación de membrana geotextil en azotea	2 días	lun 30/11/09	mié 02/12/09
23	✓	Colocación de porcelanato	4 días	lun 30/11/09	vie 04/12/09
24	✓	Colocación de solías	1 día	vie 04/12/09	sab 05/12/09
25	✓	Colocación de solado en sanitarios	2 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
26	✓	Colocación de revestimientos en sanitarios	3 días	lun 07/12/09	jue 10/12/09
27	✓	Desmonte y recubrir de tabique en PB junto	2 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
28	✓	Instalaciones sanitarias	26,5 días	lun 09/11/09	vie 11/12/09
29	✓	Nuevo tanque de reserva (incluye colector y	3 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09
30	✓	Distribución de alimentación agua fría y calie	2 días	jue 12/11/09	lun 16/11/09
31	✓	Instalación nuevo termotanque	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
32	✓	Desagües cloacales	3 días	mié 18/11/09	sab 21/11/09
33	✓	Pruebas hidráulicas	1 día	sab 21/11/09	lun 23/11/09
34	✓	Colocación de artefactos y grifería	1,5 días	jue 10/12/09	vie 11/12/09
35	✓	Escalera	6,5 días	jue 12/11/09	sab 21/11/09
36	✓	Ajuste proyecto escalera	0 días	jue 12/11/09	jue 12/11/09
37	✓	Replanteo de nuevo escalera	0,5 días	jue 12/11/09	jue 12/11/09
38	✓	Montaje de escalera provisoria	6 días	vie 13/11/09	sab 21/11/09
39	✓	Demolición de escalera existente	1 día	vie 13/11/09	vie 13/11/09
40	✓	Recuadre por demolición escalera	2 días	sab 14/11/09	lun 16/11/09
41	✓	Colocación de perfiles estructurales de escal	3 días	sab 14/11/09	mar 17/11/09
42	✓	Montaje de alzadas y pedadas	2 días	mié 18/11/09	jue 19/11/09
43	✓	Colocación de escuadros de pórtico	2 días	vie 20/11/09	sab 21/11/09
44	✓	Durlock	5,5 días	lun 16/11/09	sab 21/11/09
45	✓	Estructura de tabiques	0,5 días	lun 16/11/09	lun 16/11/09
46	✓	Emplacado y masillado de tabiques	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09
47	✓	Estructura de cielorrasos continuos	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09
48	✓	Emplacado y masillado de cielorrasos	3 días	jue 19/11/09	sab 21/11/09
49	✓	Cielorraso desmontable	2 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
50	✓	Colocación y nivelación de perfilería	1,5 días	vie 04/12/09	sab 05/12/09
51	✓	Colocación de placas	0,5 días	lun 07/12/09	lun 07/12/09
52	✓	Aire Acondicionado	14 días	lun 16/11/09	mié 02/12/09
53	✓	Montaje de conductos	4 días	lun 16/11/09	vie 20/11/09
54	✓	Instalación de cañerías	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
55	✓	Desagüe de equipos	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
56	✓	Elevación de equipos	1 día	lun 23/11/09	mar 24/11/09
57	✓	Instalación de equipos y conexionado eléctric	2 días	vie 27/11/09	lun 30/11/09
58	✓	Colocación de rejas y difusores	1 día	lun 30/11/09	mar 01/12/09
59	✓	Puesta en marcha y regulación	1 día	mar 01/12/09	mié 02/12/09
60	✓	Instalación eléctrica	30,5 días	lun 16/11/09	lun 21/12/09
61	✓	Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
62	✓	Tendido de cañería bajo piso	2 días	lun 23/11/09	mié 25/11/09
63	✓	Cañería para circuitos de iluminación	2 días	mié 18/11/09	vie 20/11/09
64	✓	Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
65	✓	Alimentador para equipos A° A°	2 días	mié 25/11/09	vie 27/11/09
66	✓	Colocación de oscuadroductos y unizanales	2 días	lun 23/11/09	mié 25/11/09
67	✓	Canalización para tomacorrientes de servicio	2 días	mié 25/11/09	vie 27/11/09
68	✓	Cableado de tensión en puestos	1 día	vie 27/11/09	sab 28/11/09
69	✓	Cableado de datos en puestos	1 día	sab 28/11/09	lun 30/11/09
70	✓	Cableado de iluminación	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
71	✓	Colocación de artefactos	3 días	vie 18/12/09	lun 21/12/09
72	✓	Armado de tablero seccional	2 días	sab 28/11/09	mar 01/12/09
73	✓	Patchado de nuevo cableado de datos en re	2 días	lun 30/11/09	mié 02/12/09
74	✓	Herrería	19 días	lun 16/11/09	mar 08/12/09
75	✓	Montaje de escalera gato y azotea inaccesible	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
76	✓	Colocación de rejas y nuevas carpinterías	6 días	mié 02/12/09	mar 08/12/09
77	✓	Vidrios y espejos	12,5 días	mar 08/12/09	mar 22/12/09
78	✓	Colocación de vidrios laminados	2 días	mar 08/12/09	jue 10/12/09
79	✓	Colocación de espejos en baños	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
80	✓	Alfombra y zócalos	15 días	sab 05/12/09	mié 23/12/09
81	✓	Provisión de alfombra	0 días	sab 05/12/09	sab 05/12/09
82	✓	Colocación de alfombra	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
83	✓	Colocación de zócalos	2 días	mar 22/12/09	mié 23/12/09
84	✓	Pintura	16 días	mar 08/12/09	vie 25/12/09
85	✓	Preparación de paredes y cielorrasos	5 días	mar 08/12/09	sab 12/12/09
86	✓	Pintura de carpinterías y rejas	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09
87	✓	Pintura de cielorrasos	2 días	mié 16/12/09	jue 17/12/09
88	✓	Pintura de paredes	3 días	vie 18/12/09	lun 21/12/09
89	✓	Retoques finales de pintura	2 días	jue 24/12/09	vie 25/12/09
90	✓	Equipamiento office	6 días	lun 14/12/09	mar 22/12/09
91	✓	Colocación de muebles bajo mesada	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09
92	✓	Colocación de mesada en office	1 día	mié 16/12/09	mié 16/12/09
93	✓	Colocación de estantes y alacenas	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
94	✓	Cortinas	12 días	lun 14/12/09	sab 26/12/09
95	✓	Medición y fabricación de cortinas Roller	6 días	lun 14/12/09	mar 22/12/09
96	✓	Colocación de cortinas Roller	1 día	mié 23/12/09	mié 23/12/09
97	✓	Mudanza y armado de puestos provisorios	1 día	jue 24/12/09	sab 26/12/09
98	✓	Limpieza Final	3 días	dom 27/12/09	mar 29/12/09
99		2da ETAPA	37 días	lun 28/01/10	lun 08/03/10
100		Trabajos preliminares	1 día	lun 28/01/10	lun 28/01/10
101		Retiro de elementos del banco	1 día	lun 28/01/10	lun 28/01/10
102		Desmontes y demoliciones	6 días	mar 28/01/10	mié 03/02/10
103		Retiro de carpinterías	0,5 días	mar 28/01/10	mar 28/01/10
104		Retiro de artefactos y demás elementos no al	2 días	mar 28/01/10	jue 28/01/10
105		Desmonte y retiro de cielorrasos	2 días	mar 28/01/10	mié 27/01/10
106		Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	2 días	jue 28/01/10	vie 29/01/10
107		Elaboración de memoria de cálculo	0 días	vie 29/01/10	vie 29/01/10
108		Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	sab 30/01/10	lun 01/02/10
109		Demolición de muros portantes	2 días	mar 02/02/10	mié 03/02/10
110		Albañilería	20 días	sab 30/01/10	lun 22/02/10
111		Picado de revoques flojos	1 día	sab 30/01/10	sab 30/01/10
112		Reparación de carpetas	2 días	lun 01/02/10	mar 02/02/10
113		Reparación de revoques	2 días	lun 01/02/10	mar 02/02/10
114		Ejecución de contrapisos en locales sanitario	1 día	sab 06/02/10	sab 06/02/10
115		Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	sab 06/02/10	sab 06/02/10
116		Reparación de solado existente y reemplazo	4 días	lun 15/02/10	jue 18/02/10
117		Colocación de solías	1 día	vie 19/02/10	vie 19/02/10
118		Colocación de solado en sanitarios	1 día	vie 19/02/10	vie 19/02/10
119		Colocación de revestimientos en sanitarios	2 días	sab 20/02/10	lun 22/02/10
120		Instalaciones sanitarias	16 días	mié 03/02/10	mar 23/02/10
121		Distribución de alimentación agua fría y calie	2 días	mié 03/02/10	jue 04/02/10
122		Desagües cloacales	1 día	vie 05/02/10	vie 05/02/10
123		Pruebas hidráulicas	1 día	sab 06/02/10	sab 06/02/10
124		Colocación de artefactos y grifería	1 día	mar 23/02/10	mar 23/02/10
125		Durlock	12 días	jue 04/02/10	mié 17/02/10
126		Estructura de tabiques	2 días	jue 04/02/10	vie 05/02/10
127		Emplacado y masillado de tabiques	3 días	sab 06/02/10	mar 09/02/10
128		Estructura de cielorrasos continuos	3 días	sab 06/02/10	mar 09/02/10
129		Emplacado y masillado de cielorrasos	4 días	mié 10/02/10	sáb 13/02/10
130		Ejecución de gargantas	3 días	lun 15/02/10	mié 17/02/10
131		Cielorraso desmontable	2 días	vie 19/02/10	sáb 20/02/10
132		Colocación y nivelación de perfilería	1,5 días	vie 19/02/10	sáb 20/02/10
133		Colocación de placas	0,5 días	sáb 20/02/10	sáb 20/02/10
134		Aire Acondicionado	10 días	jue 04/02/10	lun 15/02/10
135		Montaje de conductos	4 días	jue 04/02/10	lun 08/02/10
136		Instalación de cañerías	2 días	mar 09/02/10	mié 10/02/10
137		Instalación de equipos split	4 días	mar 09/02/10	vie 12/02/10
138		Colocación de rejas y difusores	1 día	sáb 13/02/10	sáb 13/02/10
139		Puesta en marcha y regulación	1 día	lun 15/02/10	lun 15/02/10
140		Instalación eléctrica	25 días	jue 04/02/10	jue 04/03/10
141		Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	jue 04/02/10	vie 05/02/10
142		Tendido de cañería bajo piso	1 día	lun 08/02/10	lun 08/02/10
143		Cañería para circuitos de iluminación	3 días	sáb 06/02/10	mar 09/02/10
144		Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
145		Alimentador para equipos A° A°	2 días	mar 09/02/10	mié 10/02/10
146		Colocación de oscuadroductos y unizanales	2 días	vie 12/02/10	sáb 13/02/10
147		Canalización para tomacorrientes de servicio	1 día	lun 15/02/10	lun 15/02/10
148		Cableado de tensión en puestos	1 día	mar 16/02/10	mar 16/02/10
149		Cableado de datos en puestos	1 día	mié 17/02/10	mié 17/02/10
150		Cableado de iluminación	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
151		Colocación de artefactos	2 días	mié 03/03/10	jue 04/03/10
152		Armado de tablero seccional	2 días	mié 17/02/10	jue 18/02/10
153		Patchado de nuevo cableado de datos en re	2 días	jue 18/02/10	vie 19/02/10
154		Herrería	7 días	mié 10/02/10	mié 17/02/10
155		Colocación de rejas y nuevas carpinterías	4 días	mié 10/02/10	sáb 13/02/10
156		Colocación de nuevas carpinterías de acceso	3 días	lun 15/02/10	mié 17/02/10
157		Recinto de Seguridad	8 días	jue 18/02/10	mar 23/02/10
158		Ejecución de tabiques de acuerdo a detalle	2 días	jue 18/02/10	vie 19/02/10
159		Colocación de placas de acero Antifal	2 días	sáb 20/02/10	lun 22/02/10
160		Montaje de puerta de seguridad	1 día	mar 23/02/10	mar 23/02/10
161		Vidrios y espejos	10 días	mié 24/02/10	sáb 06/03/10
162		Colocación de vidrios laminados	2 días	mié 24/02/10	jue 25/02/10
163		Colocación de espejos en baños	1 día	sáb 06/03/10	sáb 06/03/10
164		Zócalos	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
165		Colocación de zócalos	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
166		Pintura	11 días	mar 23/02/10	sáb 06/03/10
167		Preparación de paredes y cielorrasos	3 días	mar 23/02/10	jue 25/02/10
168		Pintura de carpinterías y rejas	2 días	vie 26/02/10	sáb 27/02/10
169		Pintura de cielorrasos	2 días	lun 01/03/10	mar 02/03/10
170		Pintura de paredes	3 días	mié 03/03/10	vie 05/03/10
171		Retoques finales de pintura	1 día	sáb 06/03/10	sáb 06/03/10
172		Montaje de módulos de Cajas	1 día	sáb 06/03/10	sáb 06/03/10
173		Limpieza Final	1 día	lun 08/03/10	lun 08/03/10
174		3ra ETAPA	21 días	mar 09/03/10	jue 08/04/10
175		Trabajos preliminares	1 día	mar 09/03/10	mar 09/03/10
176		Retiro de elementos del banco	1 día	mar 09/03/10	mar 09/03/10
177		Desmontes y demoliciones	8 días	mié 10/03/10	jue 18/03/10
178		Retiro de cartelería	1 día	mié 10/03/10	mié 10/03/10
179		Retiro de artefactos y demás elementos no al	1 día	jue 11/03/10	jue 11/03/10
180		Desmonte y retiro de cielorrasos	2 días	mié 10/03/10	jue 11/03/10
181		Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	1 día	vie 12/03/10	vie 12/03/10
182		Elaboración de memoria de cálculo	2 días	sáb 13/03/10	lun 15/03/10
183		Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	mar 16/03/10	mié 17/03/10
184		Demolición de muros portantes	1 día	jue 18/03/10	jue 18/03/10
185		Albañilería	9 días	sáb 13/03/10	mar 23/03/10
186		Picado de revoques flojos	1 día	sáb 13/03/10	sáb 13/03/10
187		Reparación de carpetas	2 días	sáb 20/03/10	lun 22/03/10
188		Reparación de revoques	2 días	lun 15/03/10	mar 16/03/10
189		Ejecución de contrapisos en locales sanitario	1 día	sáb 20/03/10	sáb 20/03/10
190		Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	sáb 20/03/10	sáb 20/03/10
191		Colocación de solías	1 día	vie 19/03/10	vie 19/03/10
192		Colocación de solado en sanitarios	1 día	vie 19/03/10	vie 19/03/10
193		Colocación de revestimientos en sanitarios	2 días	vie 19/03/10	sáb 20/03/10
194		Arreglos en vereda	2 días	lun 22/03/10	mar 23/03/10
195		Instalaciones sanitarias	4,5 días	mié 17/03/10	lun 22/03/10
196		Distribución de alimentación agua fría y calie	2 días	mié 17/03/10	jue 18/03/10
197		Desagües cloacales	1 día	vie 19/03/10	vie 19/03/10
198		Pruebas hidráulicas	1 día	sáb 20/03/10	sáb 20/03/10
199		Colocación de artefactos y grifería	0,5 días	lun 22/03/10	lun 22/03/10
200		Durlock	6 días	vie 19/03/10	jue 25/03/10
201		Estructura de tabiques	2 días	vie 19/03/10	sáb 20/03/10
202		Emplacado y masillado de tabiques	3 días	lun 22/03/10	mié 24/03/10
203		Estructura de cielorrasos continuos	2 días	lun 22/03/10	mar 23/03/10
204		Emplacado y masillado de cielorrasos	2 días	mié 24/03/10	jue 25/03/10
205		Aire Acondicionado	15 días	vie 19/03/10	lun 05/04/10
206		Montaje de conductos	3 días	vie 19/03/10	lun 22/03/10
207		Instalación de cañerías	2 días	mar 23/03/10	mié 24/03/10
208		Colocación de rejas y difusores	1 día	sáb 03/04/10	sáb 03/04/10
209		Puesta en marcha y regulación	1 día	lun 05/04/10	lun 05/04/10
210		Instalación eléctrica	15 días	vie 19/03/10	lun 05/04/10
211		Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	vie 19/03/10	sáb 20/03/10
212		Tendido de cañería bajo piso	1 día	lun 22/03/10	lun 22/03/10
213		Cañería para circuitos de iluminación	3 días	lun 22/03/10	mar 23/03/10
214		Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	mié 24/03/10	jue 25/03/10
215		Colocación de oscuadroductos y unizanales	2 días	vie 26/03/10	sáb 27/03/10
216		Canalización para tomacorrientes de servicio	1 día	lun 29/03/10	lun 29/03/10
217		Cableado de tensión en puestos	1 día	mar 30/03/10	mar 30/03/10
218		Cableado de datos en puestos	1 día	mié 31/03/10	mié 31/03/10
219		Cableado de iluminación	2 días	mié 24/03/10	jue 25/03/10
220		Colocación de artefactos	2 días	sáb 03/04/10	lun 05/04/10
221		Armado de tablero seccional	2 días	mié 31/03/10	jue 01/04/10
222		Traslado de rack y patchado de nuevos pun	2 días	jue 01/04/10	vie 02/04/10
223		Herrería	2 días	jue 25/03/10	vie 26/03/10
224		Colocación de rejas y nuevas carpinterías	2 días	jue 25/03/10	vie 26/03/10
225		Vidrios y espejos	10 días	sáb 27/03/10	mié 07/04/10
226		Colocación de vidrios laminados	3 días	sáb 27/03/10	lun 29/03/10
227		Colocación de espejos en baños	1 día	mié 07/04/10	mié 07/04/10
228		Zócalos	2 días	jue 25/03/10	vie 26/03/10
229		Colocación de zócalos	2 días	jue 25/03/10	vie 26/03/10
230		Pintura	11 días	vie 26/03/10	mié 07/04/10
231		Preparación de paredes y cielorrasos	3 días	vie 26/03/10	lun 29/03/10
232		Pintura de carpinterías y rejas	2 días	mar 30/03/10	mié 31/03/10
233		Pintura de cielorrasos	2 días	jue 01/04/10	vie 02/04/10
234		Pintura de paredes	3 días	sáb 03/04/10	mar 06/04/10
235		Retoques finales de pintura	1 día	mié 07/04/10	mié 07/04/10
236		Montaje de módulos de Cajas	1 día	mié 07/04/10	mié 07/04/10
237		Limpieza Final	1 día	jue 08/04/10	jue 08/04/10

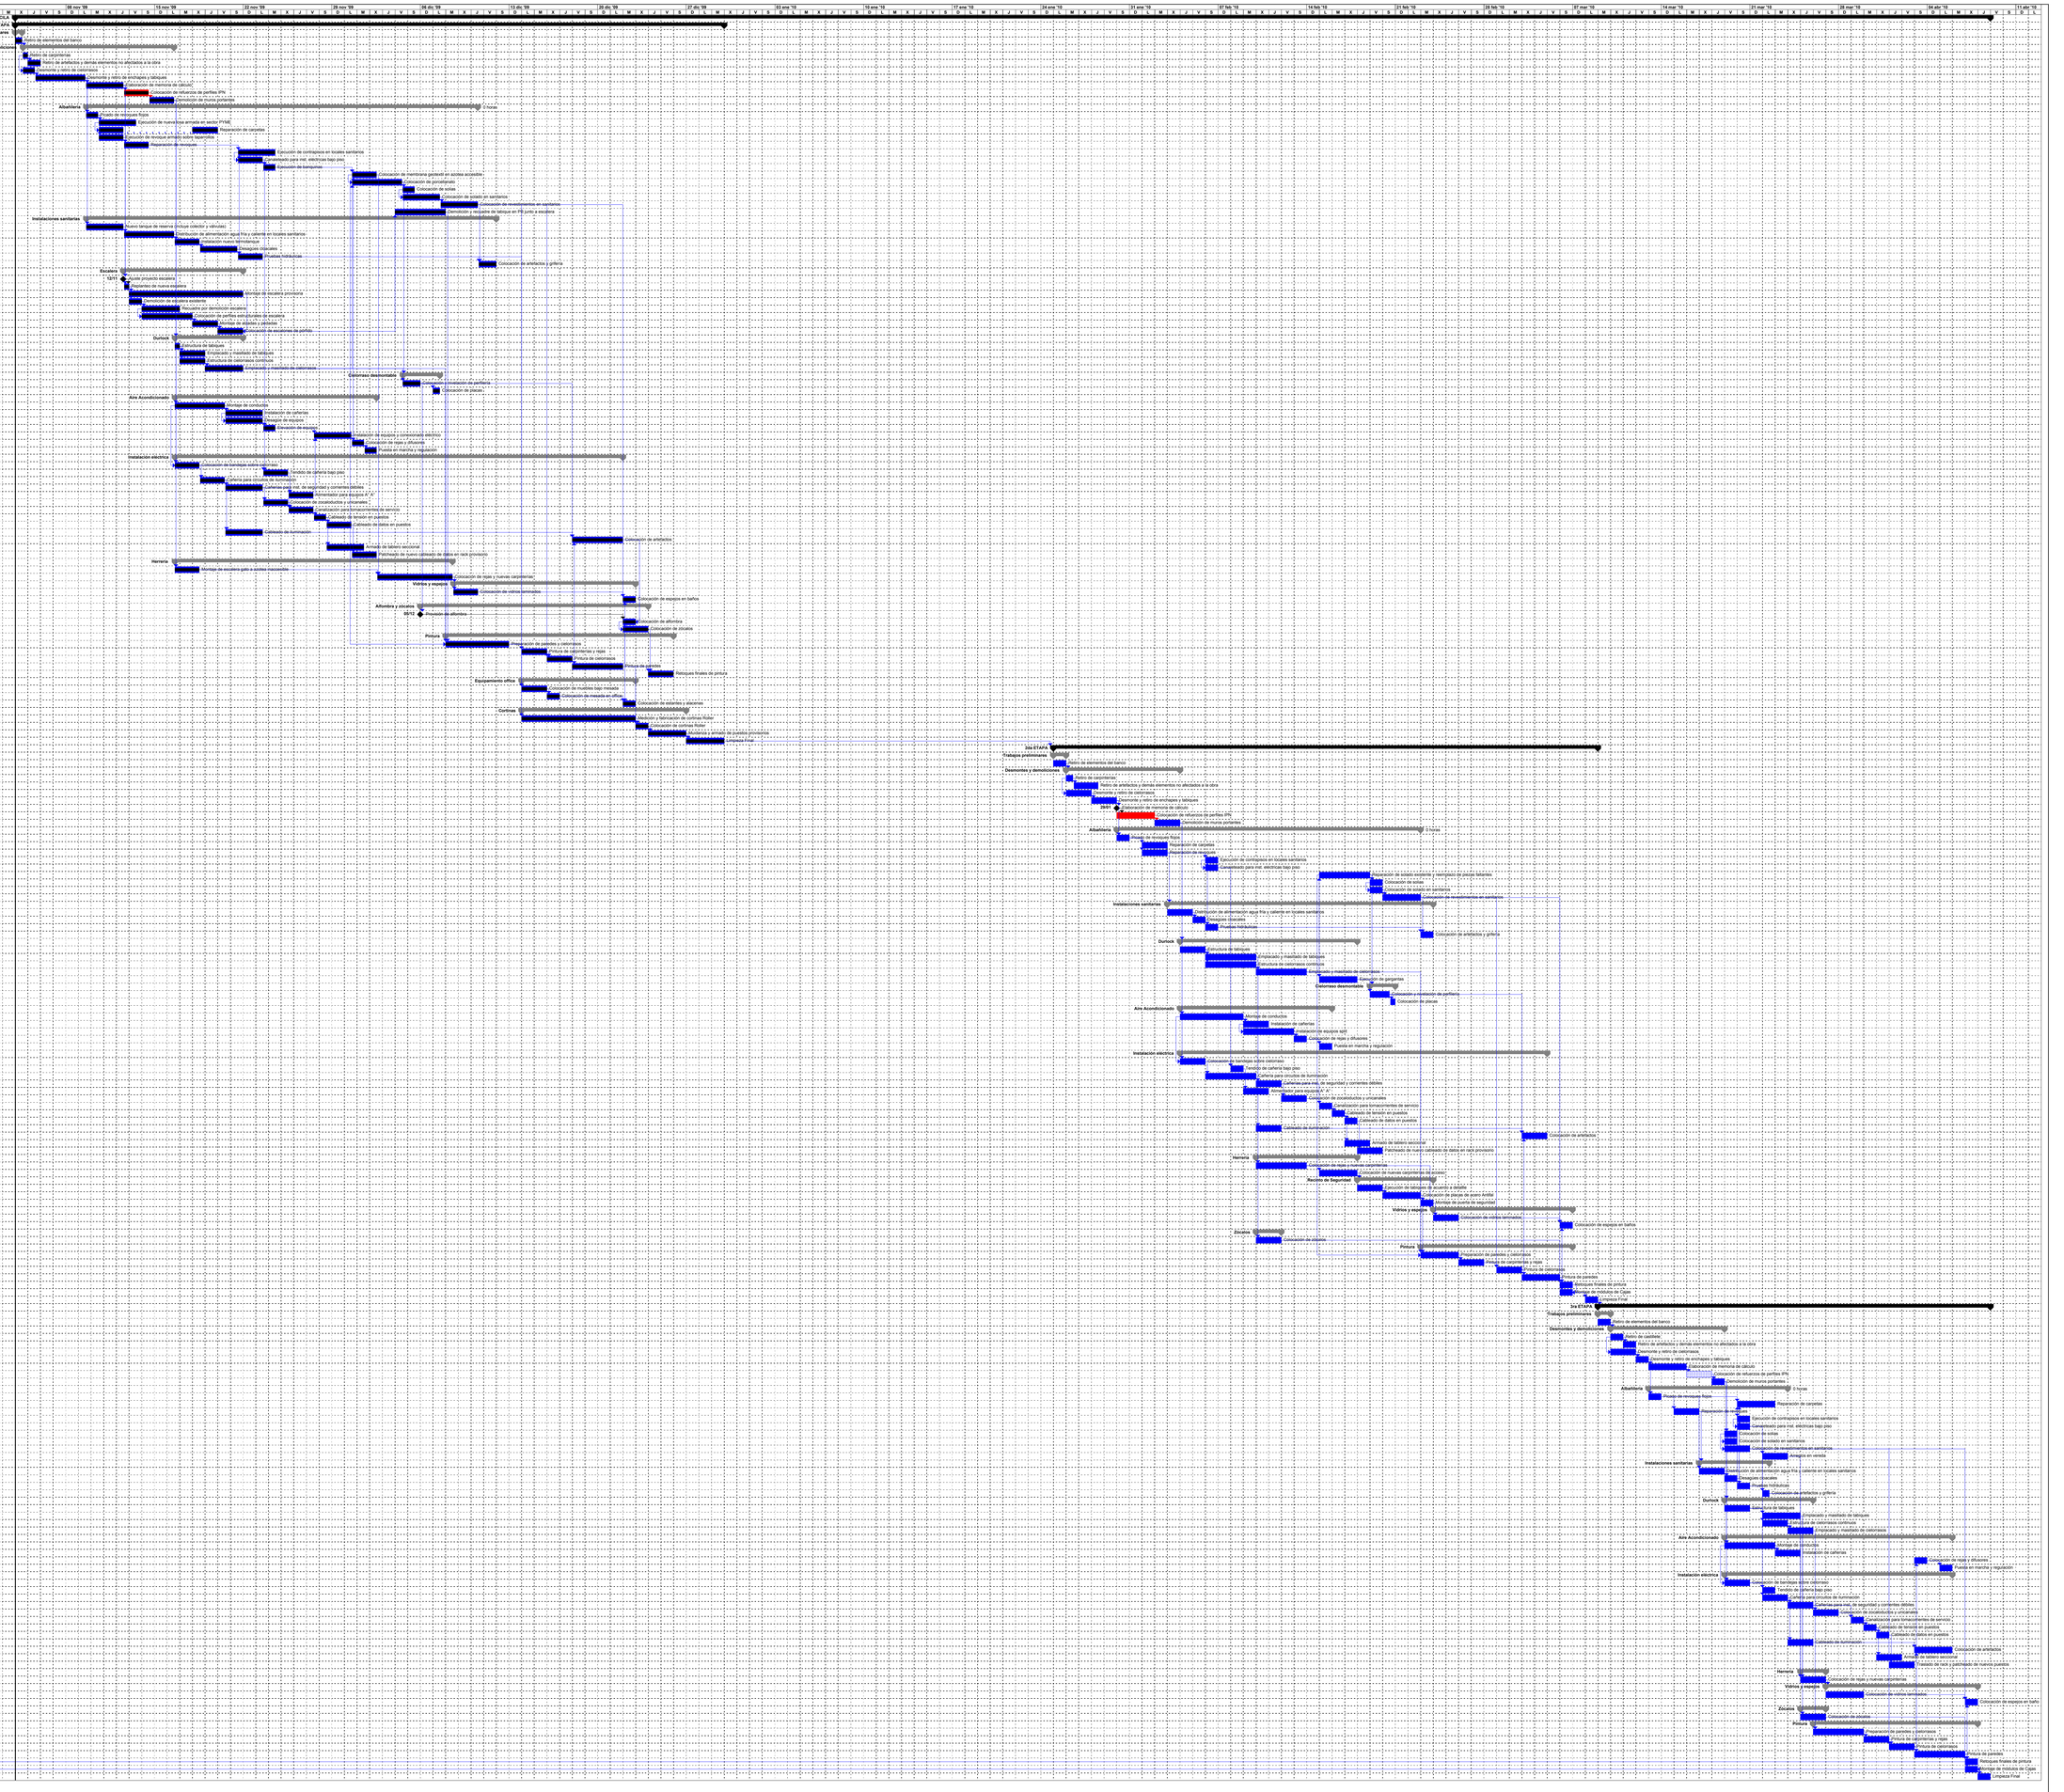

Proyecto: Bco Ciudad La Lucila_P
Fecha: jue 11/03/10

Tarea | División | Progreso | Hito | n | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite
