Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		SUCURSAL LA LUCILA	134 días	mié 04/11/09	jue 08/04/10
2	✓	1ra ETAPA	48 días	mié 04/11/09	mar 29/12/09
3	✓	Trabajos preliminares	6,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
4	✓	Retiro de elementos del banco	6,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
5	✓	Desmontes y demoliciones	10 días	mié 04/11/09	lun 16/11/09
6	✓	Retiro de carpinterías	6,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
7	✓	Retiro de artefactos y demás elementos no al	1 día	jue 05/11/09	jue 05/11/09
8	✓	Desmonte y retiro de cielorrasos	1 día	mié 04/11/09	jue 05/11/09
9	✓	Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	3 días	jue 05/11/09	lun 09/11/09
10	✓	Elaboración de memoria de cálculo	3 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09
11	✓	Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	jue 12/11/09	sab 14/11/09
12	✓	Demolición de muros portantes	1 día	sab 14/11/09	lun 16/11/09
13	✓	Albañilería	27 días	lun 09/11/09	jue 10/12/09
14	✓	Picado de revoques flojos	1 día	lun 09/11/09	mar 10/11/09
15	✓	Ejecución de nueva losa armada en sector P1	3 días	mar 10/11/09	vie 13/11/09
16	✓	Reparación de carpetas	4 días	mar 10/11/09	jue 19/11/09
17	✓	Ejecución de revoque armado sobre tapamiñ	2 días	mar 10/11/09	jue 12/11/09
18	✓	Reparación de revoques	2 días	jue 12/11/09	sab 14/11/09
19	✓	Ejecución de contrapisos en locales sanitario	2 días	sáb 21/11/09	mar 24/11/09
20	✓	Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	sáb 21/11/09	lun 23/11/09
21	✓	Ejecución de banquinas	1 día	lun 23/11/09	mar 24/11/09
22	✓	Colocación de membrana geotextil en azotea	2 días	lun 30/11/09	mié 02/12/09
23	✓	Colocación de porcelanato	4 días	lun 30/11/09	vie 04/12/09
24	✓	Colocación de solías	1 día	vie 04/12/09	sáb 05/12/09
25	✓	Colocación de zócalo en sanitarios	2 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
26	✓	Colocación de revestimientos en sanitarios	3 días	lun 07/12/09	jue 10/12/09
27	✓	Desnivelado y recubrim de tabique en PB junto	3 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
28	✓	Instalaciones sanitarias	26,5 días	lun 09/11/09	vie 11/12/09
29	✓	Nuevo tanque de reserva (incluye colector y	3 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09
30	✓	Distribución de alimentación agua fría y calie	3 días	jue 12/11/09	lun 16/11/09
31	✓	Instalación nuevo termotanque	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
32	✓	Desagües cloacales	3 días	mié 18/11/09	sáb 21/11/09
33	✓	Pruebas hidráulicas	1 día	sáb 21/11/09	lun 23/11/09
34	✓	Colocación de artefactos y grifería	1,5 días	jue 10/12/09	vie 11/12/09
35	✓	Escalera	6,5 días	jue 12/11/09	sáb 21/11/09
36	✓	Ajuste proyecto escalera	0 días	jue 12/11/09	jue 12/11/09
37	✓	Replanteo de nuevo escalera	0,5 días	jue 12/11/09	jue 12/11/09
38	✓	Montaje de escalera provisoria	6 días	vie 13/11/09	sáb 21/11/09
39	✓	Demolición de escalera existente	1 día	vie 13/11/09	vie 13/11/09
40	✓	Recuadre por demolición escalera	2 días	sáb 14/11/09	lun 16/11/09
41	✓	Colocación de perfiles estructurales de escal	3 días	sáb 14/11/09	mar 17/11/09
42	✓	Montaje de alzadas y pedadas	2 días	mié 18/11/09	jue 19/11/09
43	✓	Colocación de escuadros de pórtico	2 días	vie 20/11/09	sáb 21/11/09
44	✓	Durlock	5,5 días	lun 16/11/09	sáb 21/11/09
45	✓	Estructura de tabiques	0,5 días	lun 16/11/09	lun 16/11/09
46	✓	Emplacado y masillado de tabiques	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09
47	✓	Estructura de cielorrasos continuos	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09
48	✓	Emplacado y masillado de cielorrasos	3 días	jue 19/11/09	sáb 21/11/09
49	✓	Cielorraso desmontable	2 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
50	✓	Colocación y nivelación de perfilería	1,5 días	vie 04/12/09	sáb 05/12/09
51	✓	Colocación de placas	0,5 días	lun 07/12/09	lun 07/12/09
52	✓	Aire Acondicionado	14 días	lun 16/11/09	mié 02/12/09
53	✓	Montaje de conductos	4 días	lun 16/11/09	vie 20/11/09
54	✓	Instalación de cañerías	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
55	✓	Desagüe de equipos	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
56	✓	Elevación de equipos	1 día	lun 23/11/09	mar 24/11/09
57	✓	Instalación de equipos y conexionado eléctric	2 días	vie 27/11/09	lun 30/11/09
58	✓	Colocación de rejas y difusores	1 día	lun 30/11/09	mar 01/12/09
59	✓	Puesta en marcha y regulación	1 día	mar 01/12/09	mié 02/12/09
60	✓	Instalación eléctrica	30,5 días	lun 16/11/09	lun 21/12/09
61	✓	Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
62	✓	Tendido de cañería bajo piso	2 días	lun 23/11/09	mié 25/11/09
63	✓	Cañería para circuitos de iluminación	2 días	mié 18/11/09	vie 20/11/09
64	✓	Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
65	✓	Alimentador para equipos A° A°	2 días	mié 25/11/09	vie 27/11/09
66	✓	Colocación de oscuridoctos y unizanales	2 días	lun 23/11/09	mié 25/11/09
67	✓	Canalización para tomacorrientes de servicio	2 días	mié 25/11/09	vie 27/11/09
68	✓	Cableado de tensión en puestos	1 día	vie 27/11/09	sáb 28/11/09
69	✓	Cableado de datos en puestos	1 día	sáb 28/11/09	lun 30/11/09
70	✓	Cableado de iluminación	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
71	✓	Colocación de artefactos	3 días	vie 18/12/09	lun 21/12/09
72	✓	Armado de tablero seccional	2 días	sáb 28/11/09	mar 01/12/09
73	✓	Patchado de nuevo cableado de datos en re	2 días	lun 30/11/09	mié 02/12/09
74	✓	Herrería	19 días	lun 16/11/09	mar 08/12/09
75	✓	Montaje de escalera gato y azotea inaccesible	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
76	✓	Colocación de rejas y nuevas carpinterías	2 días	mié 02/12/09	mar 08/12/09
77	✓	Vidrios y espejos	12,5 días	mar 08/12/09	mar 22/12/09
78	✓	Colocación de vidrios laminados	2 días	mar 08/12/09	jue 10/12/09
79	✓	Colocación de espejos en baños	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
80	✓	Alfombra y zócalos	15 días	sáb 05/12/09	mié 23/12/09
81	✓	Provisión de alfombra	6 días	sáb 05/12/09	sáb 05/12/09
82	✓	Colocación de alfombra	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
83	✓	Colocación de zócalos	2 días	mar 22/12/09	mié 23/12/09
84	✓	Pintura	16 días	mar 08/12/09	vie 25/12/09
85	✓	Preparación de paredes y cielorrasos	5 días	mar 08/12/09	sáb 12/12/09
86	✓	Pintura de carpinterías y rejas	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09
87	✓	Pintura de cielorrasos	2 días	mié 16/12/09	jue 17/12/09
88	✓	Pintura de paredes	3 días	vie 18/12/09	lun 21/12/09
89	✓	Retoques finales de pintura	2 días	jue 24/12/09	vie 25/12/09
90	✓	Equipamiento office	6 días	lun 14/12/09	mar 22/12/09
91	✓	Colocación de muebles bajo mesada	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09
92	✓	Colocación de mesada en office	1 día	mié 16/12/09	mié 16/12/09
93	✓	Colocación de estantes y alacenas	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
94	✓	Cortinas	12 días	lun 14/12/09	sáb 26/12/09
95	✓	Medición y fabricación de cortinas Roller	6 días	lun 14/12/09	mar 22/12/09
96	✓	Colocación de cortinas Roller	1 día	mié 23/12/09	mié 23/12/09
97	✓	Mudanza y armado de puestos provisorios	3 días	jue 24/12/09	sáb 26/12/09
98	✓	Limpieza Final	2 días	dom 27/12/09	mar 29/12/09
99		2da ETAPA	37 días	lun 25/01/10	lun 08/03/10
100	✓	Trabajos preliminares	1 día	lun 25/01/10	lun 25/01/10
101	✓	Retiro de elementos del banco	1 día	lun 25/01/10	lun 25/01/10
102	✓	Desmontes y demoliciones	11 días	mar 26/01/10	sáb 06/02/10
103	✓	Retiro de carpinterías	1,5 días	mar 26/01/10	sáb 06/02/10
104	✓	Retiro de artefactos y demás elementos no al	2 días	mar 26/01/10	jue 28/01/10
105	✓	Desmonte y retiro de cielorrasos	2 días	mar 26/01/10	mié 27/01/10
106	✓	Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	2 días	jue 28/01/10	vie 29/01/10
107	✓	Elaboración de memoria de cálculo	0 días	vie 29/01/10	vie 29/01/10
108	✓	Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	sáb 30/01/10	lun 01/02/10
109	✓	Demolición de muros portantes	2 días	mar 02/02/10	mié 03/02/10
110		Albañilería	20 días	sáb 30/01/10	lun 22/02/10
111	✓	Picado de revoques flojos	1 día	sáb 30/01/10	sáb 30/01/10
112	✓	Reparación de carpetas	2 días	lun 01/02/10	mar 02/02/10
113	✓	Reparación de revoques	2 días	lun 01/02/10	mar 02/02/10
114	✓	Ejecución de contrapisos en locales sanitario	1 día	sáb 06/02/10	sáb 06/02/10
115	✓	Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	sáb 06/02/10	sáb 06/02/10
116		Reparación de solado existente y reemplazo -	4 días	lun 15/02/10	jue 18/02/10
117		Colocación de solías	1 día	vie 19/02/10	vie 19/02/10
118		Colocación de solado en sanitarios	1 día	vie 19/02/10	vie 19/02/10
119		Colocación de revestimientos en sanitarios	2 días	sáb 20/02/10	lun 22/02/10
120		Instalaciones sanitarias	16 días	mié 03/02/10	mar 23/02/10
121		Distribución de alimentación agua fría y calie	2 días	mié 03/02/10	jue 04/02/10
122		Desagües cloacales	1 día	vie 05/02/10	vie 05/02/10
123		Pruebas hidráulicas	1 día	sáb 06/02/10	sáb 06/02/10
124		Colocación de artefactos y grifería	1 día	mar 23/02/10	mar 23/02/10
125		Durlock	12 días	jue 04/02/10	mié 17/02/10
126		Estructura de tabiques	2 días	jue 04/02/10	vie 05/02/10
127		Emplacado y masillado de tabiques	3 días	sáb 06/02/10	mar 09/02/10
128		Estructura de cielorrasos continuos	3 días	sáb 06/02/10	mar 09/02/10
129		Emplacado y masillado de cielorrasos	4 días	mié 10/02/10	sáb 13/02/10
130		Ejecución de gargantas	3 días	lun 15/02/10	mié 17/02/10
131		Cielorraso desmontable	2 días	vie 19/02/10	sáb 20/02/10
132		Colocación y nivelación de perfilería	1,5 días	vie 19/02/10	sáb 20/02/10
133		Colocación de placas	0,5 días	sáb 20/02/10	sáb 20/02/10
134		Aire Acondicionado	10 días	jue 04/02/10	lun 15/02/10
135		Montaje de conductos	4 días	jue 04/02/10	lun 08/02/10
136		Instalación de cañerías	2 días	mar 09/02/10	mié 10/02/10
137		Instalación de equipos split	4 días	mar 09/02/10	vie 12/02/10
138		Colocación de rejas y difusores	1 día	sáb 13/02/10	sáb 13/02/10
139		Puesta en marcha y regulación	1 día	lun 15/02/10	lun 15/02/10
140		Instalación eléctrica	25 días	jue 04/02/10	jue 04/03/10
141		Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	jue 04/02/10	vie 05/02/10
142		Tendido de cañería bajo piso	1 día	lun 08/02/10	lun 08/02/10
143		Cañería para circuitos de iluminación	3 días	sáb 06/02/10	mar 09/02/10
144		Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
145		Alimentador para equipos A° A°	2 días	mar 09/02/10	mié 10/02/10
146		Colocación de oscuridoctos y unizanales	2 días	vie 12/02/10	sáb 13/02/10
147		Canalización para tomacorrientes de servicio	1 día	lun 15/02/10	lun 15/02/10
148		Cableado de tensión en puestos	1 día	mar 16/02/10	mar 16/02/10
149		Cableado de datos en puestos	1 día	mié 17/02/10	mié 17/02/10
150		Cableado de iluminación	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
151		Colocación de artefactos	2 días	mié 03/03/10	jue 04/03/10
152		Armado de tablero seccional	2 días	mié 17/02/10	jue 18/02/10
153		Patchado de nuevo cableado de datos en re	2 días	jue 18/02/10	vie 19/02/10
154		Herrería	7 días	mié 10/02/10	mié 17/02/10
155		Colocación de rejas y nuevas carpinterías	4 días	mié 10/02/10	sáb 13/02/10
156		Colocación de nuevas carpinterías de acceso	3 días	lun 15/02/10	mié 17/02/10
157		Recinto de Seguridad	8 días	jue 18/02/10	mar 23/02/10
158		Ejecución de tabiques de acuerdo a detalle	2 días	jue 18/02/10	vie 19/02/10
159		Colocación de placas de acero Antifal	2 días	sáb 20/02/10	lun 22/02/10
160		Montaje de puerta de seguridad	1 día	mar 23/02/10	mar 23/02/10
161		Vidrios y espejos	10 días	mié 24/02/10	sáb 06/03/10
162		Colocación de vidrios laminados	2 días	mié 24/02/10	jue 26/02/10
163		Colocación de espejos en baños	1 día	sáb 06/03/10	sáb 06/03/10
164		Zócalos	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
165		Colocación de zócalos	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
166		Pintura	11 días	mar 23/02/10	sáb 06/03/10
167		Preparación de paredes y cielorrasos	3 días	mar 23/02/10	jue 25/02/10
168		Pintura de carpinterías y rejas	2 días	vie 26/02/10	sáb 27/02/10
169		Pintura de cielorrasos	2 días	lun 01/03/10	mar 02/03/10
170		Pintura de paredes	3 días	mié 03/03/10	vie 05/03/10
171		Retoques finales de pintura	1 día	sáb 06/03/10	sáb 06/03/10
172		Montaje de módulos de Cajas	1 día	sáb 06/03/10	sáb 06/03/10
173		Limpieza Final	1 día	lun 08/03/10	lun 08/03/10
174		3ra ETAPA	21 días	mar 09/03/10	jue 08/04/10
175		Trabajos preliminares	1 día	mar 09/03/10	mar 09/03/10
176		Retiro de elementos del banco	1 día	mar 09/03/10	mar 09/03/10
177		Desmontes y demoliciones	8 días	mié 10/03/10	jue 18/03/10
178		Retiro de cielorrasos	1 día	mié 10/03/10	mié 10/03/10
179		Retiro de artefactos y demás elementos no al	1 día	jue 11/03/10	jue 11/03/10
180		Desmonte y retiro de cielorrasos	2 días	mié 10/03/10	jue 11/03/10
181		Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	1 día	vie 12/03/10	vie 12/03/10
182		Elaboración de memoria de cálculo	2 días	sáb 13/03/10	lun 15/03/10
183		Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	mar 16/03/10	mié 17/03/10
184		Demolición de muros portantes	1 día	jue 18/03/10	jue 18/03/10
185		Albañilería	9 días	sáb 13/03/10	mar 23/03/10
186		Picado de revoques flojos	1 día	sáb 13/03/10	sáb 13/03/10
187		Reparación de carpetas	2 días	sáb 20/03/10	lun 22/03/10
188		Reparación de revoques	2 días	lun 15/03/10	mar 16/03/10
189		Ejecución de contrapisos en locales sanitario	1 día	sáb 20/03/10	sáb 20/03/10
190		Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	sáb 20/03/10	sáb 20/03/10
191		Colocación de solías	1 día	vie 19/03/10	vie 19/03/10
192		Colocación de solado en sanitarios	1 día	vie 19/03/10	vie 19/03/10
193		Colocación de revestimientos en sanitarios	2 días	vie 19/03/10	sáb 20/03/10
194		Arreglos en vereda	2 días	lun 22/03/10	mar 23/03/10
195		Instalaciones sanitarias	4,5 días	mié 17/03/10	lun 22/03/10
196		Distribución de alimentación agua fría y calie	2 días	mié 17/03/10	jue 18/03/10
197		Desagües cloacales	1 día	vie 19/03/10	vie 19/03/10
198		Pruebas hidráulicas	1 día	sáb 20/03/10	sáb 20/03/10
199		Colocación de artefactos y grifería	0,5 días	lun 22/03/10	lun 22/03/10
200		Durlock	6 días	vie 19/03/10	jue 25/03/10
201		Estructura de tabiques	2 días	vie 19/03/10	sáb 20/03/10
202		Emplacado y masillado de tabiques	3 días	lun 22/03/10	mié 24/03/10
203		Estructura de cielorrasos continuos	2 días	lun 22/03/10	mar 23/03/10
204		Emplacado y masillado de cielorrasos	2 días	mié 24/03/10	jue 25/03/10
205		Aire Acondicionado	15 días	vie 19/03/10	lun 05/04/10
206		Montaje de conductos	3 días	vie 19/03/10	lun 22/03/10
207		Instalación de cañerías	2 días	mar 23/03/10	mié 24/03/10
208		Colocación de rejas y difusores	1 día	sáb 03/04/10	sáb 03/04/10
209		Puesta en marcha y regulación	1 día	lun 05/04/10	lun 05/04/10
210		Instalación eléctrica	15 días	vie 19/03/10	lun 05/04/10
211		Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	vie 19/03/10	sáb 20/03/10
212		Tendido de cañería bajo piso	1 día	lun 22/03/10	lun 22/03/10
213		Cañería para circuitos de iluminación	3 días	lun 22/03/10	mar 23/03/10
214		Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	mié 24/03/10	jue 25/03/10
215		Colocación de oscuridoctos y unizanales	2 días	vie 26/03/10	sáb 27/03/10
216		Canalización para tomacorrientes de servicio	1 día	lun 29/03/10	lun 29/03/10
217		Cableado de tensión en puestos	1 día	mar 30/03/10	mar 30/03/10
218		Cableado de datos en puestos	1 día	mié 31/03/10	mié 31/03/10
219		Cableado de iluminación	2 días	mié 24/03/10	jue 25/03/10
220		Colocación de artefactos	2 días	sáb 03/04/10	lun 05/04/10
221		Armado de tablero seccional	2 días	mié 31/03/10	jue 01/04/10
222		Traslado de rack y patchado de nuevos pun	2 días	jue 01/04/10	vie 02/04/10
223		Herrería	2 días	jue 25/03/10	vie 26/03/10
224		Colocación de rejas y nuevas carpinterías	2 días	jue 25/03/10	vie 26/03/10
225		Vidrios y espejos	10 días	sáb 27/03/10	mié 07/04/10
226		Colocación de vidrios laminados	3 días	sáb 27/03/10	lun 29/03/10
227		Colocación de espejos en baños	1 día	mié 07/04/10	mié 07/04/10
228		Zócalos	2 días	jue 25/03/10	vie 26/03/10
229		Colocación de zócalos	2 días	jue 25/03/10	vie 26/03/10
230		Pintura	11 días	vie 26/03/10	mié 07/04/10
231		Preparación de paredes y cielorrasos	2 días	vie 26/03/10	lun 29/03/10
232		Pintura de carpinterías y rejas	2 días	mar 30/03/10	mié 31/03/10
233		Pintura de cielorrasos	2 días	jue 01/04/10	vie 02/04/10
234		Pintura de paredes	3 días	sáb 03/04/10	mar 06/04/10
235		Retoques finales de pintura	1 día	mié 07/04/10	mié 07/04/10
236		Montaje de módulos de Cajas	1 día	mié 07/04/10	mié 07/04/10
237		Limpieza Final	1 día	jue 08/04/10	jue 08/04/10

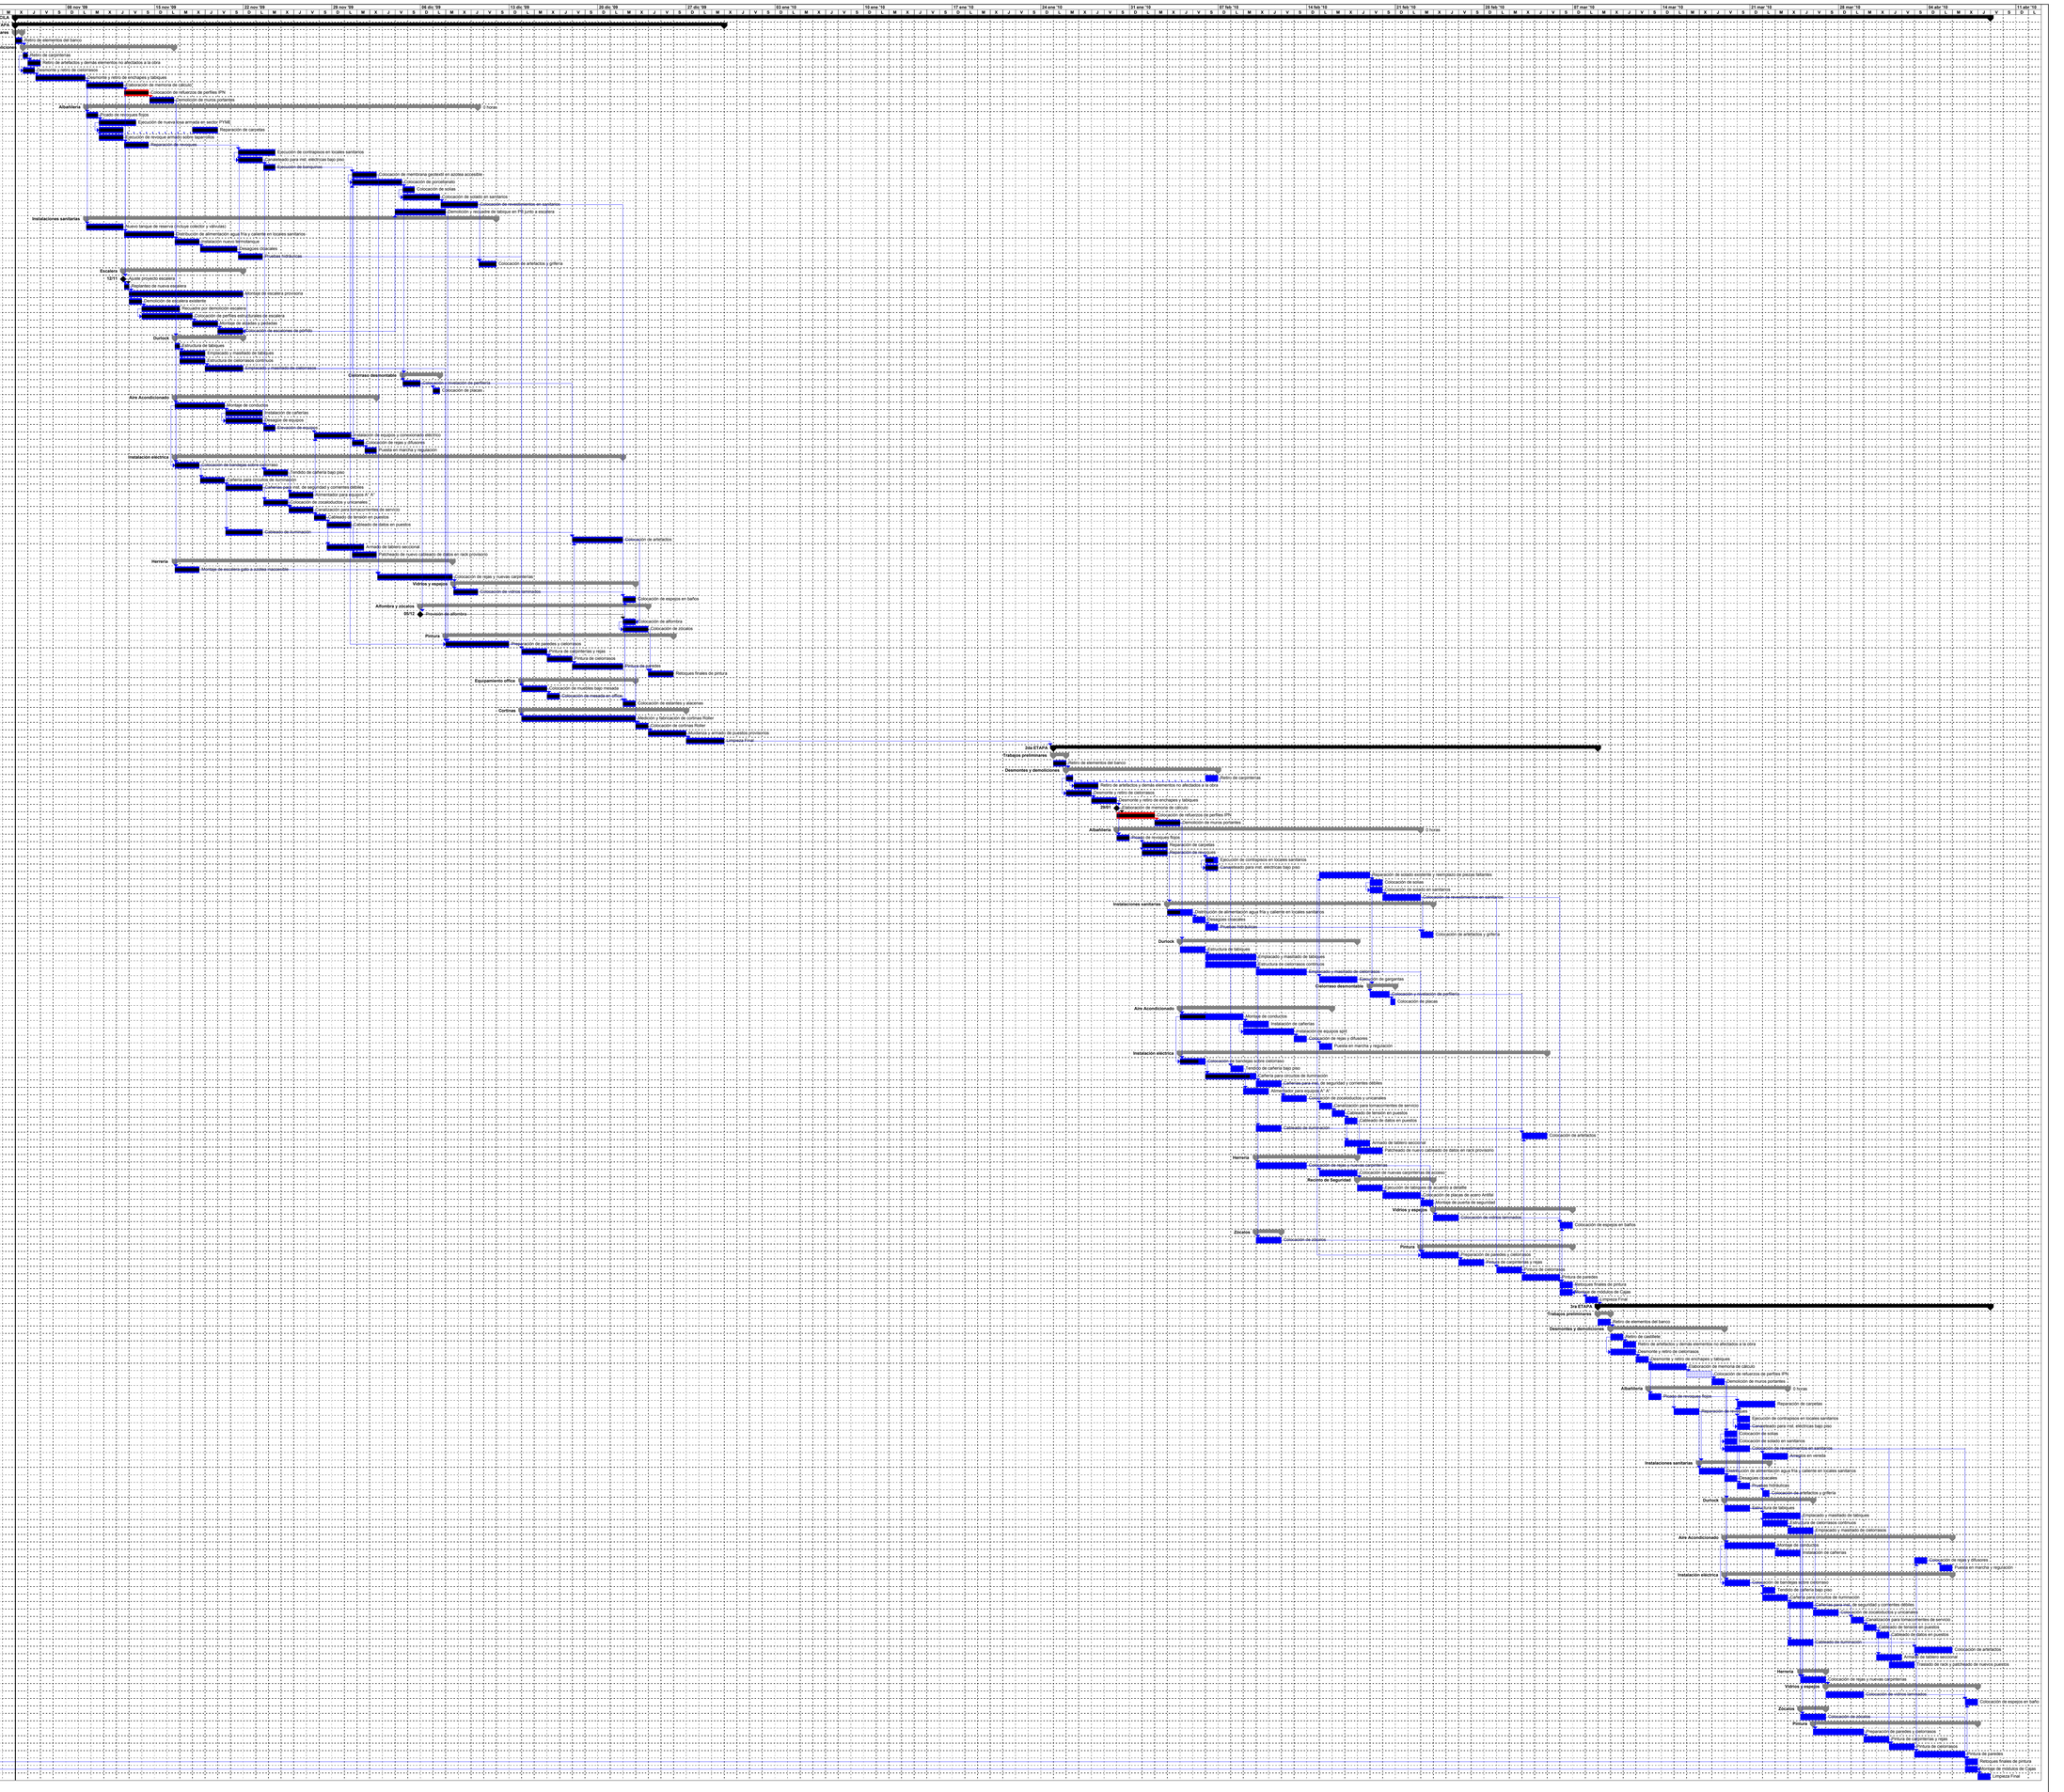
01 nov '09
08 nov '09
15 nov '09
22 nov '09
29 nov '09
06 dic '09
13 dic '09
20 dic '09
27 dic '09
03 ene '10
10 ene '10
17 ene '10
24 ene '10
31 ene '10
07 feb '10
14 feb '10
21 feb '10
28 feb '10
07 mar '10
14 mar '10
21 mar '10
28 mar '10
04 abr '10
11 abr '10
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
