Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		SUCURSAL LA LUCILA	131 días	mié 04/11/09	lun 05/04/10
2	✓	1ra ETAPA	48 días	mié 04/11/09	mar 29/12/09
3	✓	Trabajos preliminares	6,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
4		Retiro de elementos del banco	6,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
5	✓	Desmontes y demoliciones	10 días	mié 04/11/09	lun 16/11/09
6	✓	Retiro de carpinterías	6,5 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
7	✓	Retiro de artefactos y demás elementos no al	1 día	jue 05/11/09	jue 05/11/09
8	✓	Desmonte y retiro de cielorrasos	1 día	mié 04/11/09	jue 05/11/09
9	✓	Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	3 días	jue 05/11/09	lun 09/11/09
10	✓	Elaboración de memoria de cálculo	3 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09
11	✓	Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	jue 12/11/09	sáb 14/11/09
12	✓	Demolición de muros portantes	1 día	sáb 14/11/09	lun 16/11/09
13		Albañilería	27 días	lun 09/11/09	jue 10/12/09
14	✓	Picado de revoques flojos	1 día	lun 09/11/09	mar 10/11/09
15	✓	Ejecución de nueva losa armada en sector P1	3 días	mar 10/11/09	vie 13/11/09
16	✓	Reparación de carpetas	4 días	mar 10/11/09	jue 19/11/09
17	✓	Ejecución de revoque armado sobre tapamiñ	2 días	mar 10/11/09	jue 12/11/09
18	✓	Reparación de revoques	2 días	jue 12/11/09	sáb 14/11/09
19	✓	Ejecución de contrapisos en locales sanitario	2 días	sáb 21/11/09	mar 24/11/09
20	✓	Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	sáb 21/11/09	sáb 21/11/09
21	✓	Ejecución de banquinas	1 día	lun 23/11/09	mar 24/11/09
22	✓	Colocación de membrana geotextil en azotea	2 días	lun 30/11/09	mié 02/12/09
23	✓	Colocación de porcelanato	4 días	lun 30/11/09	vie 04/12/09
24	✓	Colocación de solías	1 día	vie 04/12/09	sáb 05/12/09
25	✓	Colocación de zócalo en sanitarios	2 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
26	✓	Colocación de revestimientos en sanitarios	3 días	lun 07/12/09	jue 10/12/09
27	✓	Demolición y recualce de tabique en PB junto	2 días	vie 04/12/09	vie 11/12/09
28		Instalaciones sanitarias	26,5 días	lun 09/11/09	vie 11/12/09
29	✓	Nuevo tanque de reserva (incluye colector y	3 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09
30	✓	Distribución de alimentación agua fría y calie	3 días	jue 12/11/09	lun 16/11/09
31	✓	Instalación nuevo termotanque	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
32	✓	Desagües cloacales	3 días	mié 18/11/09	sáb 21/11/09
33	✓	Pruebas hidráulicas	1 día	sáb 21/11/09	lun 23/11/09
34	✓	Colocación de artefactos y grifería	1,5 días	jue 10/12/09	vie 11/12/09
35		Escalera	6,5 días	jue 12/11/09	sáb 21/11/09
36	✓	Ajuste proyecto escalera	0 días	jue 12/11/09	jue 12/11/09
37	✓	Replanteo de nuevo escalera	0,5 días	jue 12/11/09	jue 12/11/09
38	✓	Montaje de escalera provisoria	6 días	vie 13/11/09	sáb 21/11/09
39	✓	Demolición de escalera existente	1 día	vie 13/11/09	vie 13/11/09
40	✓	Recualce por demolición escalera	2 días	sáb 14/11/09	lun 16/11/09
41	✓	Colocación de perfiles estructurales de escal	3 días	sáb 14/11/09	mar 17/11/09
42	✓	Montaje de alzadas y pedadas	2 días	mié 18/11/09	jue 19/11/09
43	✓	Colocación de escuadras de pórtico	2 días	vie 20/11/09	sáb 21/11/09
44		Durlock	5,5 días	lun 16/11/09	sáb 21/11/09
45	✓	Estructura de tabiques	0,5 días	lun 16/11/09	lun 16/11/09
46	✓	Emplacado y masillado de tabiques	4 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09
47	✓	Estructura de cielorrasos continuos	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09
48	✓	Emplacado y masillado de cielorrasos	3 días	jue 19/11/09	sáb 21/11/09
49		Cielorraso desmontable	2 días	vie 04/12/09	lun 07/12/09
50	✓	Colocación y nivelación de perfilería	1,5 días	vie 04/12/09	sáb 05/12/09
51	✓	Colocación de placas	0,5 días	lun 07/12/09	lun 07/12/09
52		Aire Acondicionado	14 días	lun 16/11/09	mié 02/12/09
53	✓	Montaje de conductos	4 días	lun 16/11/09	vie 20/11/09
54	✓	Instalación de cañerías	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
55	✓	Desagüe de equipos	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
56	✓	Elevación de equipos	1 día	lun 23/11/09	mar 24/11/09
57	✓	Instalación de equipos y conexionado electri	2 días	vie 27/11/09	lun 30/11/09
58	✓	Colocación de rejas y difusores	1 día	lun 30/11/09	mar 01/12/09
59	✓	Puesta en marcha y regulación	1 día	mar 01/12/09	mié 02/12/09
60		Instalación eléctrica	30,5 días	lun 16/11/09	lun 21/12/09
61	✓	Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
62	✓	Tendido de cañería bajo piso	2 días	lun 23/11/09	mié 25/11/09
63	✓	Cañería para circuitos de iluminación	2 días	mié 18/11/09	vie 20/11/09
64	✓	Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
65	✓	Alimentador para equipos A° A°	2 días	mié 25/11/09	vie 27/11/09
66	✓	Colocación de cocoductos y unicanales	2 días	lun 23/11/09	mié 25/11/09
67	✓	Canalización para tomacorrientes de servicio	2 días	mié 25/11/09	vie 27/11/09
68	✓	Cableado de tensión en puestos	1 día	vie 27/11/09	sáb 28/11/09
69	✓	Cableado de datos en puestos	1 día	sáb 28/11/09	lun 30/11/09
70	✓	Cableado de iluminación	2 días	vie 20/11/09	lun 23/11/09
71	✓	Colocación de artefactos	3 días	vie 18/12/09	lun 21/12/09
72	✓	Armado de tablero seccional	2 días	sáb 28/11/09	mar 01/12/09
73	✓	Patchado de nuevo cableado de datos en ra	2 días	lun 30/11/09	mié 02/12/09
74		Herrería	19 días	lun 16/11/09	mar 08/12/09
75	✓	Montaje de escalera gato a azotea inaccesible	2 días	lun 16/11/09	mié 18/11/09
76	✓	Colocación de rejas y nuevas carpinterías	6 días	mié 02/12/09	mar 08/12/09
77		Vidrios y espejos	12,5 días	mar 08/12/09	mar 22/12/09
78	✓	Colocación de vidrios laminados	2 días	mar 08/12/09	jue 10/12/09
79	✓	Colocación de espejos en baños	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
80		Alfombra y zócalos	15 días	sáb 05/12/09	mié 23/12/09
81	✓	Provisión de alfombra	0 días	sáb 05/12/09	sáb 05/12/09
82	✓	Colocación de alfombra	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
83	✓	Colocación de zócalos	2 días	mar 22/12/09	mié 23/12/09
84		Pintura	16 días	mar 08/12/09	vie 25/12/09
85	✓	Preparación de paredes y cielorrasos	5 días	mar 08/12/09	sáb 12/12/09
86	✓	Pintura de carpinterías y rejas	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09
87	✓	Pintura de cielorrasos	2 días	mié 16/12/09	jue 17/12/09
88	✓	Pintura de paredes	3 días	vie 18/12/09	lun 21/12/09
89	✓	Retoques finales de pintura	2 días	jue 24/12/09	vie 25/12/09
90		Equipamiento office	6 días	lun 14/12/09	mar 22/12/09
91	✓	Colocación de muebles bajo mesada	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09
92	✓	Colocación de mesada en office	1 día	mié 16/12/09	mié 16/12/09
93	✓	Colocación de estantes y alacenas	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09
94		Cortinas	12 días	lun 14/12/09	sáb 26/12/09
95	✓	Medición y fabricación de cortinas Roller	6 días	lun 14/12/09	mar 22/12/09
96	✓	Colocación de cortinas Roller	1 día	mié 23/12/09	mié 23/12/09
97	✓	Mudanza y armado de puestos provisorios	3 días	jue 24/12/09	sáb 26/12/09
98	✓	Limpieza Final	3 días	dom 27/12/09	mar 29/12/09
99		2da ETAPA	35 días	lun 25/01/10	vie 05/03/10
100	✓	Trabajos preliminares	1 día	lun 25/01/10	lun 25/01/10
101	✓	Retiro de elementos del banco	1 día	lun 25/01/10	lun 25/01/10
102	✓	Desmontes y demoliciones	11 días	mar 26/01/10	sáb 06/02/10
103	✓	Retiro de carpinterías	1,5 días	mar 26/01/10	sáb 06/02/10
104	✓	Retiro de artefactos y demás elementos no al	2 días	mar 26/01/10	jue 28/01/10
105	✓	Desmonte y retiro de cielorrasos	2 días	mar 26/01/10	mié 27/01/10
106	✓	Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	2 días	jue 28/01/10	vie 29/01/10
107	✓	Elaboración de memoria de cálculo	0 días	vie 29/01/10	vie 29/01/10
108	✓	Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	sáb 30/01/10	lun 01/02/10
109	✓	Demolición de muros portantes	2 días	mar 02/02/10	mié 03/02/10
110		Albañilería	20 días	sáb 30/01/10	lun 22/02/10
111	✓	Picado de revoques flojos	1 día	sáb 30/01/10	sáb 30/01/10
112	✓	Reparación de carpetas	2 días	lun 01/02/10	mar 02/02/10
113	✓	Reparación de revoques	2 días	lun 01/02/10	mar 02/02/10
114	✓	Ejecución de contrapisos en locales sanitario	1 día	sáb 06/02/10	sáb 06/02/10
115	✓	Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	sáb 06/02/10	sáb 06/02/10
116	✓	Reparación de solado existente y reemplazo	4 días	lun 15/02/10	jue 18/02/10
117	✓	Colocación de solías	1 día	vie 19/02/10	vie 19/02/10
118	✓	Colocación de solado en sanitarios	1 día	vie 19/02/10	vie 19/02/10
119	✓	Colocación de revestimientos en sanitarios	3 días	sáb 20/02/10	lun 22/02/10
120		Instalaciones sanitarias	16 días	mié 03/02/10	mar 23/02/10
121	✓	Distribución de alimentación agua fría y calie	3 días	mié 03/02/10	jue 04/02/10
122	✓	Desagües cloacales	1 día	vie 05/02/10	vie 05/02/10
123	✓	Pruebas hidráulicas	1 día	sáb 06/02/10	sáb 06/02/10
124	✓	Colocación de artefactos y grifería	1 día	mar 23/02/10	mar 23/02/10
125		Durlock	12 días	jue 04/02/10	mié 17/02/10
126	✓	Estructura de tabiques	2 días	jue 04/02/10	vie 05/02/10
127	✓	Emplacado y masillado de tabiques	3 días	sáb 06/02/10	mar 09/02/10
128	✓	Estructura de cielorrasos continuos	3 días	sáb 06/02/10	mar 09/02/10
129	✓	Emplacado y masillado de cielorrasos	4 días	mié 10/02/10	sáb 13/02/10
130	✓	Ejecución de gargantas	3 días	lun 15/02/10	mié 17/02/10
131		Cielorraso desmontable	2 días	vie 19/02/10	sáb 20/02/10
132	✓	Colocación y nivelación de perfilería	1,5 días	vie 19/02/10	sáb 20/02/10
133	✓	Colocación de placas	0,5 días	sáb 20/02/10	sáb 20/02/10
134		Aire Acondicionado	10 días	jue 04/02/10	lun 15/02/10
135	✓	Montaje de conductos	4 días	jue 04/02/10	lun 08/02/10
136	✓	Instalación de cañerías	2 días	mar 09/02/10	mié 10/02/10
137	✓	Instalación de equipos split	4 días	mar 09/02/10	vie 13/02/10
138	✓	Colocación de rejas y difusores	1 día	sáb 13/02/10	sáb 13/02/10
139	✓	Puesta en marcha y regulación	1 día	lun 15/02/10	lun 15/02/10
140		Instalación eléctrica	23 días	jue 04/02/10	mar 02/03/10
141	✓	Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	jue 04/02/10	vie 05/02/10
142	✓	Tendido de cañería bajo piso	1 día	lun 08/02/10	lun 08/02/10
143	✓	Cañería para circuitos de iluminación	3 días	sáb 06/02/10	mar 09/02/10
144	✓	Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
145	✓	Alimentador para equipos A° A°	2 días	mar 09/02/10	mié 10/02/10
146	✓	Colocación de cocoductos y unicanales	2 días	vie 12/02/10	sáb 13/02/10
147	✓	Canalización para tomacorrientes de servicio	1 día	lun 15/02/10	lun 15/02/10
148	✓	Cableado de tensión en puestos	1 día	mar 16/02/10	mar 16/02/10
149	✓	Cableado de datos en puestos	1 día	mié 17/02/10	mié 17/02/10
150	✓	Cableado de iluminación	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
151	✓	Colocación de artefactos	2 días	lun 01/03/10	mar 02/03/10
152	✓	Armado de tablero seccional	2 días	mié 17/02/10	jue 18/02/10
153	✓	Patchado de nuevo cableado de datos en ra	2 días	jue 18/02/10	vie 19/02/10
154		Herrería	6 días	mié 10/02/10	mar 16/02/10
155	✓	Colocación de rejas y nuevas carpinterías	4 días	mié 10/02/10	sáb 13/02/10
156	✓	Colocación de nuevas carpinterías de acceso	2 días	lun 15/02/10	mar 16/02/10
157		Recinto de Seguridad	5 días	mié 17/02/10	lun 22/02/10
158		Ejecución de tabiques de acuerdo a detalle	2 días	mié 17/02/10	jue 18/02/10
159		Colocación de placas de acero Antifal	2 días	vie 19/02/10	sáb 20/02/10
160		Montaje de puerta de seguridad	1 día	lun 22/02/10	lun 22/02/10
161	✓	Vidrios y espejos	9 días	mar 23/02/10	jue 04/03/10
162	✓	Colocación de vidrios laminados	2 días	mar 23/02/10	mié 24/02/10
163	✓	Colocación de espejos en baños	1 día	jue 04/03/10	jue 04/03/10
164		Zócalos	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
165	✓	Colocación de zócalos	2 días	mié 10/02/10	jue 11/02/10
166		Pintura	10 días	lun 22/02/10	jue 04/03/10
167	✓	Preparación de paredes y cielorrasos	2 días	lun 22/02/10	mar 23/02/10
168	✓	Pintura de carpinterías y rejas	2 días	mié 24/02/10	jue 25/02/10
169	✓	Pintura de cielorrasos	2 días	vie 26/02/10	sáb 27/02/10
170	✓	Pintura de paredes	3 días	lun 01/03/10	mié 03/03/10
171	✓	Retoques finales de pintura	1 día	jue 04/03/10	jue 04/03/10
172	✓	Montaje de módulos de Cajas	1 día	jue 04/03/10	jue 04/03/10
173		Limpieza Final	1 día	vie 05/03/10	vie 05/03/10
174		3ra ETAPA	26 días	sáb 06/03/10	lun 05/04/10
175		Trabajos preliminares	1 día	sáb 06/03/10	sáb 06/03/10
176		Retiro de elementos del banco	1 día	sáb 06/03/10	sáb 06/03/10
177		Desmontes y demoliciones	8 días	lun 08/03/10	mar 16/03/10
178	✓	Retiro de cielorrasos	1 día	lun 08/03/10	lun 08/03/10
179	✓	Retiro de artefactos y demás elementos no al	1 día	mar 09/03/10	mar 09/03/10
180	✓	Desmonte y retiro de cielorrasos	2 días	lun 08/03/10	mar 09/03/10
181	✓	Desmonte y retiro de enchapes y tabiques	1 día	mié 10/03/10	mié 10/03/10
182	✓	Elaboración de memoria de cálculo	2 días	jue 11/03/10	vie 12/03/10
183	✓	Colocación de refuerzos de perfiles IPN	2 días	sáb 13/03/10	lun 15/03/10
184	✓	Demolición de muros portantes	1 día	mar 16/03/10	mar 16/03/10
185		Albañilería	4 días	jue 11/03/10	sáb 20/03/10
186	✓	Picado de revoques flojos	1 día	jue 11/03/10	jue 11/03/10
187	✓	Reparación de carpetas	2 días	jue 18/03/10	vie 19/03/10
188	✓	Reparación de revoques	2 días	vie 12/03/10	sáb 13/03/10
189	✓	Ejecución de contrapisos en locales sanitario	1 día	jue 18/03/10	jue 18/03/10
190	✓	Canalizado para inst. eléctricas bajo piso	1 día	jue 18/03/10	jue 18/03/10
191	✓	Colocación de solías	1 día	mié 17/03/10	mié 17/03/10
192	✓	Colocación de solado en sanitarios	1 día	mié 17/03/10	mié 17/03/10
193	✓	Colocación de revestimientos en sanitarios	2 días	mié 17/03/10	jue 18/03/10
194	✓	Arreglos en verada	2 días	vie 19/03/10	sáb 20/03/10
195		Instalaciones sanitarias	4,5 días	lun 15/03/10	vie 19/03/10
196	✓	Distribución de alimentación agua fría y calie	2 días	lun 15/03/10	mar 16/03/10
197	✓	Desagües cloacales	1 día	mié 17/03/10	mié 17/03/10
198	✓	Pruebas hidráulicas	1 día	jue 18/03/10	jue 18/03/10
199	✓	Colocación de artefactos y grifería	0,5 días	vie 19/03/10	vie 19/03/10
200		Durlock	6 días	mié 17/03/10	mar 23/03/10
201	✓	Estructura de tabiques	2 días	mié 17/03/10	jue 18/03/10
202	✓	Emplacado y masillado de tabiques	3 días	vie 19/03/10	lun 22/03/10
203	✓	Estructura de cielorrasos continuos	2 días	vie 19/03/10	sáb 20/03/10
204	✓	Emplacado y masillado de cielorrasos	2 días	jue 22/03/10	mar 23/03/10
205		Aire Acondicionado	14 días	mié 17/03/10	jue 01/04/10
206	✓	Montaje de conductos	3 días	mié 17/03/10	vie 19/03/10
207	✓	Instalación de cañerías	2 días	sáb 20/03/10	lun 22/03/10
208	✓	Colocación de rejas y difusores	1 día	mié 31/03/10	mié 31/03/10
209	✓	Puesta en marcha y regulación	1 día	jue 01/04/10	jue 01/04/10
210		Instalación eléctrica	14 días	mié 17/03/10	jue 01/04/10
211	✓	Colocación de bandejas sobre cielorraso	2 días	mié 17/03/10	jue 18/03/10
212	✓	Tendido de cañería bajo piso	1 día	vie 19/03/10	vie 19/03/10
213	✓	Cañería para circuitos de iluminación	2 días	vie 19/03/10	sáb 20/03/10
214	✓	Cañerías para inst. de seguridad y corrientes	2 días	lun 22/03/10	mar 23/03/10
215	✓	Colocación de cocoductos y unicanales	2 días	mié 24/03/10	jue 25/03/10
216	✓	Canalización para tomacorrientes de servicio	1 día	vie 26/03/10	vie 26/03/10
217	✓	Cableado de tensión en puestos	1 día	sáb 27/03/10	sáb 27/03/10
218	✓	Cableado de datos en puestos	1 día	lun 29/03/10	lun 29/03/10
219	✓	Cableado de iluminación	2 días	lun 22/03/10	mar 23/03/10
220	✓	Colocación de artefactos	2 días	mié 31/03/10	jue 01/04/10
221	✓	Armado de tablero seccional	2 días	lun 29/03/10	mar 30/03/10
222	✓	Traslado de rack y patchleado de nuevos pun	2 días	mar 30/03/10	mié 31/03/10
223		Herrería	2 días	mar 23/03/10	mié 24/03/10
224	✓	Colocación de rejas y nuevas carpinterías	2 días	mar 23/03/10	mié 24/03/10
225		Vidrios y espejos	6 días	jue 29/03/10	sáb 03/04/10
226	✓	Colocación de vidrios laminados	2 días	jue 29/03/10	vie 30/03/10
227	✓	Colocación de espejos en baños	1 día	sáb 03/04/10	sáb 03/04/10
228		Zócalos	2 días	mar 23/03/10	mié 24/03/10
229	✓	Colocación de zócalos	2 días	mar 23/03/10	mié 24/03/10
230		Pintura	10 días	mié 24/03/10	sáb 03/04/10
231	✓	Preparación de paredes y cielorrasos	2 días	mié 24/03/10	jue 25/03/10
232	✓	Pintura de carpinterías y rejas	2 días	vie 26/03/10	sáb 27/03/10
233	✓	Pintura de cielorrasos	2 días	lun 29/03/10	mar 30/03/10
234	✓	Pintura de paredes	3 días	mié 31/03/10	vie 02/04/10
235	✓	Retoques finales de pintura	1 día	sáb 03/04/10	sáb 03/04/10
236	✓	Montaje de módulos de Cajas	1 día	sáb 03/04/10	sáb 03/04/10
237		Limpieza Final	1 día	lun 05/04/10	lun 05/04/10

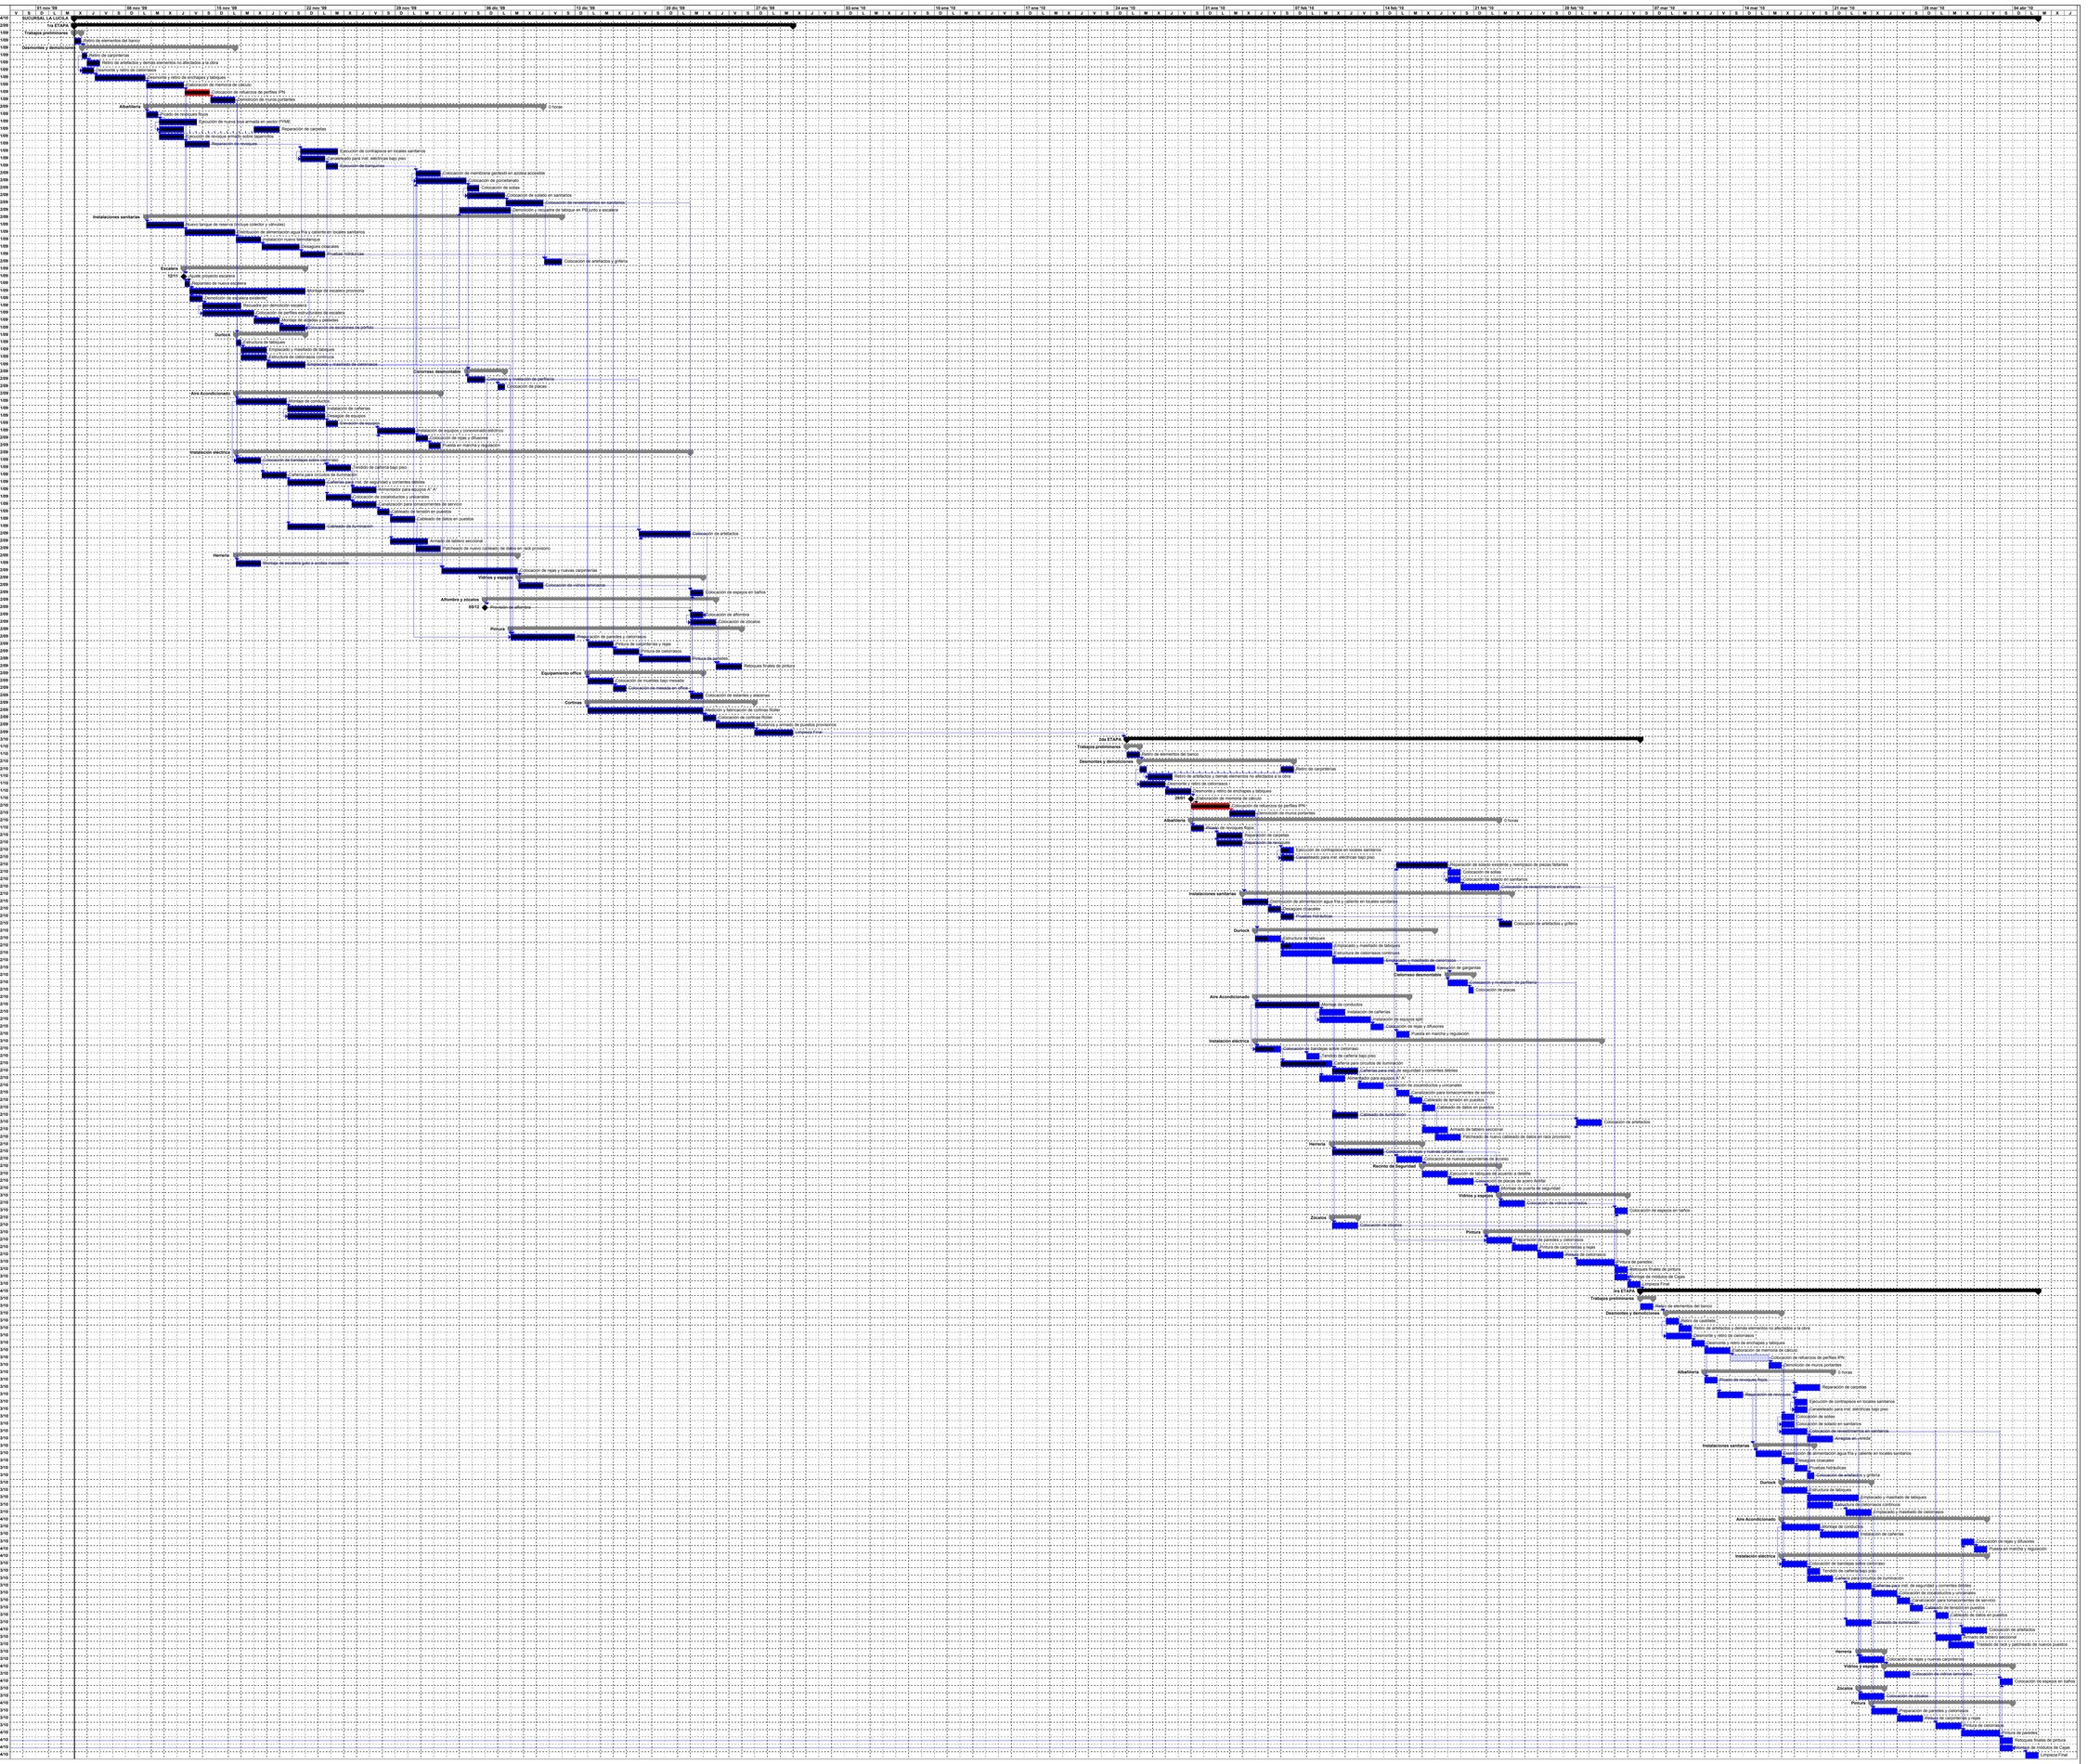

Proyecto: Bco Ciudad La Lucila_P
Fecha: jue 11/03/10

Tarea | División | Progreso | Hito | n | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite
