| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|
| | **Tareas críticas: No** | **75 días** | **mar 11-05-10** |
| 1 | **INICIO PLAZO DE OBRA** | 0 días | mar 11-05-10 |
| 8 | Trazados tabiques | 4 días | sáb 15-05-10 |
| 36 | Compra de alfombra | 0 días | sáb 15-05-10 |
| 22 | Preparación de pilares y muros existentes | 4 días | mié 19-05-10 |
| 2 | ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y CLIMA | 0 días | mar 25-05-10 |
| 9 | Trazado de cielo | 6 días | mar 25-05-10 |
| 11 | Estructura de tabiques | 15 días | jue 27-05-10 |
| 45 | Canalizaciones de iluminación | 5 días | jue 27-05-10 |
| 50 | Instalación de bandeja de cielo | 4 días | sáb 29-05-10 |
| 46 | Canalizaciones por tabiques | 6 días | lun 31-05-10 |
| 18 | Estructura de viga perimetral | 4 días | mar 01-06-10 |
| 56 | Canalización de interruptores | 3 días | mié 02-06-10 |
| 19 | Emplacado de viga perimetral | 3 días | sáb 05-06-10 |
| 47 | Canalización de termostatos | 3 días | sáb 05-06-10 |
| 15 | Estructura de cielo Volcometal y dinteles | 8 días | lun 07-06-10 |
| 12 | Emplacado de tabiques primera cara | 10 días | mié 09-06-10 |
| 76 | Readecuación de ductería | 3 días | vie 11-06-10 |
| 77 | Readecuación de mangas | 3 días | lun 14-06-10 |
| 16 | Estructura de gargantas para luminarias | 5 días | mié 16-06-10 |
| 48 | Canalización de fuerza y servicio | 3 días | mié 16-06-10 |
| 13 | Emplacado de tabiques segunda cara | 11 días | lun 21-06-10 |
| 41 | Instalación de Porcelanato en áreas de circulación | 15 días | lun 21-06-10 |
| 52 | Canalización de cableado estructurado y corrientes débiles | 6 días | lun 21-06-10 |
| 86 | Instalación de red de agua y alcantarillado | 3 días | lun 21-06-10 |
| 35 | Afinado de pisos | 14 días | mié 23-06-10 |
| 49 | Canalización de muebles de línea | 3 días | jue 24-06-10 |
| 3 | ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD SEGURIDAD | 0 días | mié 30-06-10 |
| 101 | Canalización | 4 días | mié 30-06-10 |
| 23 | Preparación de tabiques nuevos | 5 días | jue 01-07-10 |
| 59 | Cableado de fuerza y servicio | 4 días | jue 01-07-10 |
| 108 | Rectificación de Medidas | 1 día | jue 01-07-10 |
| 5 | APROBACION DE ADICIONAL POR DUCTERIA DE EXTRACCION DE BAÑOS | 0 días | vie 02-07-10 |
| 53 | Canalización para cortinas motorizadas | 2 días | vie 02-07-10 |
| 54 | Cableado eléctrico iluminación | 5 días | sáb 03-07-10 |
| 60 | Cableado de tensión para PCs, corientes débiles y cableado estructurado | 4 días | sáb 03-07-10 |
| 102 | Cableado | 2 días | lun 05-07-10 |
| 105 | Toma de medidas | 1 día | lun 05-07-10 |
| 24 | 1ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas | 4 días | mié 07-07-10 |
| 42 | Instalación de Porcelanato en baños | 4 días | mié 07-07-10 |
| 51 | Instalación de bandeja bajo piso técnico | 4 días | mié 07-07-10 |
| 61 | Trabajo en tableros | 3 días | mié 07-07-10 |
| 78 | Instalación de ductería de extracción en baños | 4 días | mié 07-07-10 |
| 4 | APROBACION DE PROYECTO DE ESPECIALIDAD POR CERTIFICACION | 0 días | jue 08-07-10 |
| 113 | Rectificación de medidas | 1 día | jue 08-07-10 |
| 91 | Canalización | 3 días | vie 09-07-10 |
| 96 | Reubicación de rociadores existentes | 6 días | vie 09-07-10 |
| 65 | Rectificación de medidas | 0 días | vie 09-07-10 |
| 73 | Rectificación de medidas | 0 días | vie 09-07-10 |
| 30 | Instalación de porcelanato en muros de baños | 4 días | sáb 10-07-10 |
| 62 | Trabajo en rack de comunicaciones | 3 días | sáb 10-07-10 |
| 25 | 2ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas | 4 días | lun 12-07-10 |
| 39 | Instalación de estructura piso técnico | 2 días | lun 12-07-10 |
| 43 | Instalación de guardapolvos | 3 días | lun 12-07-10 |
| 66 | Instalación de perfilería de aluminio | 4 días | lun 12-07-10 |
| 79 | Cableado de termostatos | 3 días | lun 12-07-10 |
| 40 | Instalación de palmetas de piso técnico | 5 días | mié 14-07-10 |
| 63 | Certificación y rotulación | 2 días | mié 14-07-10 |
| 97 | Instalación de matricería nueva para nuevos rociadores | 5 días | mié 14-07-10 |
| 80 | Instalación de termostatos | 3 días | jue 15-07-10 |
| 87 | Instalación de Wc | 2 días | jue 15-07-10 |
| 88 | Instalación de lavamanos | 2 días | jue 15-07-10 |
| 67 | Instalación de cristales | 4 días | sáb 17-07-10 |
| 68 | Instalación de puertas templadas | 3 días | sáb 17-07-10 |
| 74 | Instalación de puertas | 4 días | sáb 17-07-10 |
| 89 | Instalación de griferías | 2 días | lun 19-07-10 |
| 69 | Toma de medidas cristal corredera | 0 días | mar 20-07-10 |
| 83 | Prueba y revisión de presión | 4 días | mar 20-07-10 |
| 71 | Instalación de espejos | 1 día | mié 21-07-10 |
| 29 | Lacado de puertas | 4 días | jue 22-07-10 |
| 110 | Instalación de revestimiento especial en muro de acceso | 5 días | jue 22-07-10 |
| 111 | Instalación de mobiliario especial en general | 6 días | jue 22-07-10 |
| 20 | Instalación de registros en cielos | 4 días | sáb 24-07-10 |
| 109 | Instalación de celosia en muro curvo | 5 días | sáb 24-07-10 |
| 115 | Llegada de sillas en plazo según orden de compra | 0 días | dom 25-07-10 |
| 70 | Instalación de tabiquería de cristal corredera | 3 días | lun 26-07-10 |
| 95 | Cableado de detectores de humo y parlantes | 4 días | mar 27-07-10 |
| 106 | Instalación de cortinas incluye motor | 5 días | mié 28-07-10 |
| 32 | Instalación de estructura | 4 días | jue 29-07-10 |
| 84 | Puesta en marcha | 2 días | jue 29-07-10 |
| 37 | Llegada de alfombra a Obra | 0 días | sáb 31-07-10 |
| 55 | Instalación de luminarias | 6 días | sáb 31-07-10 |
| 81 | Instalación de rejillas de retorno | 4 días | sáb 31-07-10 |
| 93 | Instalación de detectores de humo nuevos | 3 días | sáb 31-07-10 |
| 94 | Instalación de parlante de evacuación nuevo | 3 días | sáb 31-07-10 |
| 98 | Instalación de embellecedores | 3 días | sáb 31-07-10 |
| 82 | Instalación de difusores | 4 días | dom 01-08-10 |
| 92 | Reubicación de detectores de humo existentes | 3 días | dom 01-08-10 |
| 33 | Instalación de palmetas | 3 días | lun 02-08-10 |
| 103 | Instalación y puesta en marcha | 2 días | mar 03-08-10 |
| 99 | Programación de dispositivos existentes y nuevos | 3 días | mié 04-08-10 |
| | **Tareas críticas: Sí** | **19 días** | **mié 21-07-10** |
| 17 | Emplacado de cielo | 6 días | mié 21-07-10 |
| 26 | Preparación de cielos | 5 días | sáb 24-07-10 |
| 27 | 1ª mano de pintura en cielos | 3 días | mié 28-07-10 |
| 28 | 2ª mano de pintura en cielos | 4 días | vie 30-07-10 |
| 38 | Instalación de alfombra | 3 días | mar 03-08-10 |
| 114 | Instalación de mobiliario de línea | 3 días | mié 04-08-10 |
| 58 | Cableado de puestos de trabajo | 3 días | jue 05-08-10 |
| 117 | Aseo Final | 2 días | sáb 07-08-10 |

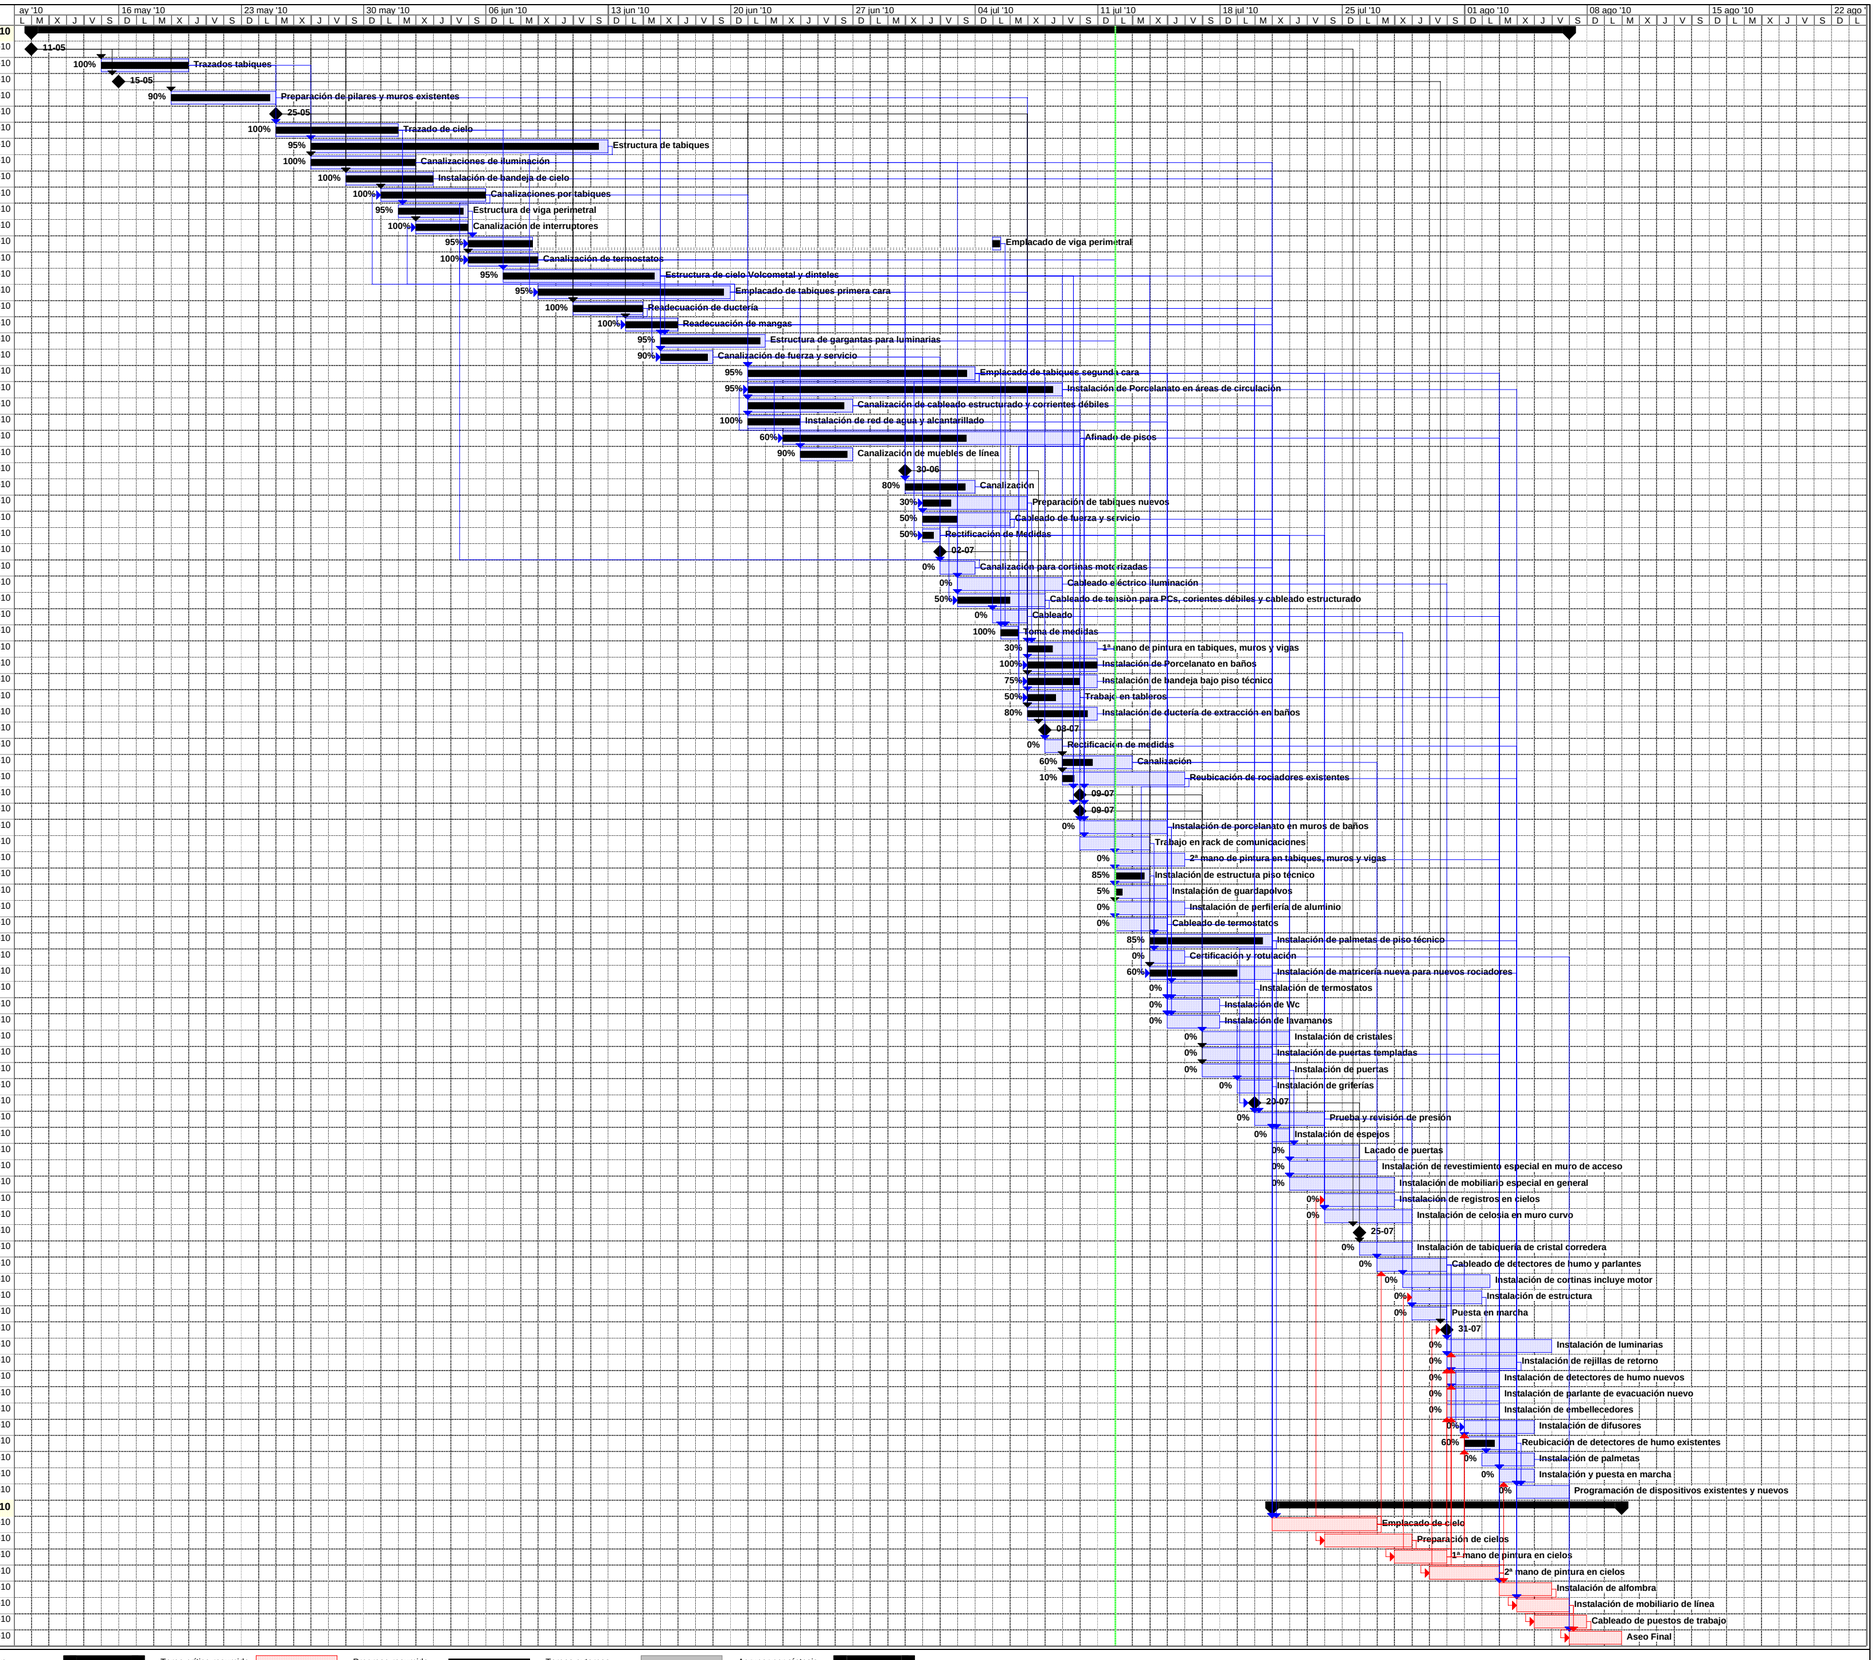


Proyecto: Obra ENTEL
Fecha: lun 12-07-10

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Progreso | Resumen | Tarea crítica resumida | Progreso resumido | Tareas externas | Agrupar por síntesis |
| Tarea crítica | Hito | Tarea resumida | Hito resumido | División | Resumen del proyecto | Fecha límite |
