ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**OBRA EN CIEL 13-07-10**	**0,2 días**	**mar 11-05-10**	**vie 27-08-10**
2	**INICIO PLAZO DE OBRA**	0 días	mar 11-05-10	mar 11-05-10
3	ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y CLIMA	0 días	mar 25-05-10	mar 25-05-10
4	ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD SEGURIDAD	0 días	mié 30-06-10	mié 30-06-10
5	APROBACION DE PROYECTO DE ESPECIALIDAD POR CERTIFICACION	0 días	jue 08-07-10	jue 08-07-10
6	APROBACION DE ADICional POR DUCTARIA DE EXTRACCION DE BANOS	0 días	vie 02-07-10	vie 02-07-10
7	**INICIO DE OBRA AUTORIZACION DE INGRESO**	**99 días**	**sáb 15-05-10**	**vie 27-08-10**
8	**Trabajos preliminares**	**13 días**	**sáb 15-05-10**	**lun 31-05-10**
9	Trazado labiquen	2 días	sáb 15-05-10	mié 19-05-10
10	Trazado de cielo	9 días	mar 25-05-10	lun 31-05-10
11	**Tabiquería Volcometal**	**32 días**	**jue 27-05-10**	**sáb 03-07-10**
12	Estructura de tabiques	15 días	jue 27-05-10	sáb 12-06-10
13	Emplacado de tabiques primera cara	10 días	mié 09-06-10	sáb 19-06-10
14	Emplacado de tabiques segunda cara	11 días	lun 21-06-10	sáb 03-07-10
15	**Cielo Volcometal**	**48 días**	**mar 01-06-10**	**mar 27-07-10**
16	Estructura de cielo volcometal y dintele	9 días	lun 07-06-10	mié 16-06-10
17	Estructura de gargantas para luminarias	5 días	mié 16-06-10	lun 21-06-10
18	Emplacado de cielo	9 días	mié 21-07-10	lun 26-07-10
19	Estructura de viga perimetral	4 días	mar 01-06-10	vie 04-06-10
20	Emplacado de viga perimetral	3 días	sáb 05-06-10	lun 07-07-10
21	Instalación de registros en cielos	3 días	sáb 24-07-10	mié 27-07-10
22	**Revestimientos**	**64 días**	**mié 19-05-10**	**lun 02-08-10**
23	Preparación de pasajes y marcos existentes	4 días	mié 19-05-10	lun 24-05-10
24	Preparación de tabiques nuevos	5 días	jue 01-07-10	mié 06-07-10
25	1º mano de pintura en tabiques, muros y vigas	3 días	mié 07-07-10	sáb 10-07-10
26	2º mano de pintura en tabiques, muros y vigas	3 días	lun 12-07-10	jue 15-07-10
27	Preparación de cielos	5 días	sáb 24-07-10	mié 28-07-10
28	1º mano de pintura en cielos	3 días	mié 28-07-10	vie 30-07-10
29	2º mano de pintura en cielos	4 días	vie 30-07-10	lun 02-08-10
30	Lacado de puertas	4 días	jue 22-07-10	dom 25-07-10
31	Instalación de porcelanatos en muros de baños	3 días	sáb 10-07-10	mié 14-07-10
32	**Cielo Modular**	**7 días**	**jue 29-07-10**	**mié 04-08-10**
33	Instalación de estructura	3 días	jue 29-07-10	dom 01-08-10
34	Instalación de palmetas	3 días	lun 02-08-10	mié 04-08-10
35	**Pavimentos**	**69 días**	**sáb 15-05-10**	**jue 05-08-10**
36	Alisado de pisos	14 días	mié 23-06-10	vie 09-07-10
37	Compra de alfombra	0 días	sáb 15-05-10	sáb 15-05-10
38	Lleguda de alfombra a Obra	0 días	sáb 10-07-10	sáb 10-07-10
39	Instalación de alfombra	3 días	mar 03-08-10	jue 05-08-10
40	Instalación de estructura piso técnico	4 días	lun 12-07-10	mié 14-07-10
41	Instalación de palmetas de piso técnico	5 días	mié 14-07-10	mié 20-07-10
42	Instalación de Porcelanato en áreas de circulación	15 días	jue 23-06-10	sáb 10-07-10
43	Instalación de Porcelanato en baños	4 días	mié 07-07-10	sáb 10-07-10
44	Instalación de guardapolvos	3 días	lun 12-07-10	mié 14-07-10
45	**Canalizaciones eléctricas**	**91 días**	**jue 27-05-10**	**jue 05-08-10**
46	Canalizaciones de iluminación	6 días	jue 27-05-10	mié 01-06-10
47	Canalizaciones por tabiques	6 días	lun 31-05-10	sáb 05-06-10
48	Canalización de termostatos	4 días	sáb 05-06-10	mié 09-06-10
49	Canalización de fuerza y servicios	3 días	mié 16-06-10	vie 18-06-10
50	Canalización de tuberías de línea	2 días	jue 24-06-10	sáb 26-06-10
51	Instalación de bandeja de cielo	4 días	sáb 29-06-10	mié 02-06-10
52	Instalación de bandeja bajo piso técnico	4 días	mié 07-07-10	sáb 10-07-10
53	Canalización de cableado estructurado y corrientes débiles	9 días	lun 21-06-10	sáb 26-06-10
54	Canalización para cortinas motorizadas	2 días	vie 02-07-10	sáb 03-07-10
55	Cableado eléctrico iluminación	5 días	sáb 03-07-10	jue 08-07-10
56	Instalación de luminarias	6 días	sáb 31-07-10	jue 05-08-10
57	Canalización de interruptores	3 días	mié 02-06-10	vie 04-06-10
58	**Cableado eléctrico y estructurado SINTAL**	**44 días**	**jue 01-07-10**	**sáb 07-08-10**
59	Cableado de puntos de trabajo	2 días	jue 05-08-10	sáb 07-08-10
60	Cableado de fuerza y servicio	4 días	jue 01-07-10	lun 05-07-10
61	Cableado de tendido para PCs, corrientes débiles y cableado estructurado	4 días	sáb 03-07-10	mié 07-07-10
62	Trabajo en tableros	2 días	mié 07-07-10	jue 08-07-10
63	Trabajo en racks de comunicaciones	2 días	sáb 10-07-10	mié 14-07-10
64	Certificación y rotulación	2 días	mié 14-07-10	jue 15-07-10
65	**Cristales**	**16 días**	**vie 09-07-10**	**mié 28-07-10**
66	Rectificación de medidas	0 días	vie 09-07-10	vie 09-07-10
67	Instalación de perfilería de ventanas	2 días	jue 15-07-10	jue 15-07-10
68	Instalación de cristales	4 días	sáb 17-07-10	mié 21-07-10
69	Instalación de puertas templadas	3 días	sáb 17-07-10	mié 20-07-10
70	Toma de medidas cristal corredera	0 días	mié 20-07-10	mié 20-07-10
71	Instalación de cabaquería de cristal corredera	3 días	lun 26-07-10	mié 28-07-10
72	Instalación de espejos	1 día	mié 21-07-10	mié 21-07-10
73	**Carpintería**	**9 días**	**vie 09-07-10**	**mié 21-07-10**
74	Rectificación de medidas	0 días	vie 09-07-10	vie 09-07-10
75	Instalación de puertas	3 días	sáb 17-07-10	mié 21-07-10
76	**Clima**	**47 días**	**vie 11-06-10**	**mié 04-08-10**
77	Rectificación de ducteria	3 días	vie 11-06-10	lun 14-06-10
78	Rectificación de manga	3 días	lun 13-06-10	mié 16-06-10
79	Instalación de ducteria de extracción en baños	4 días	mié 07-07-10	sáb 10-07-10
80	Calibrado de termostatos	3 días	lun 12-07-10	mié 14-07-10
81	Instalación de termostatos	3 días	jue 15-07-10	lun 19-07-10
82	Instalación de rejillas de retorno	3 días	sáb 31-07-10	mié 04-08-10
83	Instalación de difusores	4 días	dom 01-08-10	mié 04-08-10
84	Pruebas y revisión de presión	4 días	mar 20-07-10	vie 23-07-10
85	Puesta en marcha	2 días	jue 29-07-10	vie 30-07-10
86	**Instalación Sanitaria**	**24 días**	**lun 21-06-10**	**mar 20-07-10**
87	Instalación de red de agua y alcantarillado	3 días	lun 21-06-10	mié 23-06-10
88	Instalación de WC	2 días	jue 15-07-10	sáb 17-07-10
89	Instalación de lavamanos	2 días	jue 15-07-10	sáb 17-07-10
90	Instalación de griferías	2 días	lun 19-07-10	mié 20-07-10
91	**Extinción y Detección**	**26 días**	**vie 09-07-10**	**vie 06-08-10**
92	Calibración	2 días	vie 09-07-10	lun 12-07-10
93	Reubicación de detectores de humo existentes	3 días	dom 01-08-10	mar 03-08-10
94	Instalación de detectores de humo nuevos	3 días	sáb 31-07-10	lun 02-08-10
95	Instalación de pulsante de evacuación nuevo	2 días	sáb 31-07-10	lun 02-08-10
96	Calibrado de detectores de humo y parlantes	4 días	mar 27-07-10	vie 30-07-10
97	Reubicación de rociadores existentes	9 días	vie 09-07-10	jue 15-07-10
98	Instalación de matriceria nuevo para nuevos rociadores	9 días	mié 14-07-10	mar 20-07-10
99	Instalación de estabilizadores	2 días	sáb 31-07-10	lun 02-08-10
100	Programación de dispositivos existentes y nuevos	3 días	mié 04-08-10	vie 06-08-10
101	**Control de acceso**	**32 días**	**mié 30-06-10**	**mié 04-08-10**
102	Calibración	4 días	mié 30-06-10	sáb 03-07-10
103	Calibrado	2 días	lun 05-07-10	mar 06-07-10
104	Instalación y puesta en marcha	2 días	mié 04-08-10	jue 05-08-10
105	**Cortinas**	**25 días**	**lun 05-07-10**	**lun 02-08-10**
106	Toma de medidas	1 día	lun 05-07-10	mar 06-07-10
107	Instalación de cortinas incluye motor	5 días	mié 28-07-10	lun 02-08-10
108	**Mobiliario Especial**	**24 días**	**jue 01-07-10**	**mié 28-07-10**
109	Rectificación de Medidas	1 día	jue 01-07-10	jue 01-07-10
110	Instalación de celosia en muro curvo	5 días	sáb 24-07-10	mié 28-07-10
111	Instalación de revestimiento ingleraz en muro de acceso	9 días	jue 22-07-10	lun 26-07-10
112	Instalación de mobiliario ingleraz en general	9 días	jue 22-07-10	mié 27-07-10
113	**Mobiliario de Línea**	**27 días**	**jue 08-07-10**	**vie 06-08-10**
114	Rectificación de medidas	1 día	jue 08-07-10	jue 08-07-10
115	Instalación de mobiliario de línea	3 días	mié 04-08-10	vie 06-08-10
116	Lleguda de telas en placa según orden de compra	0 días	dom 25-07-10	dom 25-07-10
117	**ADICIONAL BANOS Y OTROS**	**68 días**	**lun 05-07-10**	**vie 27-08-10**
118	Entrega de adicional	0 días	lun 05-07-10	lun 05-07-10
119	Aprobación de adicional	0 días	vie 09-07-10	vie 09-07-10
120	Desempilpacado de tabiquen	1 día	lun 12-07-10	lun 12-07-10
121	Canalizaciones en tabiquería	2 días	mié 13-07-10	mié 14-07-10
122	Calibrado	3 días	jue 15-07-10	lun 19-07-10
123	Emplacado de tabiques	1 día	mar 20-07-10	mar 20-07-10
124	Preparación de tabiquen	2 días	mié 21-07-10	jue 22-07-10
125	Instalación de porcelanatos de piso en baños	3 días	mié 14-07-10	sáb 17-07-10
126	Instalación muebles especiales en baños	3 días	lun 26-07-10	mié 28-07-10
127	Pintura en baños	3 días	jue 22-07-10	sáb 24-07-10
128	Compra de panelería mdof	0 días	lun 12-07-10	lun 12-07-10
129	Instalación de panelería mdof	3 días	mié 25-08-10	vie 27-08-10
130	**Aseo**	**10 días**	**sáb 07-08-10**	**vie 27-08-10**
131	Aseo Final de Obra	2 días	sáb 07-08-10	lun 09-08-10
132	Aseo final por obtención de panelería	5 días	vié 20-08-10	vie 27-08-10

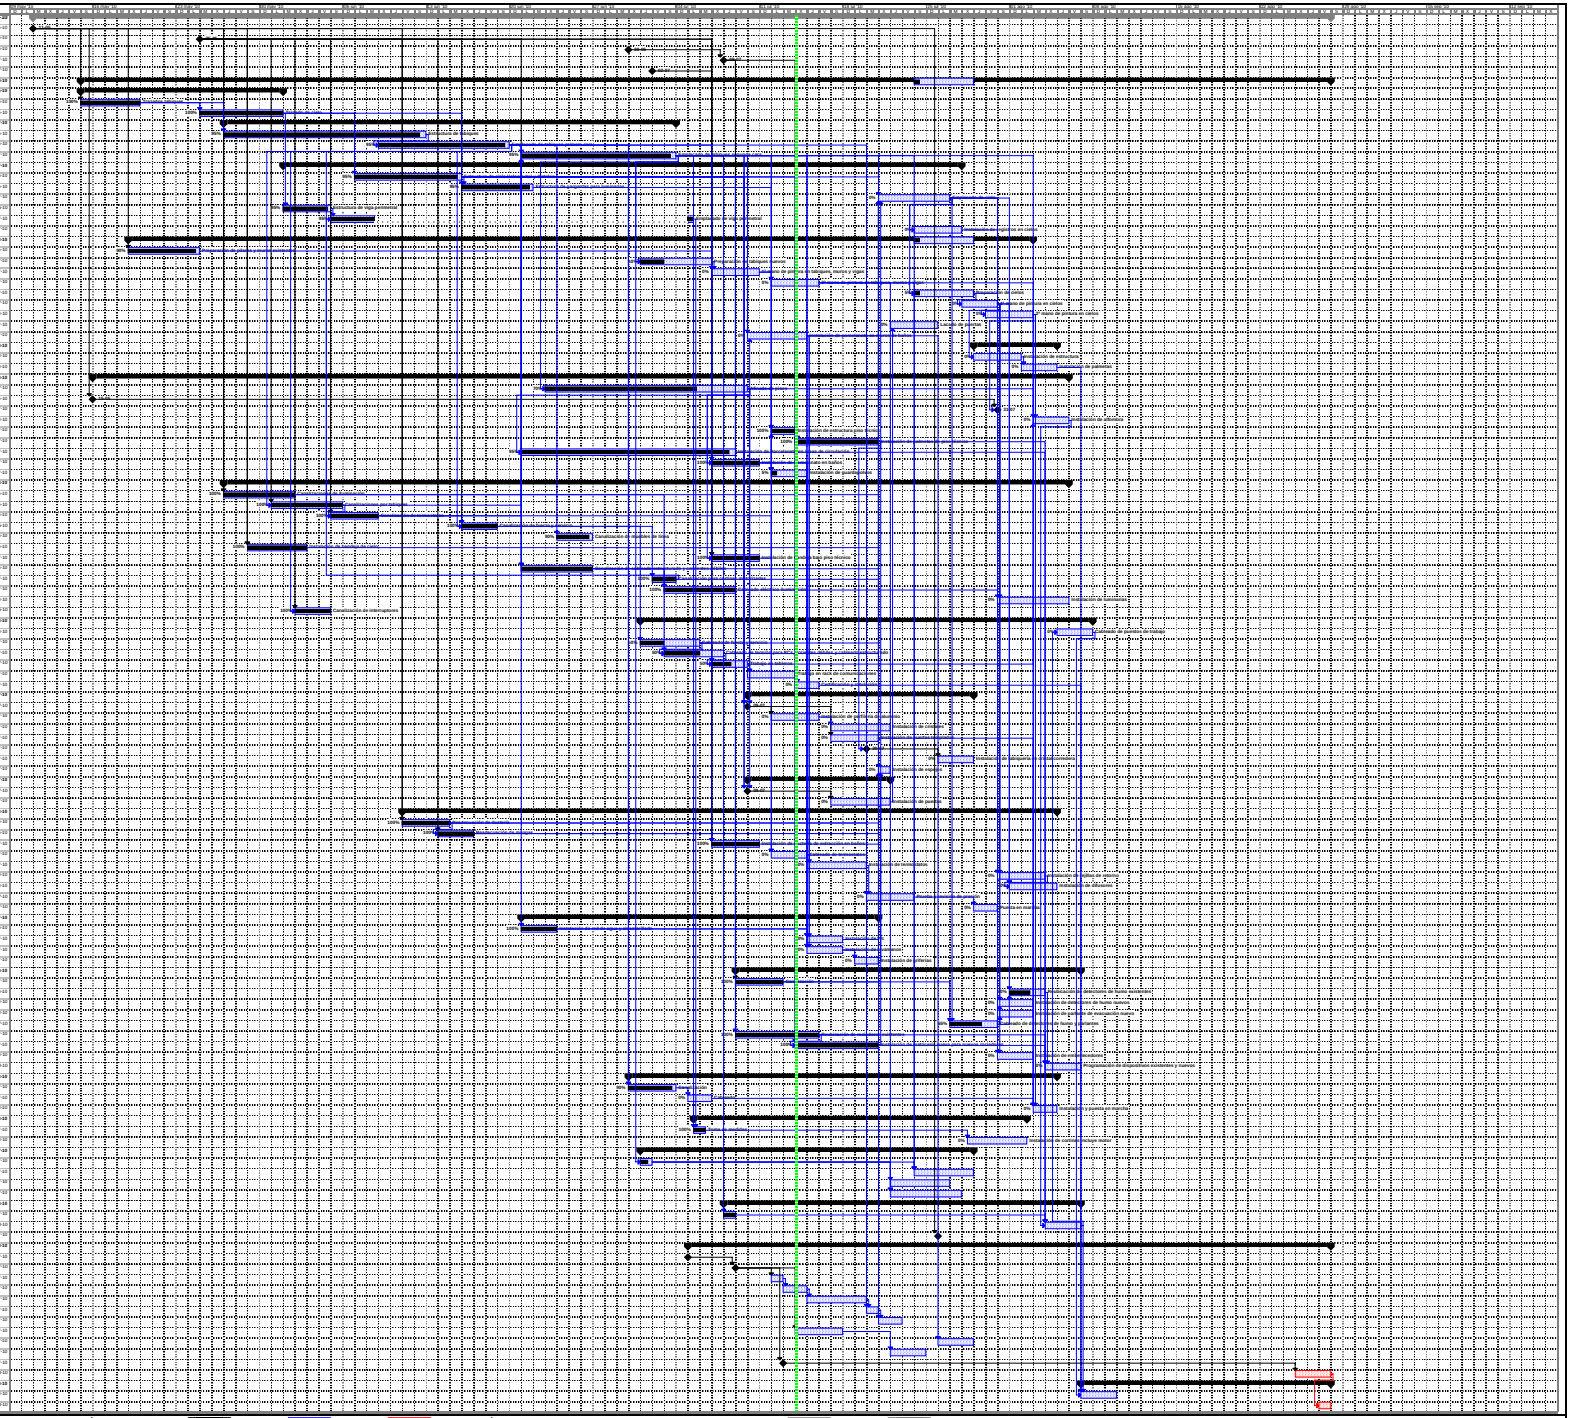

Proyecto: Obra ENTEL 13-07-10
Fecha: mié 14-07-10

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto
