CLIENTE: YAKULT
OBRA: OFICINAS
DIRECCION: AV. MITRE 1249, MUNRO

contract

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CLIENTE**	**48 días**	**lun 09/08/10**	**dom 26/09/10**
2	Ok presupuesto	0 días	lun 09/08/10	lun 09/08/10
3	Confirmacion Lay-Out	0 días	mar 17/08/10	mar 17/08/10
4	Confirmacion Op. AºA	0 días	mié 18/08/10	mié 18/08/10
5	Inicio certificacion elect. DCI	0 días	mar 24/08/10	mar 24/08/10
6	Mudanza	2 días	sáb 25/09/10	dom 26/09/10
7	Recepcion Provisoria	0 días	dom 26/09/10	dom 26/09/10
8				
9	**CONTRACT**	**47 días**	**mar 10/08/10**	**dom 26/09/10**
10	Tareas preliminares	1 día	mar 10/08/10	mar 10/08/10
11	Albañileria	5 días	dom 22/08/10	jue 26/08/10
12	**Const. en seco**	**40 días**	**mié 11/08/10**	**lun 20/09/10**
13	Estructura tabiques	7 días	mié 11/08/10	mié 18/08/10
14	Emplacado y masillado	7 días	mar 24/08/10	lun 30/08/10
15	Estructura cielo continuo	3 días	mar 17/08/10	jue 19/08/10
16	Placa y masilla cielo	4 días	vie 20/08/10	lun 23/08/10
17	Perfileria modular	6 días	vie 10/09/10	mié 15/09/10
18	Emplacado modular	5 días	jue 16/09/10	lun 20/09/10
19	**Ins. Sanitaria**	**26 días**	**mié 25/08/10**	**dom 19/09/10**
20	Desague Coffe	3 días	vie 27/08/10	dom 29/08/10
21	Agua fria Coffe	3 días	mié 25/08/10	vie 27/08/10
22	Colocacion bacha y griferia	2 días	sáb 18/09/10	dom 19/09/10
23	**Inst. Electrica**	**40 días**	**dom 15/08/10**	**vie 24/09/10**
24	Cañerias en tabiques	7 días	dom 15/08/10	lun 23/08/10
25	Cañeria iluminacion	11 días	mar 24/08/10	vie 03/09/10
26	Cañeria bajo piso	12 días	sáb 21/08/10	mié 01/09/10
27	Cableado 220 y esta	10 días	sáb 04/09/10	lun 13/09/10
28	Cableado estructurado	7 días	mar 14/09/10	lun 20/09/10
29	Reforma de tableros	5 días	jue 02/09/10	lun 06/09/10
30	Colcoacion de artefactos	5 días	jue 16/09/10	lun 20/09/10
31	Posicionado de Rack	2 días	mar 21/09/10	mié 22/09/10
32	Pruebas y tapas	2 días	jue 23/09/10	vie 24/09/10
33	**Inst. Termomecanica**	**27 días**	**mié 18/08/10**	**lun 13/09/10**
34	Mediciones y replanteo	1 día	mié 18/08/10	mié 18/08/10
35	Montaje de conductos	14 días	vie 27/08/10	jue 09/09/10
36	Extraccion Coffee	4 días	lun 30/08/10	jue 02/09/10
37	Desagues eq. Split Server	3 días	mié 25/08/10	vie 27/08/10
38	Cañeria de Split	3 días	sáb 28/08/10	lun 30/08/10
39	Posicionado de eq. Split	2 días	mar 31/08/10	mié 01/09/10
40	Termostato	2 días	vie 10/09/10	sáb 11/09/10
41	Prueba y funcionamiento	2 días	dom 12/09/10	lun 13/09/10
42	**Pintura**	**25 días**	**jue 02/09/10**	**dom 26/09/10**
43	Preparacion tabiques y cielo	17 días	jue 02/09/10	sáb 18/09/10
44	Aplicación de pintura	8 días	dom 19/09/10	dom 26/09/10
45	**Solados**	**7 días**	**lun 06/09/10**	**dom 12/09/10**
46	Colocacion zocalos	3 días	lun 06/09/10	mié 08/09/10
47	Colocacion alfombra	4 días	jue 09/09/10	dom 12/09/10
48	Colocacion Piso flotante	3 días	jue 09/09/10	sáb 11/09/10
49	**Cristales + Grafica**	**15 días**	**dom 12/09/10**	**dom 26/09/10**
50	Colocacion de perfiles	3 días	dom 12/09/10	mar 14/09/10
51	Colocacion de vidrios	7 días	mié 15/09/10	mar 21/09/10
52	Colocacion de puertas	3 días	mié 22/09/10	vie 24/09/10
53	Aplicación de grafica	2 días	sáb 25/09/10	dom 26/09/10
54	**Mobiliario**	**15 días**	**dom 12/09/10**	**dom 26/09/10**
55	Mueble Recepcion	2 días	dom 12/09/10	lun 13/09/10
56	Mueble bajo mesada Coffe	2 días	dom 12/09/10	lun 13/09/10
57	Mesada Coffe	2 días	mar 14/09/10	mié 15/09/10
58	Colocacion de cortinas roller	2 días	sáb 25/09/10	dom 26/09/10
59	**Limpieza**	**46 días**	**mié 11/08/10**	**dom 26/09/10**
60	Limpieza de obra	44 días	mié 11/08/10	vie 24/09/10
61	Limpieza final	2 días	sáb 25/09/10	dom 26/09/10

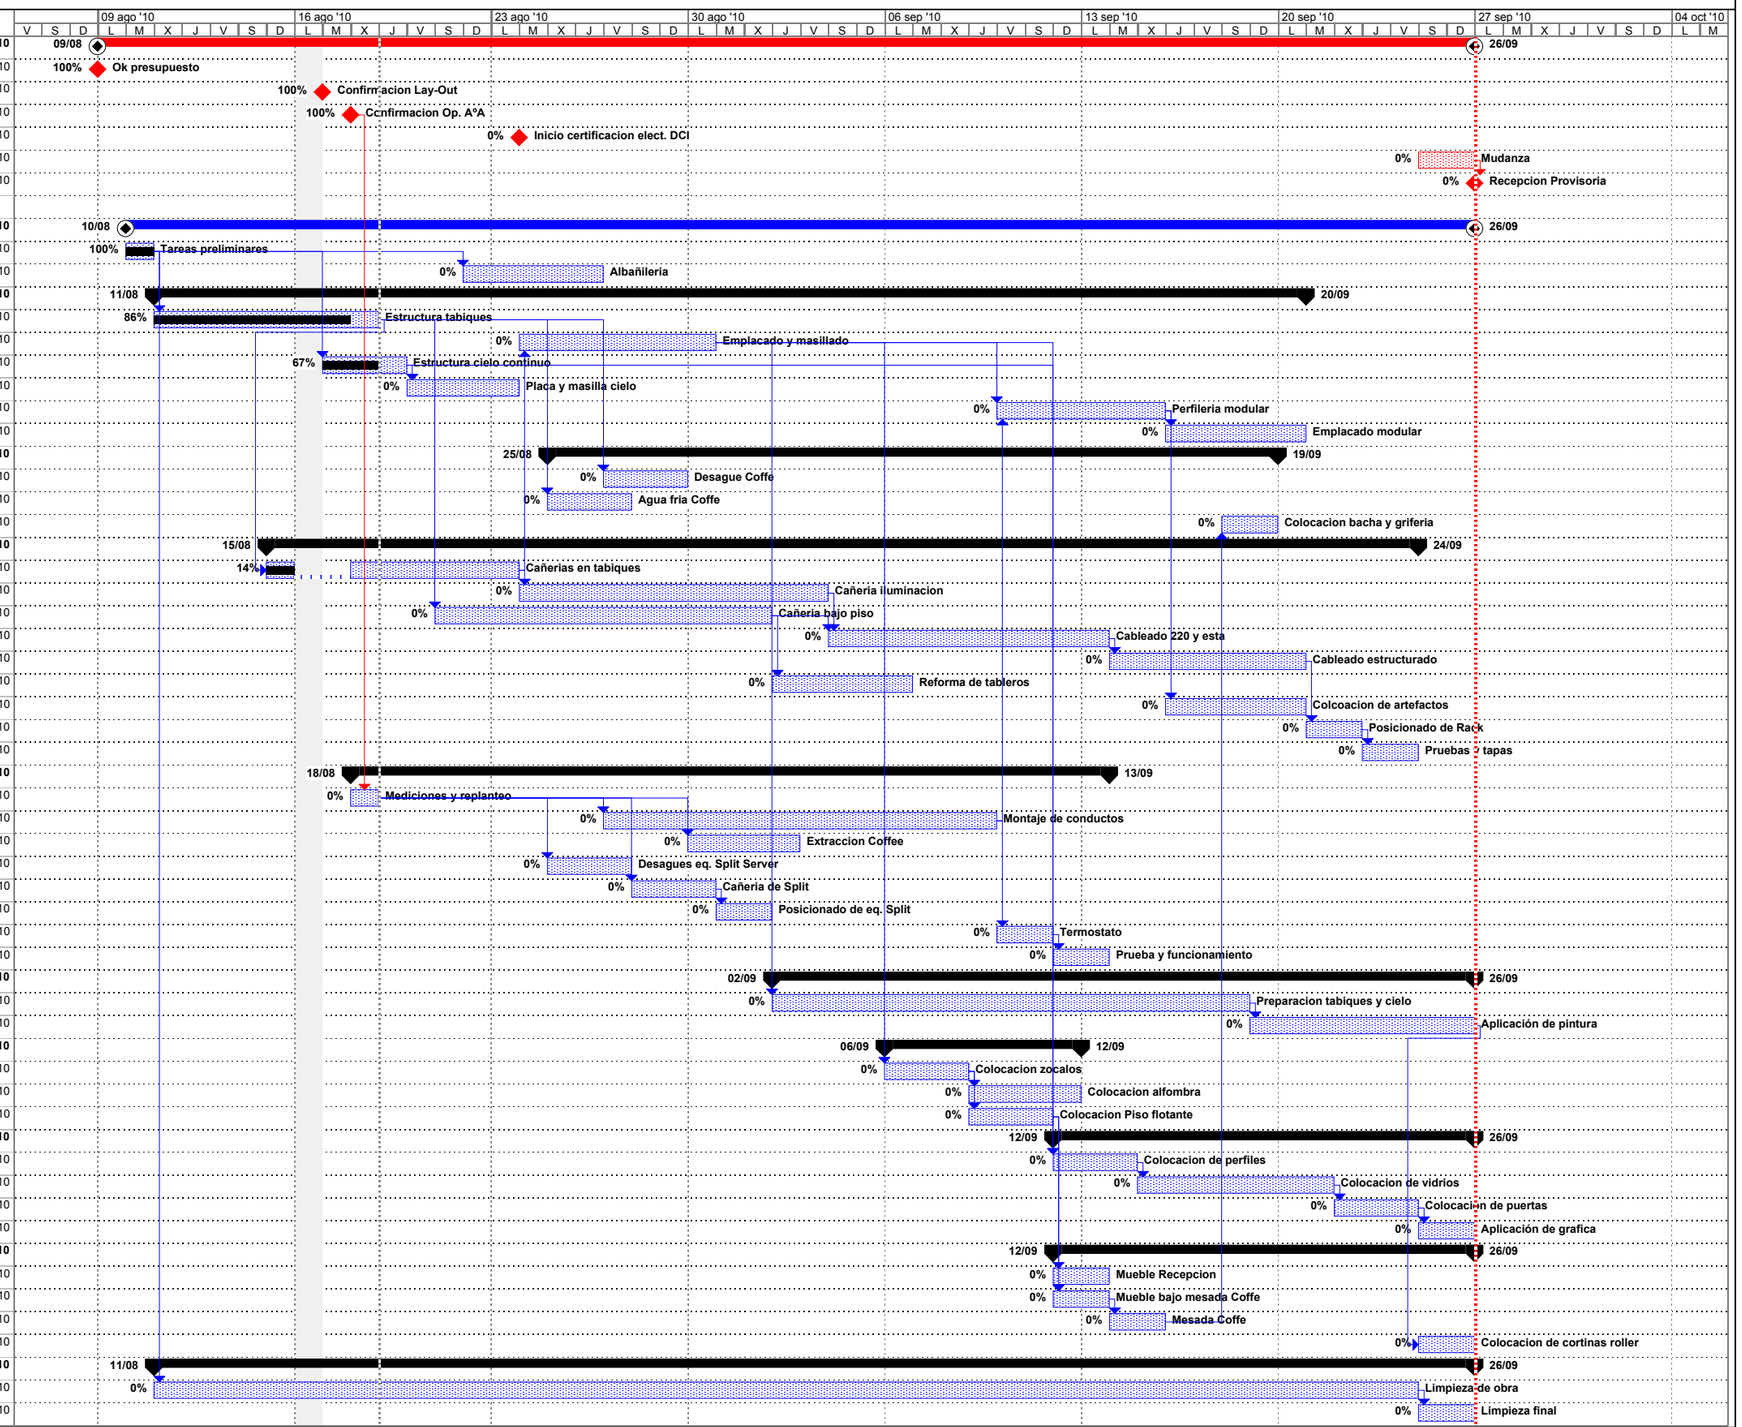

Proyecto: YAK_cronograma 02
Fecha: jue 19/08/10

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	
