Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Sucursal Banco Security Riesco**	**43 días**	**lun 23-05-11**	**lun 11-07-11**
2	**Trabajos preliminares**	**1 día**	**lun 23-05-11**	**lun 23-05-11**
3	Instalación de Faenas	1 día	lun 23-05-11	lun 23-05-11
4	Trazado de demolición	1 día	lun 23-05-11	lun 23-05-11
5	**Demolición y trazados**	**5 días**	**mar 24-05-11**	**sáb 28-05-11**
6	Demolición de grada e=12cm.	5 días	mar 24-05-11	sáb 28-05-11
7	Desmontaje de alumbrado y conexiones eléctricas	1 día	mar 24-05-11	mar 24-05-11
8	Montaje de iluminación de faena	1 día	mar 24-05-11	mar 24-05-11
9	Retiro de cielo americano	2 días	mar 24-05-11	mié 25-05-11
10	Desmontaje de difusores, rejillas, termostatos y ductos de extracción de clima e	1 día	mar 24-05-11	mar 24-05-11
11	Desmontaje de TDA	2 días	mar 24-05-11	mié 25-05-11
12	Retiro de puertas	1 día	mar 24-05-11	mar 24-05-11
13	Demolición de tabiques de volcanita	2 días	mié 25-05-11	jue 26-05-11
14	Desmontaje de cañerías de agua y gas	1 día	jue 26-05-11	jue 26-05-11
15	Retiro de baldosa	3 días	jue 26-05-11	sáb 28-05-11
16	Retiro de escombros demolición total	0 días	sáb 28-05-11	sáb 28-05-11
17	**Instalaciones sobre cielo**	**6 días**	**lun 30-05-11**	**sáb 04-06-11**
18	Trazado de cielo (parrilla+focos, splinker, clima)	1 día	lun 30-05-11	lun 30-05-11
19	Trazado e instalación de bandeja eléctrica	1 día	lun 30-05-11	lun 30-05-11
20	Canalización eléctricas	2 días	lun 30-05-11	mar 31-05-11
21	Cableado alumbrado	2 días	mié 01-06-11	jue 02-06-11
22	Reubicación del sistema de rociadores	2 días	mar 31-05-11	mié 01-06-11
23	Reubicación del sistema de detección	1 día	mié 01-06-11	mié 01-06-11
24	Alambrado sistema de detección	1 día	jue 02-06-11	jue 02-06-11
25	Reubicación equipo de clima	1 día	mar 31-05-11	mar 31-05-11
26	Instalación de despiche	1 día	mié 01-06-11	mié 01-06-11
27	Aislación de cañerías clima	1 día	mié 01-06-11	mié 01-06-11
28	Canalizaciones Eléctricas de Clima	1 día	jue 02-06-11	jue 02-06-11
29	Mantención del equipo de clima existente	2 días	vie 03-06-11	sáb 04-06-11
30	**Sobrelosa**	**2 días**	**sáb 28-05-11**	**lun 30-05-11**
31	Preparación de superficie sobrelosa (puntereo)	1 día	sáb 28-05-11	sáb 28-05-11
32	Preparación de moldaje sobrelosa	1 día	lun 30-05-11	lun 30-05-11
33	Llenado de sobrelosa	1 día	lun 30-05-11	lun 30-05-11
34	**Tabiques e instalaciones**	**14 días**	**mar 31-05-11**	**mié 15-06-11**
35	Estructuración tabique	2 días	mar 31-05-11	mié 01-06-11
36	Jaula blindada	6 días	mar 31-05-11	lun 06-06-11
37	Tabique volcometal doble placa 1 cara	1 día	jue 02-06-11	jue 02-06-11
38	Reubicación ducto descarga wc	1 día	vie 03-06-11	vie 03-06-11
39	Estructuración y forrado de zócalo baño	1 día	sáb 04-06-11	sáb 04-06-11
40	Jaula volcometal doble placa 1 cara	2 días	mar 07-06-11	mié 08-06-11
41	Reubicación de cañerías de agua potable	2 días	vie 03-06-11	sáb 04-06-11
42	Instalación de refuerzos para muebles	1 día	sáb 04-06-11	sáb 04-06-11
43	Canalización de interruptores, termostatos, enchufes, voz y datos interiores	4 días	vie 03-06-11	mar 07-06-11
44	Tabique volcometal doble placa 2ª cara	1 día	mié 08-06-11	mié 08-06-11
45	Jaula volcometal doble placa 2ª cara	2 días	mié 08-06-11	jue 09-06-11
46	Forrado de planchas trupan jaula y At publico	1 día	jue 09-06-11	jue 09-06-11
47	Enhuinchado, empastado	2 días	jue 09-06-11	vie 10-06-11
48	Aparejo	1 día	sáb 11-06-11	sáb 11-06-11
49	Cableado de electricidad y corrientes débiles	2 días	lun 13-06-11	mar 14-06-11
50	Cableado de termostatos	2 días	lun 13-06-11	mar 14-06-11
51	Instalación de módulos de enchufes e interruptores	1 día	mié 15-06-11	mié 15-06-11
52	**Vigas, dinteles y zócalos Volcometal**	**10 días**	**sáb 04-06-11**	**mié 15-06-11**
53	Estructuración de vigas y dinteles	1 día	sáb 04-06-11	sáb 04-06-11
54	Estructura metálica de vigas y dinteles	3 días	sáb 04-06-11	mar 07-06-11
55	Estructuración de vigas falsas	1 día	lun 06-06-11	lun 06-06-11
56	Forrado de vigas y dinteles	3 días	mar 07-06-11	jue 09-06-11
57	Instalación de cielo duro	2 días	mié 08-06-11	jue 09-06-11
58	Enhuinchado, empastado	1 día	vie 10-06-11	vie 10-06-11
59	Enyesado de vigas y dinteles	1 día	sáb 11-06-11	sáb 11-06-11
60	Aparejo de dinteles y vigas	1 día	lun 13-06-11	lun 13-06-11
61	Primera mano esmalte baños	1 día	mar 14-06-11	mar 14-06-11
62	Primera mano de pintura en tabiques y vigas	1 día	mié 15-06-11	mié 15-06-11
63	**Cielos modulares/duros**	**6 días**	**jue 16-06-11**	**mié 22-06-11**
64	Estructuración cielo modular	2 días	jue 16-06-11	vie 17-06-11
65	Estructuración de luminarias lineales	2 días	vie 17-06-11	sáb 18-06-11
66	Instalación de luminarias lineales	1 día	lun 20-06-11	lun 20-06-11
67	Instalación Palmetas cielo modular	3 días	lun 20-06-11	mié 22-06-11
68	Instalación de difusores y retornos de aire	2 días	mar 21-06-11	mié 22-06-11
69	Instalación de luminarias general	2 días	mar 21-06-11	mié 22-06-11
70	**Puertas y Ventanas**	**8 días**	**mar 14-06-11**	**mié 22-06-11**
71	Rectificación de medidas	1 día	mar 14-06-11	mar 14-06-11
72	Instalación de cristales blindados	2 días	mié 15-06-11	jue 16-06-11
73	Instalación de marcos y puertas	4 días	vie 17-06-11	mar 21-06-11
74	Instalación quincallería puertas	2 días	lun 20-06-11	mar 21-06-11
75	Instalación de perfilería de aluminio	4 días	mié 15-06-11	sáb 18-06-11
76	Instalación de cristales	1 día	lun 20-06-11	lun 20-06-11
77	Instalación de puertas protex	3 días	lun 20-06-11	mié 22-06-11
78	Instalación de terminaciones de cristales blindados	1 día	mar 21-06-11	mar 21-06-11
79	Instalación de Junquillos de aluminio	1 día	mié 22-06-11	mié 22-06-11
80	**Pavimentos y revestimientos**	**8 días**	**mié 22-06-11**	**jue 30-06-11**
81	Preparación y limpiado de superficies	1 día	mié 22-06-11	mié 22-06-11
82	Instalación de piedra pizarra piso	4 días	jue 23-06-11	lun 27-06-11
83	Instalación de piso sala de Rack	1 día	lun 27-06-11	lun 27-06-11
84	Recepción de alfombra	0 días	vie 24-06-11	vie 24-06-11
85	Instalación de alfombras	2 días	mar 28-06-11	mié 29-06-11
86	Cubierta de alfombra con cartón	1 día	mié 29-06-11	mié 29-06-11
87	Instalación de cubrejuntas baño y cajero automático	1 día	jue 30-06-11	jue 30-06-11
88	**Recintos Húmedos**	**3 días**	**lun 27-06-11**	**mié 29-06-11**
89	Certificación y prueba sanitaria	1 día	lun 27-06-11	lun 27-06-11
90	Instalación de Lavamanos	1 día	mar 28-06-11	mar 28-06-11
91	Instalación de Wc	1 día	mar 28-06-11	mar 28-06-11
92	Instalación de accesorios	1 día	mié 29-06-11	mié 29-06-11
93	Instalación espejos	1 día	mié 29-06-11	mié 29-06-11
94	**Terminaciones en zonas de trabajo**	**3 días**	**mar 28-06-11**	**jue 30-06-11**
95	Instalación topes puertas	1 día	mar 28-06-11	mar 28-06-11
96	Instalación de guardapolvos	3 días	mar 28-06-11	jue 30-06-11
97	**Terminación de pinturas**	**5 días**	**vie 01-07-11**	**mié 06-07-11**
98	Segunda mano esmalte baños	1 día	vie 01-07-11	vie 01-07-11
99	Pinturas marcos y puertas	3 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
100	Segunda mano de pintura en tabiques y vigas	3 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
101	Vitrificado de piedra pizarra	4 días	sáb 02-07-11	mié 06-07-11
102	**Otros**	**5 días**	**mié 29-06-11**	**lun 04-07-11**
103	Canalización de puestos operativos	2 días	mié 29-06-11	jue 30-06-11
104	Instalación de muebles caja y Atención a publico	2 días	jue 30-06-11	vie 01-07-11
105	Instalación de muebles Fuerza de ventas	2 días	vie 01-07-11	sáb 02-07-11
106	Certificación, prueba y rotulado datos	1 día	lun 04-07-11	lun 04-07-11
107	Certificación, prueba y rotulado clima	1 día	lun 04-07-11	lun 04-07-11
108	Certificación, prueba y rotulado eléctrico	1 día	lun 04-07-11	lun 04-07-11
109	**Observaciones**	**6 días**	**mar 05-07-11**	**lun 11-07-11**
110	Limpieza general	6 días	mar 05-07-11	lun 11-07-11
111	Preentrega y revisión interna	1 día	mié 06-07-11	mié 06-07-11
112	Levantamiento de observaciones	2 días	jue 07-07-11	vie 08-07-11
113	Entrega Provisoria Contract	1 día	sáb 09-07-11	sáb 09-07-11
114	Entrega final	1 día	lun 11-07-11	lun 11-07-11

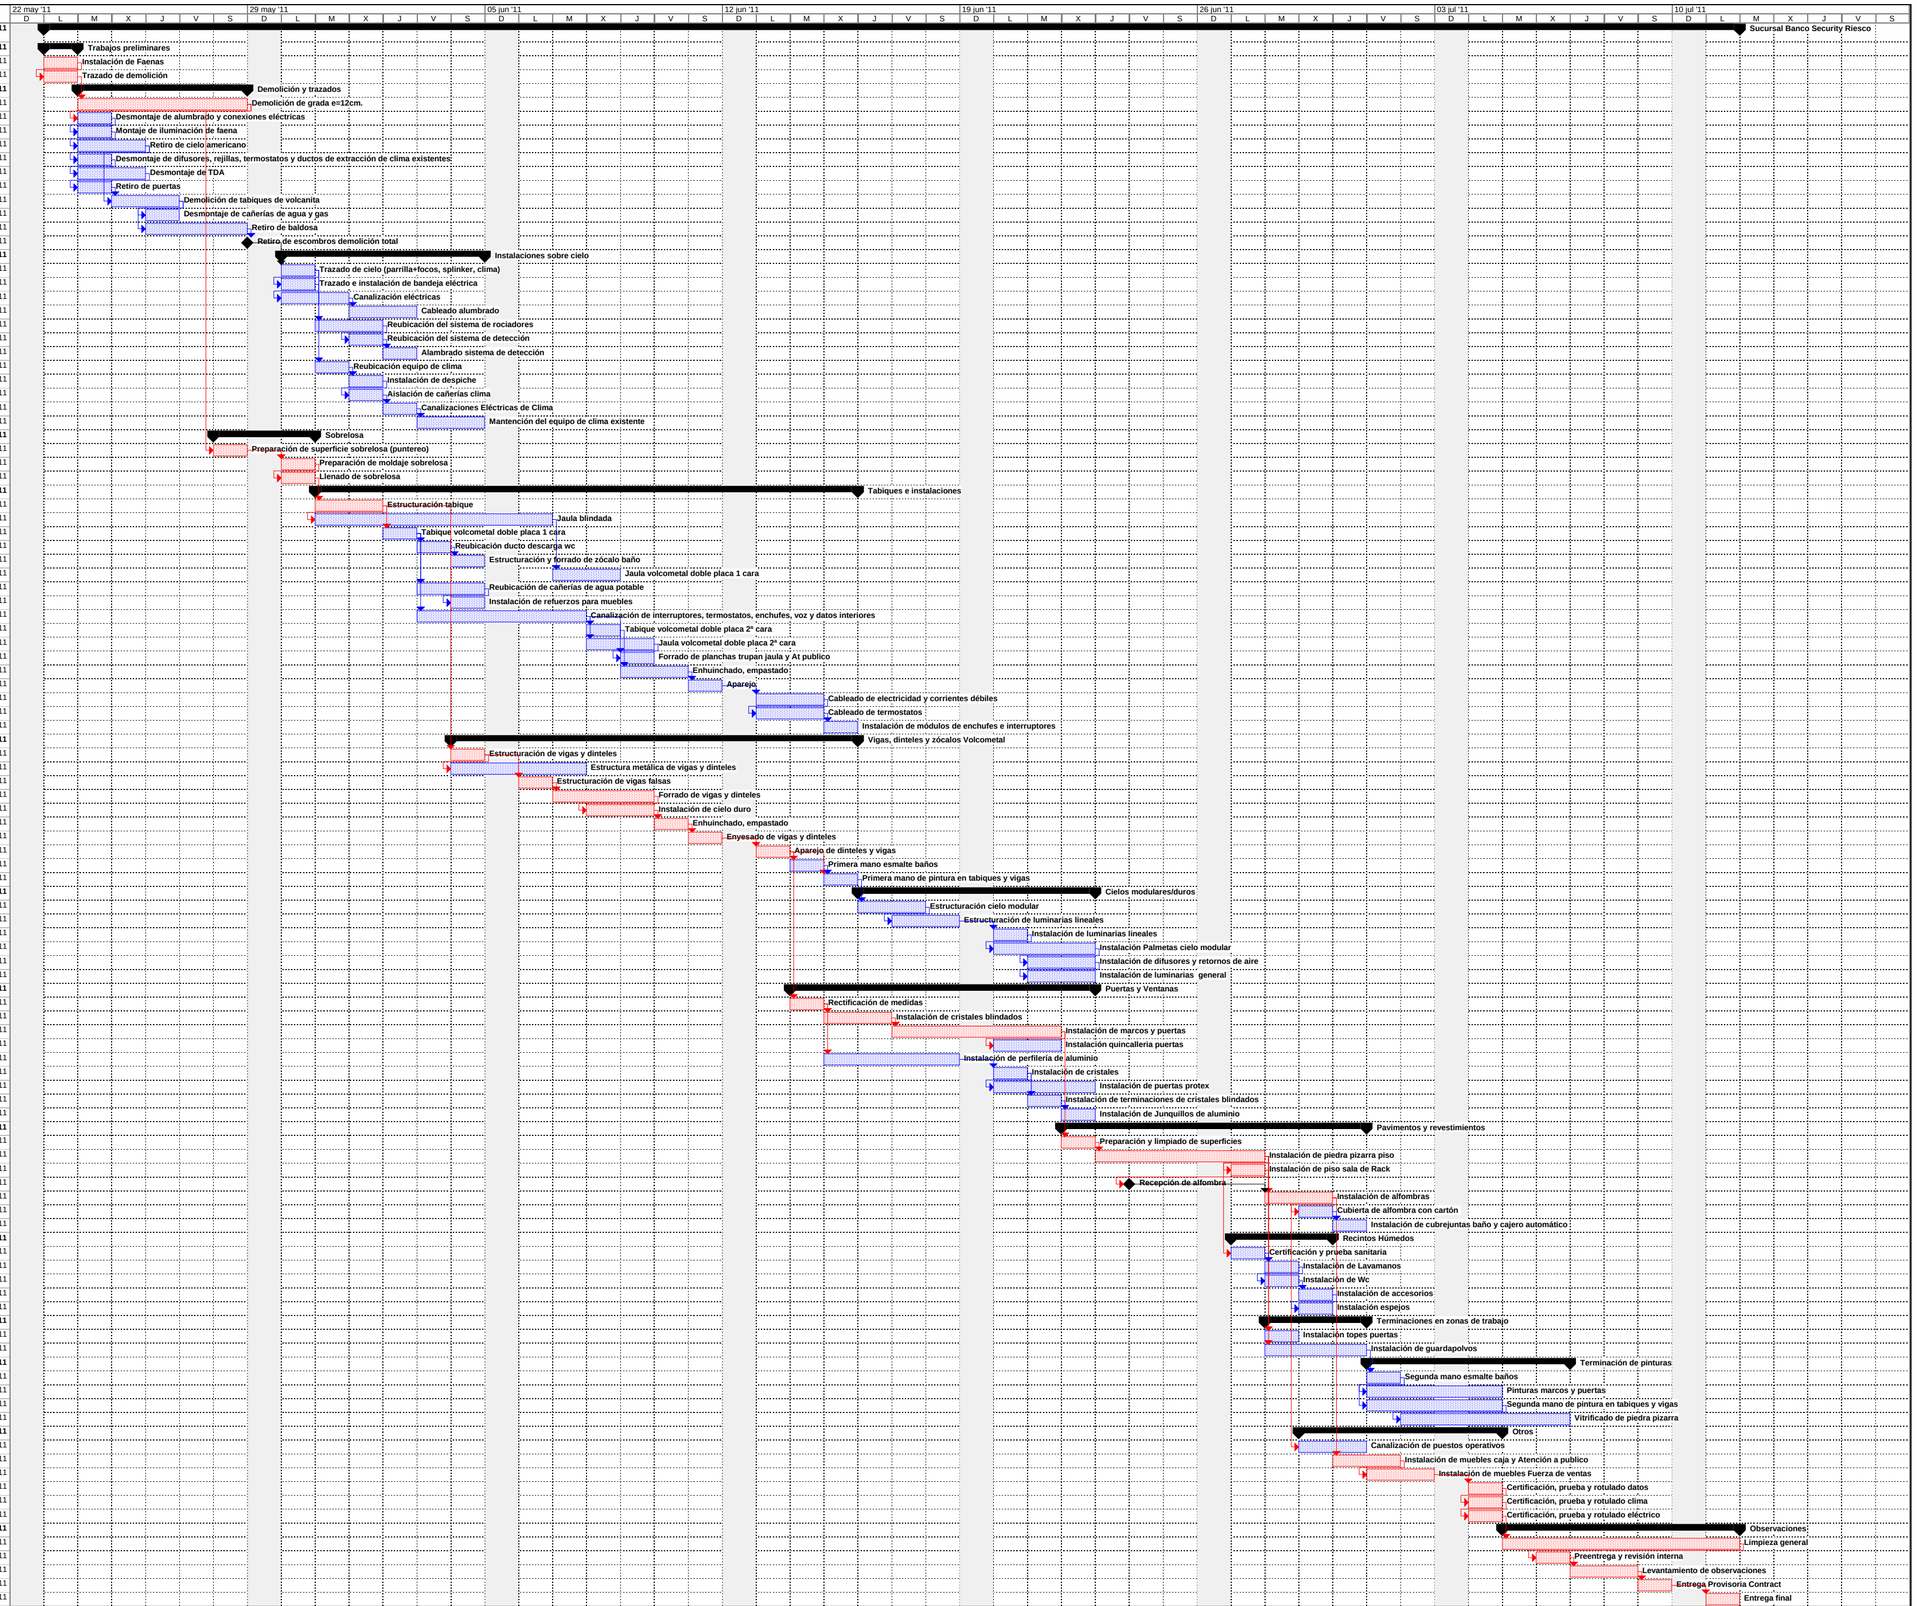

Proyecto: Security Riesco
Fecha: jue 19-05-11

Tarea | Tarea crítica | Hito | Tarea resumida | Hito resumido | División | Resumen del proyecto | Fecha límite
Progreso de tarea | Progreso de tarea crítica | Resumen | Tarea crítica resumida | Progreso resumido | Tareas externas | Agrupar por síntesis
