Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		**Obra: Constructora AG**	**29 días?**	**mar 30/08/11**
2		Inicio	0 días	mar 30/08/11
3		**Demoliciones**	**3 días**	**mar 30/08/11**
5		Descolocación de frentes de cristal	1 día	mar 30/08/11
7		Desarme de instalación eléctrica	1 día	mar 30/08/11
8		Desmonte de pisos	1 día	mar 30/08/11
4		Demolición de tabiques y puertas	2 días	mar 30/08/11
6		Demolición de mampostería y canalizaciones	2 días	mié 31/08/11
9		**Albañilería**	**1 día**	**vie 02/09/11**
10		Tapado de canalizaciones	1 día	vie 02/09/11
14		**Cielorraso de durlock**	**2 días**	**mar 06/09/11**
15		Armado de cielorraso en sectro frente	2 días	mar 06/09/11
11		**Tabiques de durlock**	**3 días**	**mar 06/09/11**
12		Armado de estructura y 1º placa	2 días	mar 06/09/11
13		2º placa y masillado	1 día	jue 08/09/11
32		**Pisos**	**3 días**	**mié 21/09/11**
33		Colocación de alfombra	2 días	mié 21/09/11
34		Colocación de piso vinilico	1 día	vie 23/09/11
44		**Cortinas**	**1 día?**	**vie 23/09/11**
45		Colocación de cortinas	1 día?	vie 23/09/11
35		**Carpintería de madera**	**2 días**	**vie 23/09/11**
36		Colocación de puertas	2 días	vie 23/09/11
37		**Cristales**	**17 días**	**mié 07/09/11**

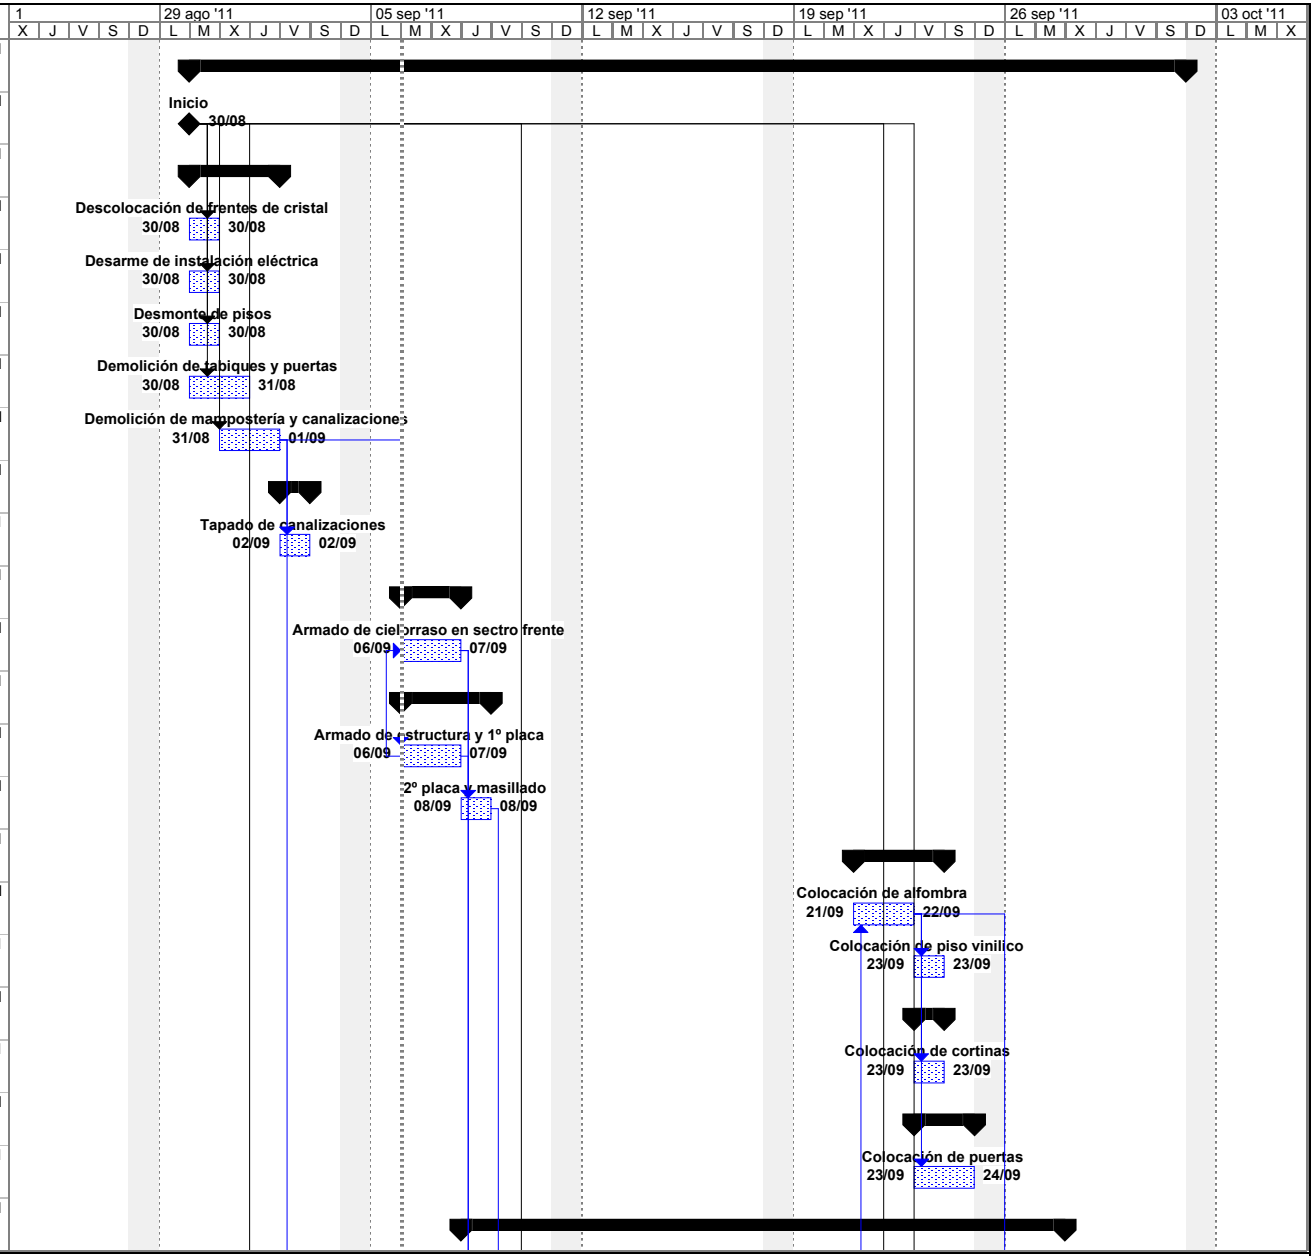

Proyecto: Project Constructora AG
Fecha: mar 06/09/11

Tarea		Hito		Tarea crítica resumida		División		Agrupar por síntesis	
fi		Resumen		Hito resumido		Tareas externas		Fecha límite	
Progreso		Tarea resumida		Progreso resumido		Resumen del proyecto			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
38	Medición	0 días	mié 07/09/11
39	Colocación de frentes de oficina	2 días	lun 26/09/11
40	**Mobiliario**	**15 días**	**sáb 10/09/11**
41	Armado de mobiliario de guardado a medida	10 días	sáb 10/09/11
43	Armado de privados	3 días	jue 22/09/11
42	Armado de puestos de trabajo sector operativo	4 días	vie 23/09/11
30	**Aire Acondicionado**	**3 días**	**lun 26/09/11**
31	Instalación de splits	3 días	lun 26/09/11
26	**Pintura**	**20 días**	**jue 08/09/11**
27	Latex en cielorraso	7 días	jue 08/09/11
28	Latex satinado en tabiques	10 días	vie 09/09/11
29	Terminaciones	3 días	mié 28/09/11
16	**Instalación eléctrica y cableado**	**27 días?**	**jue 01/09/11**
18	Canalizaciones bajo piso	2 días	vie 02/09/11
19	Tendido de bandejas	1 día?	mié 07/09/11
24	Cableado de bocas de iluminación	6 días	jue 01/09/11
20	Colocación de cablecanal	4 días	lun 05/09/11
21	Tendido de circuitos para puestos	6 días	vie 09/09/11
22	Cableado de UTP	6 días	vie 09/09/11
17	Armado de tableros	6 días	mié 14/09/11
25	Colocación de artefactos de iluminación	4 días	vie 16/09/11
23	Cableado de puestos de trabajo	4 días	mié 28/09/11

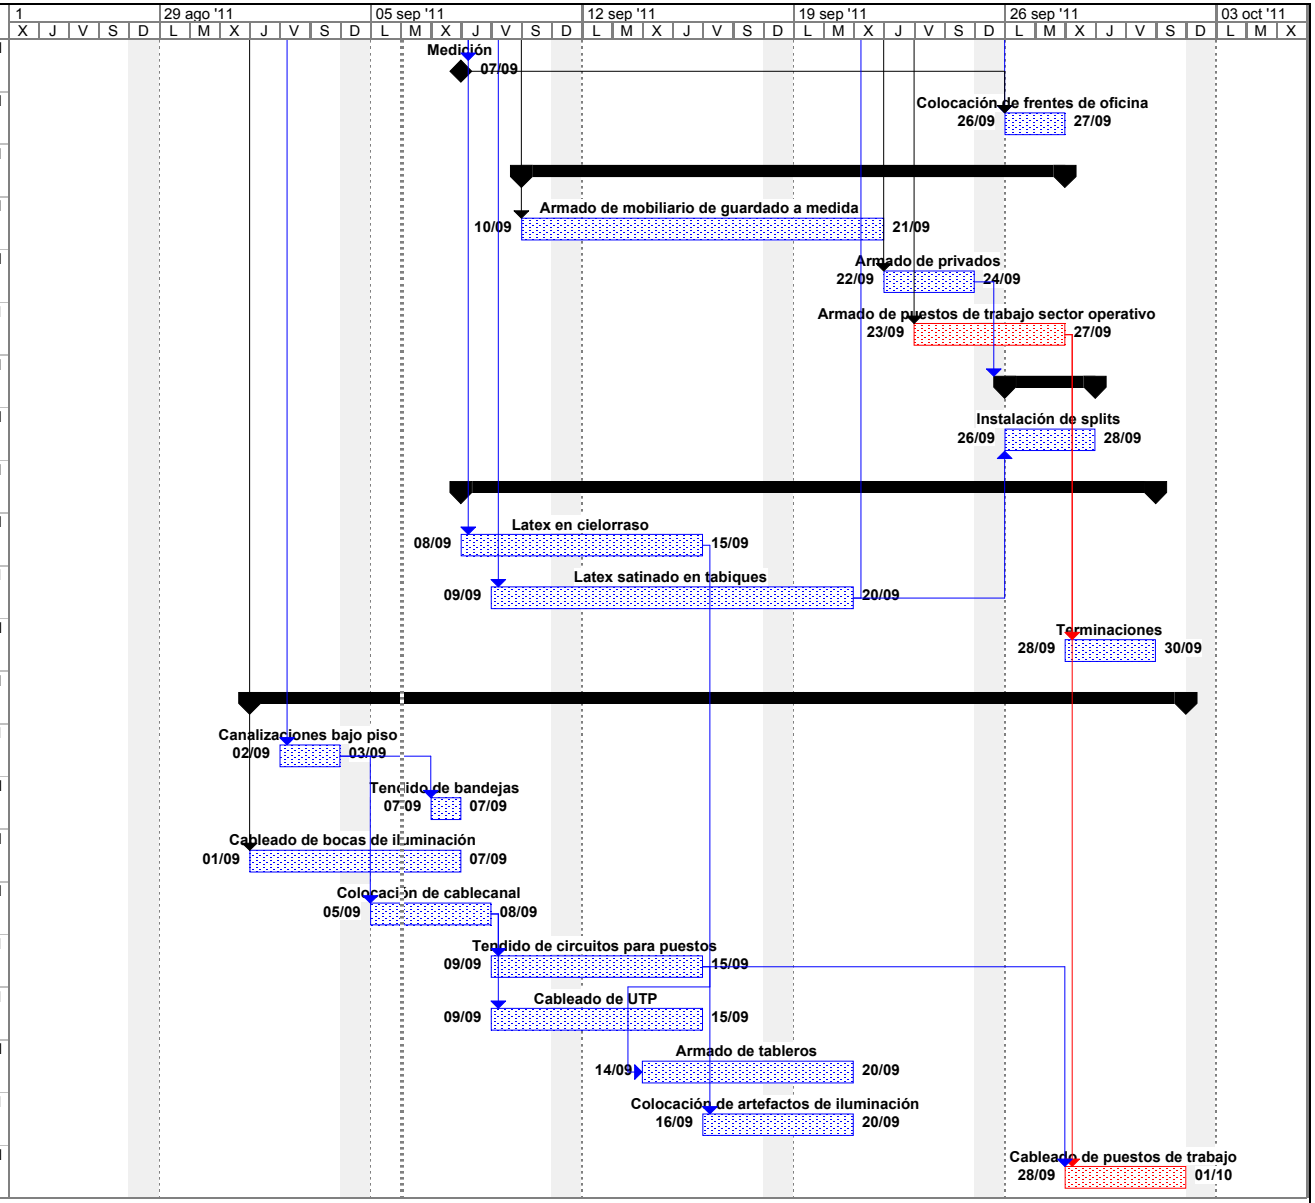

Proyecto: Project Constructora AG
Fecha: mar 06/09/11

Tarea		Hito		Tarea crítica resumida		División		Agrupar por síntesis	
fi		Resumen		Hito resumido		Tareas externas		Fecha límite	
Progreso		Tarea resumida		Progreso resumido		Resumen del proyecto			
