Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	**OROPLATA - Oficinas administrativas**	**39 días**	**mar 25/10/11**
2	**DEMOLICIONES**	**9 días**	**mié 26/10/11**
3	Electricidad provisoria	1 día	mar 25/10/11
4	Desarme de instalaciones existentes en tabiques a demoler y descol	7 días	mié 26/10/11
5	Demolicion de cielorrasos	7 días	mié 26/10/11
6	Desarme de cielorrasos	7 días	mié 26/10/11
7	Demolición de tabiques en placas de roca de yeso	7 días	mié 26/10/11
8	Descolocación de alfombras	2 días	mié 26/10/11
9	Descolocación de pisos de madera	2 días	mié 26/10/11
10	Descolocación de sistema tabiquería modular, módulo paño fijo cris	2 días	mié 26/10/11
11	Retiro y descolocación de entelados	6 días	mié 26/10/11
12	**TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**16 días**	**mar 25/10/11**
13	Armado de estructura de tabique y emplacado en una cara	5 días	mar 25/10/11
14	Aislacion acustica	10 días	lun 31/10/11
15	Emplacado de segunda cara y masillado	3 días	vie 11/11/11
16	Sobre tabique 0,10m esp.	10 días	jue 03/11/11
17	**TABIQUES SEGÚN SISTEMA**	**5 días**	**mié 16/11/11**
18	Recolocación de tabiquería modular y puertas existentes sin modifica	5 días	mié 16/11/11
19	**CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**16 días**	**mar 25/10/11**
20	Estructura	2 días	jue 10/11/11
21	Emplacado, tomado de junta y masilla	5 días	mar 25/10/11
22	Cajón tipo gargantá para iluminacion	5 días	mar 25/10/11
23	**CIELORRASO MODULAR**	**3 días**	**lun 21/11/11**
24	Nivelación de cielorraso modular	3 días	lun 21/11/11
25	**PISOS ALFOMBRADOS**	**2 días**	**lun 28/11/11**
26	Provisión de alfombra	2 días	lun 28/11/11
27	Instalación de alfombra modular , incluye adhesivo con memoria	1 día	mar 29/11/11
28	**PISOS DE MADERA / FLOTANTES**	**1 día**	**sáb 26/11/11**
29	KRONOFLOR piso flotante melamínico, origen bulgaro, línea CLASE	0 días	sáb 26/11/11
30	Colocación piso flotante laminado, incluye adhesivo o click, film de po	1 día	sáb 26/11/11
31	**PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA**	**1 día**	**sáb 26/11/11**
32	Instalación de piso de goma encastrable	1 día	sáb 26/11/11
33	**PISOS TECNICOS**	**12 días**	**mar 25/10/11**
34	Cortes, calados y perforaciones	2 días	mar 25/10/11
35	Nivelación piso técnico existente	2 días	sáb 05/11/11
36	**ZOCALOS**	**3 días**	**mié 16/11/11**
37	Zócalo de madera para pintar, de 1/2" x 3" o 4" (provisión, corte y colo	3 días	mié 16/11/11
38	**PINTURA**	**17 días**	**lun 14/11/11**
39	Preparación y pintado de cielorraso con látex común	10 días	lun 14/11/11
40	Preparacion y pintura de muros	15 días	mié 16/11/11
41	Pintura de puertas y marcos	2 días	mié 30/11/11
42	Pintado de zócalos de madera/MDF	5 días	lun 28/11/11
43	Pintura para rejas de aire acondicionado	3 días	mié 30/11/11
44	**CRISTALES**	**10 días**	**sáb 19/11/11**
45	Frente de cristal float templado incoloro	10 días	sáb 19/11/11
46	Puerta doble con pivot	3 días	sáb 19/11/11
47	**INSTALACIÓN SANITARIA**	**24 días**	**mar 25/10/11**
48	Termotanque electrico instalación	1 día	sáb 19/11/11
49	Instalacion sanitaria para maquina expendedora instalación	2 días	sáb 19/11/11
50	Colocación de griferia cocina	1 día	sáb 19/11/11
51	Instalacion para lavavajilla	2 días	mar 25/10/11
52	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**34 días**	**mar 25/10/11**
53	Adaptación de Tableros Seccionales existentes	20 días	mié 02/11/11
54	Canalizaciones bajo piso tecnico	15 días	jue 27/10/11
55	Canalizacion en techo para instalacion electrica de iluminacion	15 días	mar 25/10/11
56	Canalizacion en techo para instalaciones complementarias	15 días	mar 25/10/11
57	Cableado instalacion electrica de iluminacion	10 días	vie 28/10/11
58	Cableado de tensión común para puestos trabajo	7 días	lun 07/11/11
59	Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo	7 días	lun 07/11/11
60	Canalización y cableado de tomacorrientes de servicio	7 días	lun 07/11/11
61	Provisión e instalación de pertacopias de 6 módulos	2 días	mar 30/11/11
62	Reinstalación de artefactos de iluminación existentes	7 días	mar 15/11/11
63	**INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO**	**17 días**	**mié 16/11/11**
64	Cableado para datos	5 días	mié 16/11/11
65	Cableado para voz	5 días	mié 16/11/11
66	Impactado de RJ 45	4 días	mié 30/11/11
67	Armado de cuerto de cableado	5 días	lun 28/11/11
68	Rotulacion	2 días	sáb 03/12/11
69	Certificación puestos trabajo	2 días	sáb 03/12/11
70	Instalacion WIFI	1 día	mié 16/11/11
71	**SISTEMAS MULTIMEDIA**	**5 días**	**vie 11/11/11**
72	Canalizacion	2 días	vie 11/11/11
73	Cableado	2 días	lun 28/11/11
74	**INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION**	**24 días**	**jue 03/11/11**
75	Instalacion de conductos	3 días	jue 03/11/11
76	Modificación de conductos existentes	7 días	jue 03/11/11
77	Reubicacion de difusores y rejillas (montantes y retornos)	7 días	lun 14/11/11
78	Colocación de equipo de server existente	1 día	sáb 03/11/11
79	**GRAFICA Y SEÑALIZACION**	**2 días**	**lun 05/12/11**
80	Vinilos, conmutado LG CHEM	2 días	lun 05/12/11
81	Vinilos, oficinas y/o especiales	2 días	lun 05/12/11
82	Carpetas	2 días	lun 05/12/11
83	Grafica especial en pared coffee	2 días	lun 05/12/11
84	**MUEBLES ESPECIALES**	**4 días**	**vie 02/12/11**
85	Mueble Recepcion	4 días	vie 02/12/11
86	Mueble coffe	4 días	vie 02/12/11
87	Mueble copy asistente	4 días	vie 02/12/11
88	Mueble copy area	4 días	vie 02/12/11
89	Mueble bajo mesada cocina	1 día	vie 02/12/11
90	Puertas especiales	1 día	vie 02/12/11
91	**CORTINAS Y PERSIANAS**	**1 día**	**vie 02/12/11**
92	Instalación standard cortina manual ROLLERS	1 día	vie 02/12/11
93	**LIMPIEZA DE OBRA**	**8 días**	**mié 30/11/11**
94	Limpieza de obra final	8 días	mié 30/11/11

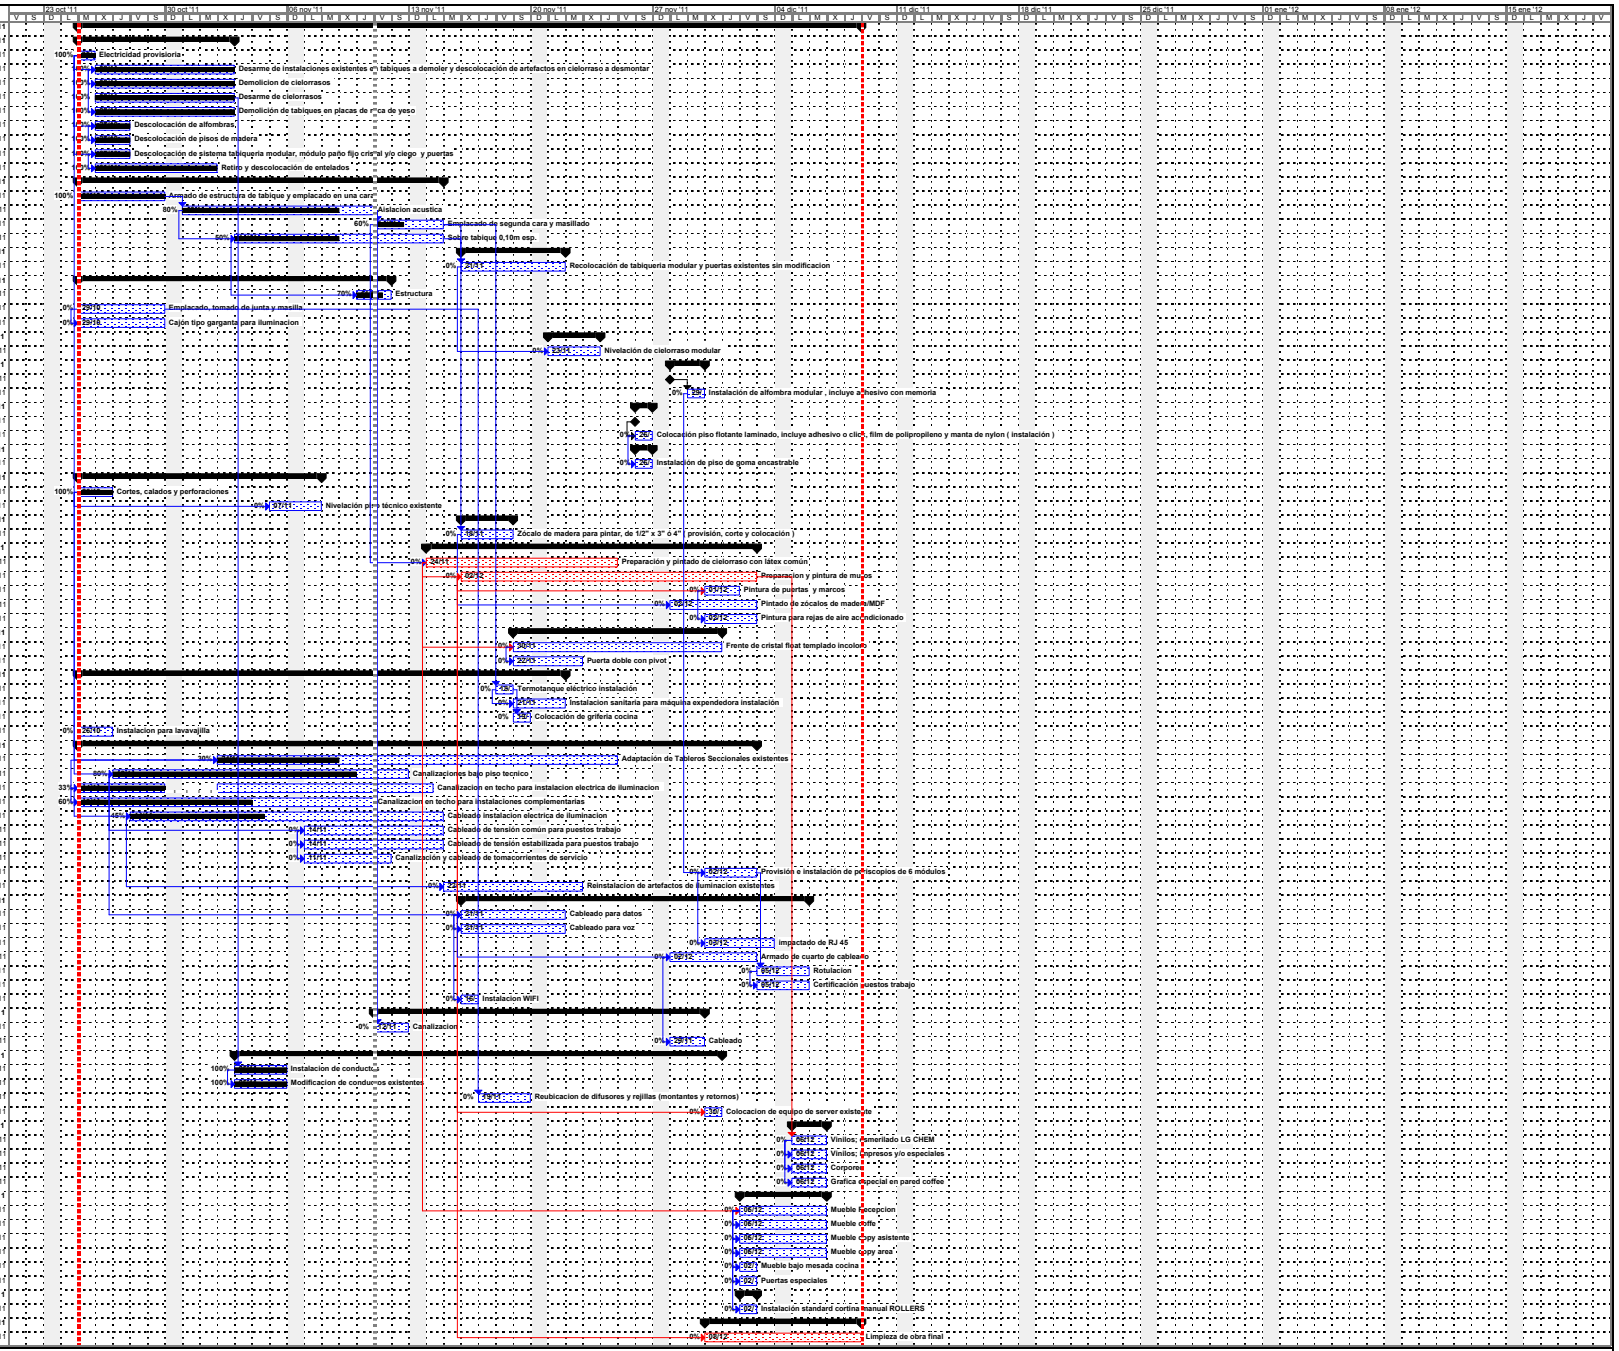

Proyecto: Oro Plata - Informe 01
Fecha: vie 11/11/11

Tarea · Tarea crítica · Progreso · Hito · Resumen · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · División · Tareas externas · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Fecha límite
