Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**OBRA HAYS**	76 días	lun 14-05-12	mié 31-07-12
2	**REQUISITOS INGRESO a OBRA**	2 días	lun 14-05-12	mar 15-05-12
3	Entrega de terreno (OPCIÓN TÓN)	0 días	lun 14-05-12	lun 14-05-12
4	Entrega de energía eléctrica, agua y alcantarillado	0 días	lun 14-05-12	lun 14-05-12
5	Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio.	0 días	lun 14-05-12	lun 14-05-12
6	Pago del anticipo por parte del cliente	0 días	mar 15-05-12	mar 15-05-12
7	**OBRA: Habitaciones oficinas HAYS**	76 días	lun 14-05-12	mar 31-07-12
8	**PROYECTOS**	5 días	lun 14-05-12	vie 18-05-12
9	Encargo de proyectos de especialidades	0 días	lun 14-05-12	lun 14-05-12
10	Entrega de proyectos de seguridad y sanitario	0 días	vie 18-05-12	vie 18-05-12
11	Entrega de proyectos eléctricos, cableado estructurado y clima	0 días	vie 18-05-12	vie 18-05-12
12	**INICIO DE OBRA**	8 días	mié 16-05-12	jue 24-05-12
13	Nivelación de losa. Considera el 100 % de la superficie.	6 días	mié 16-05-12	mar 22-05-12
14	Perforaciones en losa para electrificación de mobiliario.	2 días	mié 23-05-12	jue 24-05-12
15	Instalación de faena	1 día	mié 23-05-12	mié 23-05-12
16	Trazado	1 día	mié 23-05-12	mié 23-05-12
17	**TABIQUES , VIGAS Y CIELO**	27 días	mar 22-05-12	dom 17-06-12
18	**Tabiques**	20 días	mar 22-05-12	dom 10-06-12
19	Estructura Tabiques	7 días	mar 22-05-12	lun 28-05-12
20	Emplacado 1ª cara	6 días	dom 27-05-12	vie 01-06-12
21	Aislación en tabiques	4 días	mar 05-06-12	vie 08-06-12
22	Emplacado 2ª cara	6 días	dom 05-06-12	lun 10-06-12
23	Refuerzos en tabiques	2 días	mié 30-05-12	jue 31-05-12
24	**Vigas Volcanetal**	10 días	jue 31-05-12	sáb 09-06-12
25	Estructura vigas	6 días	jue 31-05-12	mar 05-06-12
26	Emplacado de vigas	4 días	mié 06-06-12	sáb 09-06-12
27	**Cielo**	20 días	mar 29-05-12	dom 17-06-12
28	**Cielo duro**	6 días	mar 29-05-12	dom 03-06-12
29	Estructura Cielo Duro (platón)	4 días	mar 29-05-12	vie 01-06-12
30	Emplacado Cielo duro (platón)	3 días	vie 01-06-12	dom 03-06-12
31	**Cielo americano**	8 días	dom 10-06-12	dom 17-06-12
32	Instalación perfilería (estructura)	5 días	dom 10-06-12	jue 14-06-12
33	Instalación de palmetas	3 días	vie 15-06-12	dom 17-06-12
34	**PAVIMENTOS**	47 días	mié 16-05-12	mié 04-07-12
35	Compra alfombra	0 días	mié 16-05-12	mié 16-05-12
36	Llegada de alfombra a obra	0 días	mié 04-07-12	mié 04-07-12
37	Instalación de Alfombra	2 días	vie 29-06-12	sáb 30-06-12
38	Instalación de porcelanato PISO	6 días	lun 11-06-12	lun 18-06-12
39	**GUARDAPOLVOS**	6 días	vie 29-06-12	jue 05-07-12
40	Instalación de guardapolvo	6 días	vie 29-06-12	jue 05-07-12
41	**PINTURA Y REVESTIMIENTOS**	49 días	mar 29-05-12	mié 18-07-12
42	Prep. y entubido planes sustentes	3 días	mar 29-05-12	sáb 02-06-12
43	Preparación de tabiques y muros	6 días	vie 01-06-12	mié 06-06-12
44	Pintura en muros y tabiques 1º mano	6 días	mar 05-06-12	dom 10-06-12
45	Pintura en muros y tabiques 2º mano	6 días	lun 25-06-12	sáb 30-06-12
46	Repintado de muros luego de instalación de muebles	2 días	mar 17-07-12	mié 18-07-12
47	Preparación y empastado cielo,vigas	6 días	vie 08-06-12	mié 13-06-12
48	Pintura en cielos y vigas 1º mano	6 días	mié 13-06-12	lun 18-06-12
49	Pintura en cielos y vigas 2º mano	6 días	lun 25-06-12	sáb 30-06-12
50	Pintura de puertas	5 días	lun 25-06-12	vie 29-06-12
51	**CRISTALES**	21 días	dom 10-06-12	dom 01-07-12
52	**TABIQUE VIDRIADO**	11 días	mié 13-06-12	dom 24-06-12
53	Rectificación de medidas cristales	0 días	mié 13-06-12	mié 13-06-12
54	Instalación de perfiles y cristales	4 días	jue 21-06-12	dom 24-06-12
55	**Espejo**	21 días	dom 10-06-12	dom 01-07-12
56	Rectificación de medida	0 días	dom 10-06-12	dom 10-06-12
57	Instalación de espejo	1 día	dom 01-07-12	dom 01-07-12
58	**CORTINAS**	33 días	dom 10-06-12	sáb 14-07-12
59	Rectificación de medidas	0 días	dom 10-06-12	dom 10-06-12
60	Instalación de cortinas	4 días	mié 11-07-12	sáb 14-07-12
61	**CARPINTERIA**	16 días	sáb 09-06-12	lun 25-06-12
62	**Puertas de Madera**	16 días	sáb 09-06-12	lun 25-06-12
63	Rectificación de medidas	0 días	sáb 09-06-12	sáb 09-06-12
64	Instalación de Marcos	4 días	dom 17-06-12	mié 20-06-12
65	Instalación de puertas	5 días	jue 21-06-12	lun 25-06-12
66	**MUEBLES DE LINEA**	59 días	mié 16-05-12	mar 17-07-12
67	Compra de mobiliario	0 días	mié 16-05-12	mié 16-05-12
68	Llegada de mobiliario a obra	0 días	mié 11-07-12	mié 11-07-12
69	Instalación y armado	5 días	jue 12-07-12	mar 17-07-12
70	**MUEBLES ESPECIALES**	35 días	mié 16-05-12	jue 21-06-12
71	Contratación Muebles	0 días	mié 16-05-12	mié 16-05-12
72	Instalación mobiliario especial	5 días	dom 17-06-12	jue 21-06-12
73	**SILLAS**	72 días	mié 16-05-12	lun 30-07-12
74	Compra de sillas	0 días	mié 16-05-12	mié 16-05-12
75	Llegada de las sillas a obra	1 día	lun 30-07-12	lun 30-07-12
76	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	62 días	jue 24-05-12	jue 26-07-12
77	**Electricidad**	62 días	jue 24-05-12	jue 26-07-12
78	Canalizaciones por tabiquería	7 días	jue 31-05-12	mié 06-06-12
79	Canalizaciones por cielo	8 días	jue 24-05-12	jue 31-05-12
80	Cableado por tabiquería	6 días	jue 07-06-12	mar 12-06-12
81	Cableado por cielo	6 días	vie 01-06-12	mié 06-06-12
82	Canalizaciones por piso	4 días	jue 07-06-12	dom 10-06-12
83	Cableado por piso	4 días	lun 11-06-12	jue 14-06-12
84	Canalización perimetro	3 días	vie 15-06-12	dom 17-06-12
85	Cableado perimetro	2 días	lun 18-06-12	mié 20-06-12
86	Canalización de mobiliario	3 días	mié 18-07-12	dom 22-07-12
87	Cableado por mobiliario	5 días	dom 22-07-12	jue 26-07-12
88	Instalación de luminarias	6 días	vie 29-06-12	jue 05-07-12
89	Trabajos en tablero	5 días	lun 11-06-12	vie 15-06-12
90	Arranques eléctricos para clima	3 días	jue 21-06-12	sáb 23-06-12
91	Canalización de termostatos	2 días	dom 24-06-12	lun 25-06-12
92	Instalación de interruptores	3 días	vie 29-06-12	dom 01-07-12
93	Instalación de face plates	3 días	mar 02-07-12	mié 04-07-12
94	**Cableado estructural**	21 días	dom 01-07-12	lun 23-07-12
95	Instalación Rack	1 día	dom 01-07-12	dom 01-07-12
96	Trabajos en Rack	4 días	dom 15-07-12	jue 19-07-12
97	Certificación	2 días	vie 20-07-12	sáb 21-07-12
98	Rotulación	2 días	dom 22-07-12	lun 23-07-12
99	**AIRE ACONDICIONADO (Entrega de 08 equipos por el edificio)**	31 días	lun 18-06-12	vie 20-07-12
100	Izado y montaje de equipos de clima.	3 días	lun 18-06-12	mié 20-06-12
101	Inst. de cañerías y tuberías.	8 días	jue 21-06-12	jue 28-06-12
102	Red de tubos de desagues	6 días	jue 28-06-12	mié 04-07-12
103	Prueba hidráulica	1 día	jue 05-07-12	jue 05-07-12
104	Instalación de plenos y ductos en hojalatería.	8 días	mar 26-06-12	mié 04-07-12
105	Conexión eléctrica de equipos	4 días	jue 21-06-12	dom 24-06-12
106	Instalación de mangas flexibles	6 días	jue 05-07-12	mar 10-07-12
107	Instalación de difusores y retornos	5 días	mié 11-07-12	dom 15-07-12
108	Instalación de termostatos	3 días	mar 17-07-12	jue 19-07-12
109	Prueba y puesta en marcha	1 día	vie 20-07-12	vie 20-07-12
110	**SEGURIDAD**	15 días	vie 15-06-12	vie 29-06-12
111	**Extinción de Incendios**	12 días	vie 15-06-12	mar 26-06-12
112	Red Pipping matriz de agua	5 días	vie 15-06-12	mar 19-06-12
113	Instalación y bajada de rotas	5 días	mié 20-06-12	dom 24-06-12
114	Prueba de presión	1 día	lun 25-06-12	lun 25-06-12
115	Instalación de aprinkeiro	5 días	mié 20-06-12	dom 24-06-12
116	Pruebas y puesta en marcha	2 días	lun 25-06-12	mar 26-06-12
117	**Detección y audio evacuación**	15 días	vie 15-06-12	vie 29-06-12
118	Canalización	5 días	vie 15-06-12	mar 19-06-12
119	Cableado	4 días	mar 19-06-12	vie 22-06-12
120	Instalación de detectores	5 días	sáb 23-06-12	mié 27-06-12
121	Conexión a central	1 día	jue 28-06-12	jue 28-06-12
122	Puesta en marcha	1 día	vie 29-06-12	vie 29-06-12
123	**Control de acceso**	9 días	vie 15-06-12	sáb 23-06-12
124	Canalización y cableado	3 días	vie 15-06-12	dom 17-06-12
125	Instalación de dispositivo Control.	2 días	lun 18-06-12	mar 19-06-12
126	Instalación de retenedores	1 día	mié 20-06-12	mié 20-06-12
127	Instalación de pulsadores	2 días	jue 21-06-12	vie 22-06-12
128	Prueba y puesta en marcha	1 día	sáb 23-06-12	sáb 23-06-12
129	**ARTEFACTOS SANITARIOS**	18 días	sáb 02-06-12	mar 19-06-12
130	Tubería y ductos alcantarillado	2 días	sáb 02-06-12	dom 03-06-12
131	Inst. cañerías agua potable	2 días	lun 04-06-12	mar 05-06-12
132	Prueba hidráulica	1 día	mié 06-06-12	mié 06-06-12
133	Inst. de artefactos	1 día	mar 19-06-12	mar 19-06-12
134	**LIMPIEZA DE OBRA**	4 días	vie 27-07-12	lun 30-07-12
135	Limpieza de Obra	4 días	vie 27-07-12	lun 30-07-12
136	**Otros**	1 día	dom 01-07-12	dom 01-07-12
137	Logo corpórreo en mdf lacado blanco	1 día	dom 01-07-12	dom 01-07-12
138	**ENTREGA DE OBRA**	1 día	mar 31-07-12	mar 31-07-12
139	Entrega final de obra	1 día	mar 31-07-12	mar 31-07-12

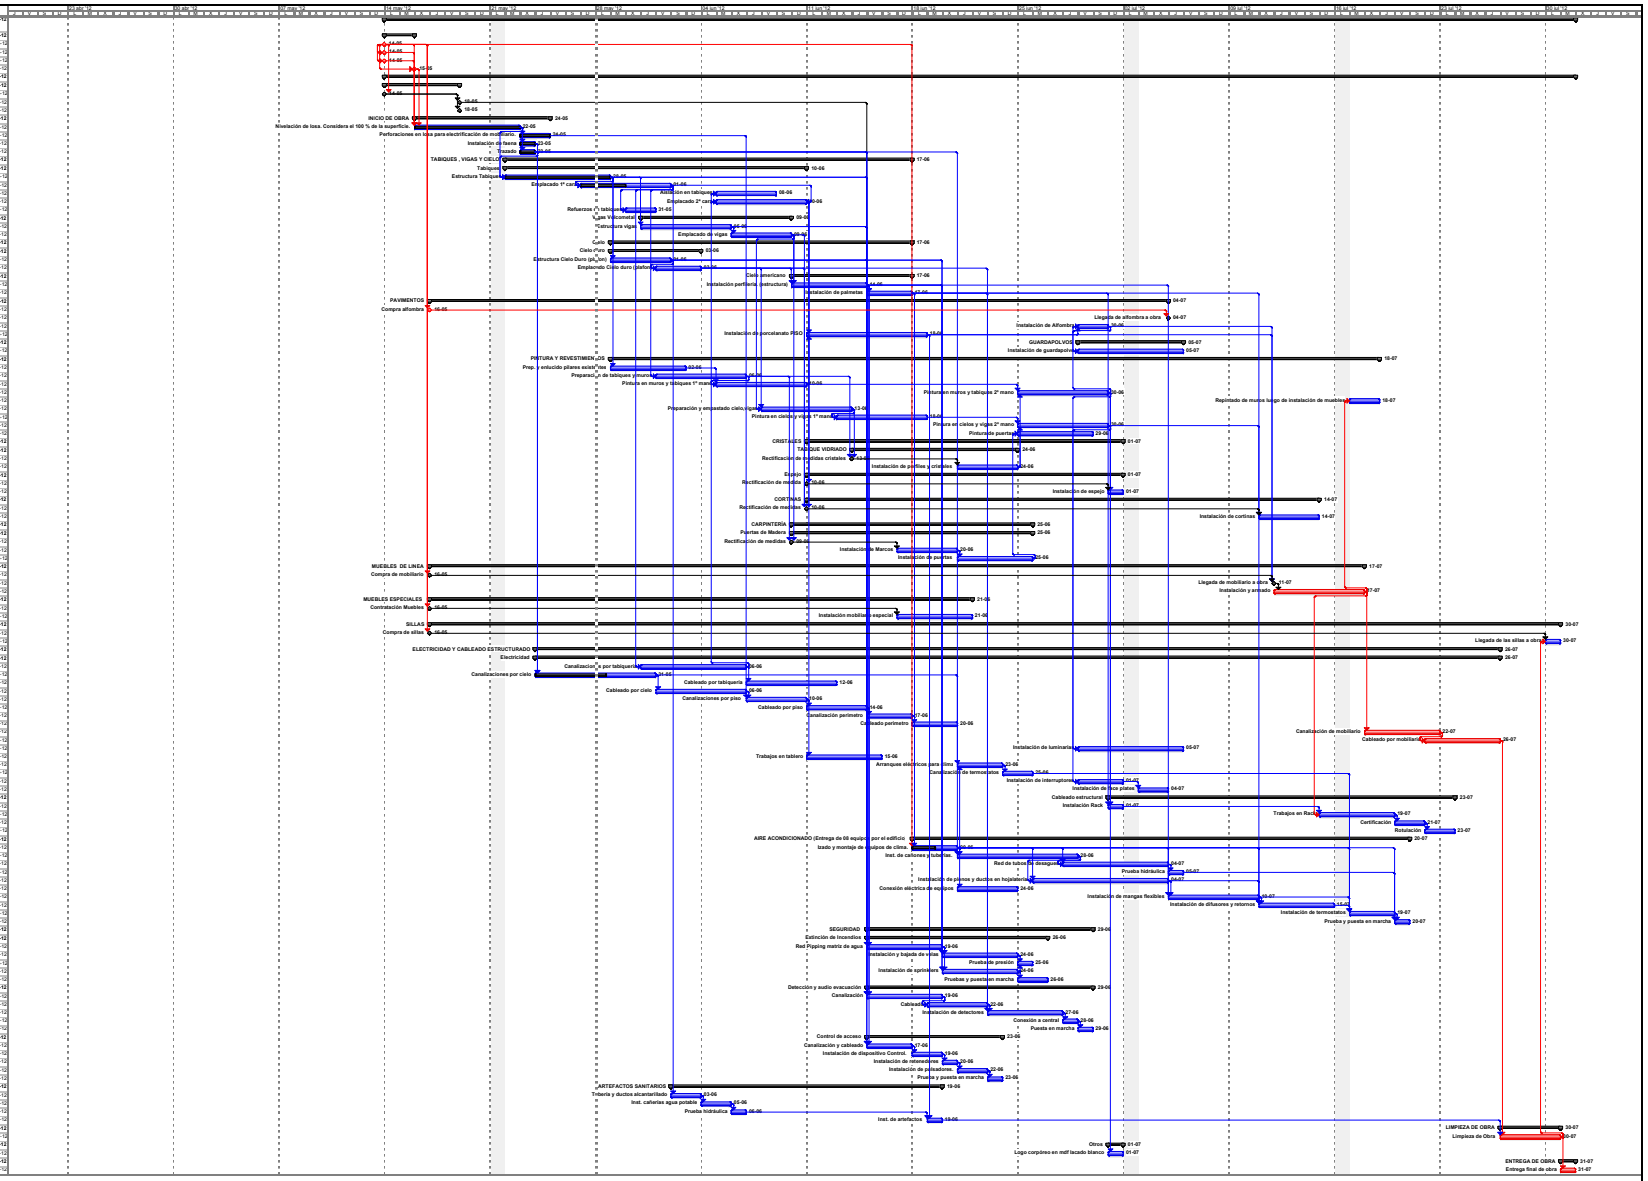

Proyecto: proyect mc donals
Fecha: lun 28-05-12

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por sinteses | Fecha límite
