Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**TEL 3**	**21 días**	**vie 29/06/12**	**sáb 21/07/12**
2		**Tabiques en placa de roca yeso**	**2 días**	**vie 29/06/12**	**sáb 30/06/12**
3		Levantamiento de estructura	2 días	vie 29/06/12	sáb 30/06/12
4		Emplacado y masillado	1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12
5		**Pintura general**	**17 días**	**mié 04/07/12**	**sáb 21/07/12**
6		Enduído sobre tabiques	1 día	mié 04/07/12	mié 04/07/12
7		Lijado de tabiques	2 días	jue 05/07/12	vie 06/07/12
8		Pintura interior tintometrico alba dulux	14 días	sáb 07/07/12	sáb 21/07/12
9		Pintura de zócalos	14 días	sáb 07/07/12	sáb 21/07/12
10		**Herreria**	**1 día**	**vie 06/07/12**	**vie 06/07/12**
11		Armado de refuerzos sobre cieloraso	1 día	vie 06/07/12	vie 06/07/12
12		**Cristales**	**1 día**	**sáb 14/07/12**	**sáb 14/07/12**
13		Perfileria perimetral	1 día	sáb 14/07/12	sáb 14/07/12
14		Colocacion de perfileria perimetral	1 día	sáb 14/07/12	sáb 14/07/12
15		Colocacion de vidrios	1 día	sáb 14/07/12	sáb 14/07/12
16		**Muebles especiales**	**14 días**	**sáb 07/07/12**	**sáb 21/07/12**
17		Muebles de guardado altos (primer sector)	1 día	sáb 07/07/12	sáb 07/07/12
18		Mueble de Copy Area	2 días	vie 13/07/12	sáb 14/07/12
19		Muebles de guardado altos (2do sector)	3 días	jue 19/07/12	sáb 21/07/12
20		**Muebles de Linea**	**15 días**	**vie 06/07/12**	**sáb 21/07/12**
21		Recepcion de muebles y Armado de los mismos (primer sectc	3 días	vie 06/07/12	dom 08/07/12
22		Terminacion de primer sector	2 días	vie 13/07/12	sáb 14/07/12
23		Recepcion de muebles y Armado de los mismos (segundo se	2 días	vie 20/07/12	sáb 21/07/12
24		**Limpieza de obra**	**21 días**	**vie 29/06/12**	**sáb 21/07/12**
25		Limpieza diaria	21 días	vie 29/06/12	sáb 21/07/12
26		Limpieza final	1 día	sáb 21/07/12	sáb 21/07/12

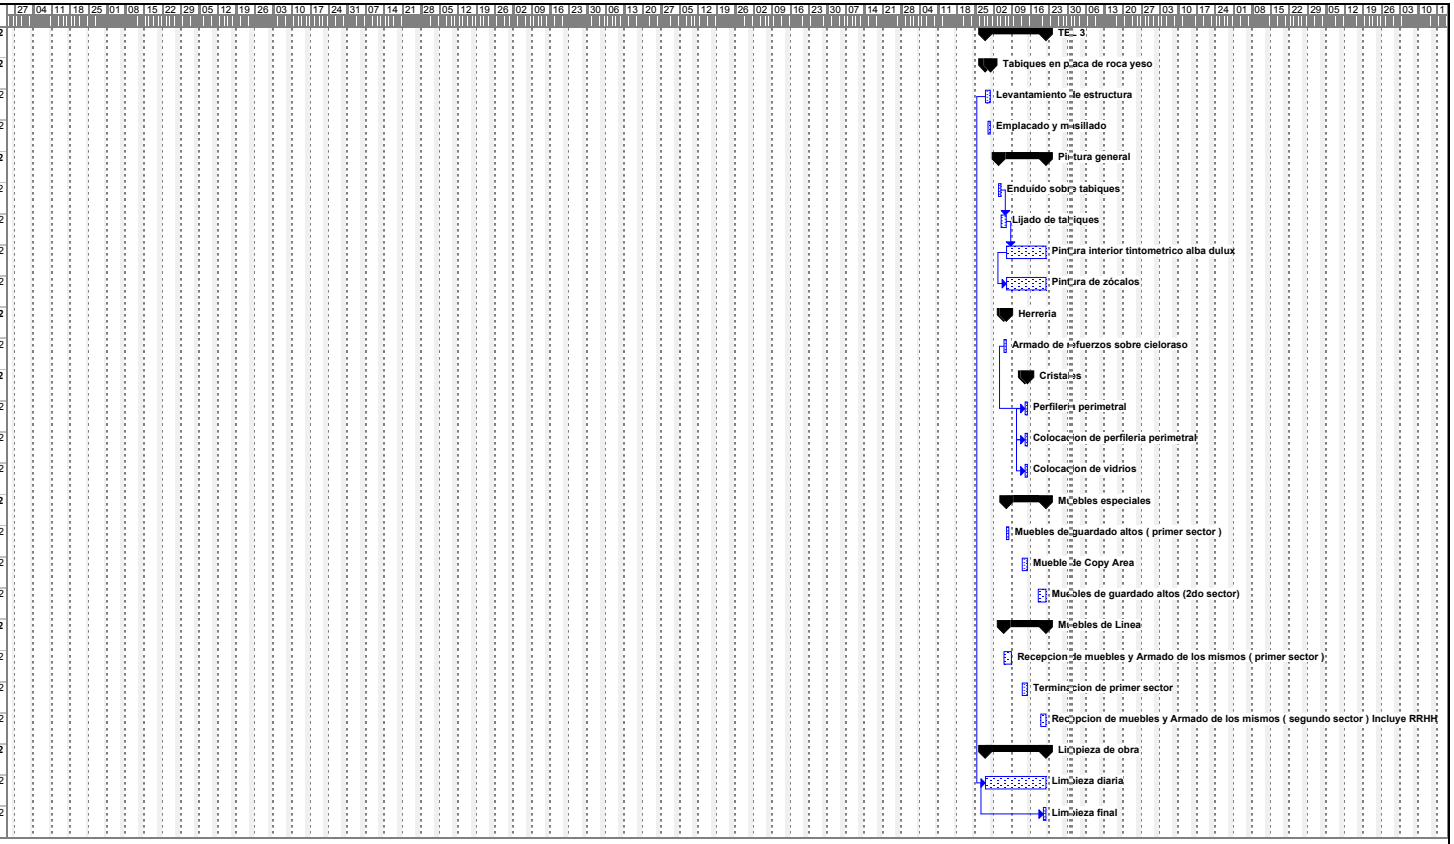

Proyecto: MSProj11
Fecha: mar 31/07/12

Tarea | División | Progreso | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite
