Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**SYNGENTA - OBRA SALA DE TELEPRESENCIA**	**24 días**	**lun 01/10/12**	**mié 24/10/12**
2	**TAREAS PRELIMINARES**	**7 días**	**lun 01/10/12**	**dom 07/10/12**
3	Recepción orden de compra	0 días	lun 01/10/12	lun 01/10/12
4	Preparación de seguros y entrega a edificio	7 días	lun 01/10/12	dom 07/10/12
5	**DEMOLICIÓN**	**5 días**	**lun 08/10/12**	**vie 12/10/12**
6	Desarme de mobiliario existente	5 días	lun 08/10/12	vie 12/10/12
7	Retiro de carpintería modular y puerta	5 días	lun 08/10/12	vie 12/10/12
8	Retiro de alfombra	5 días	lun 08/10/12	vie 12/10/12
9	**TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO**	**3 días**	**sáb 13/10/12**	**lun 15/10/12**
10	Armado de estructura, emplacado y masillado (incluye barrier y lana de vidrio)	2 días	sáb 13/10/12	dom 14/10/12
11	Sobretabique y colocación de trampa para ruido	1 día	lun 15/10/12	lun 15/10/12
12	**CIELORRASO MODULAR**	**3 días**	**sáb 13/10/12**	**lun 15/10/12**
13	Reemplazo y reacomodamiento de placas	3 días	sáb 13/10/12	lun 15/10/12
14	**PISOS ALFOMBRADOS**	**2 días**	**jue 18/10/12**	**vie 19/10/12**
15	Instalación de alfombra contra nuevos tabiques	2 días	jue 18/10/12	vie 19/10/12
16	**PISOS TÉCNICOS**	**3 días**	**sáb 13/10/12**	**lun 15/10/12**
17	Corte, calado, perforaciones y recolocación	3 días	sáb 13/10/12	lun 15/10/12
18	**ZÓCALOS Y GUARDASILLAS**	**1 día**	**lun 15/10/12**	**lun 15/10/12**
19	Colocación de zócalos MDF para pintar	1 día	lun 15/10/12	lun 15/10/12
20	**PINTURA**	**5 días**	**mar 16/10/12**	**sáb 20/10/12**
21	Enduido y Lijado de muros y tabiques	2 días	mar 16/10/12	mié 17/10/12
22	Preparación y pintado de muros y tabiques	3 días	jue 18/10/12	sáb 20/10/12
23	**CARPINTERÍAS DE MADERA Y HERRAJES**	**3 días**	**dom 21/10/12**	**mar 23/10/12**
24	Colocación de puerta	3 días	dom 21/10/12	mar 23/10/12
25	**INSTALACIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIO**	**7 días**	**lun 01/10/12**	**dom 07/10/12**
26	Corrimiento de sprinklers y/o rociadores existentes	7 días	lun 01/10/12	dom 07/10/12
27	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**11 días**	**sáb 13/10/12**	**mar 23/10/12**
28	Desarme, descableado y reubicación	11 días	sáb 13/10/12	mar 23/10/12
29	**INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO**	**11 días**	**sáb 13/10/12**	**mar 23/10/12**
30	Reubicación bocas de red existentes	11 días	sáb 13/10/12	mar 23/10/12
31	**INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN**	**5 días**	**sáb 13/10/12**	**mié 17/10/12**
32	Difusores Omni y conducto flexible	5 días	sáb 13/10/12	mié 17/10/12
33	**LIMPIEZA DE OBRA**	**5 días**	**sáb 20/10/12**	**mié 24/10/12**
34	Limpieza final de obra	5 días	sáb 20/10/12	mié 24/10/12
35	**CORTINAS DE ENROLLAR**	**1 día**	**mié 24/10/12**	**mié 24/10/12**
36	Ajuste de cortinas	1 día	mié 24/10/12	mié 24/10/12

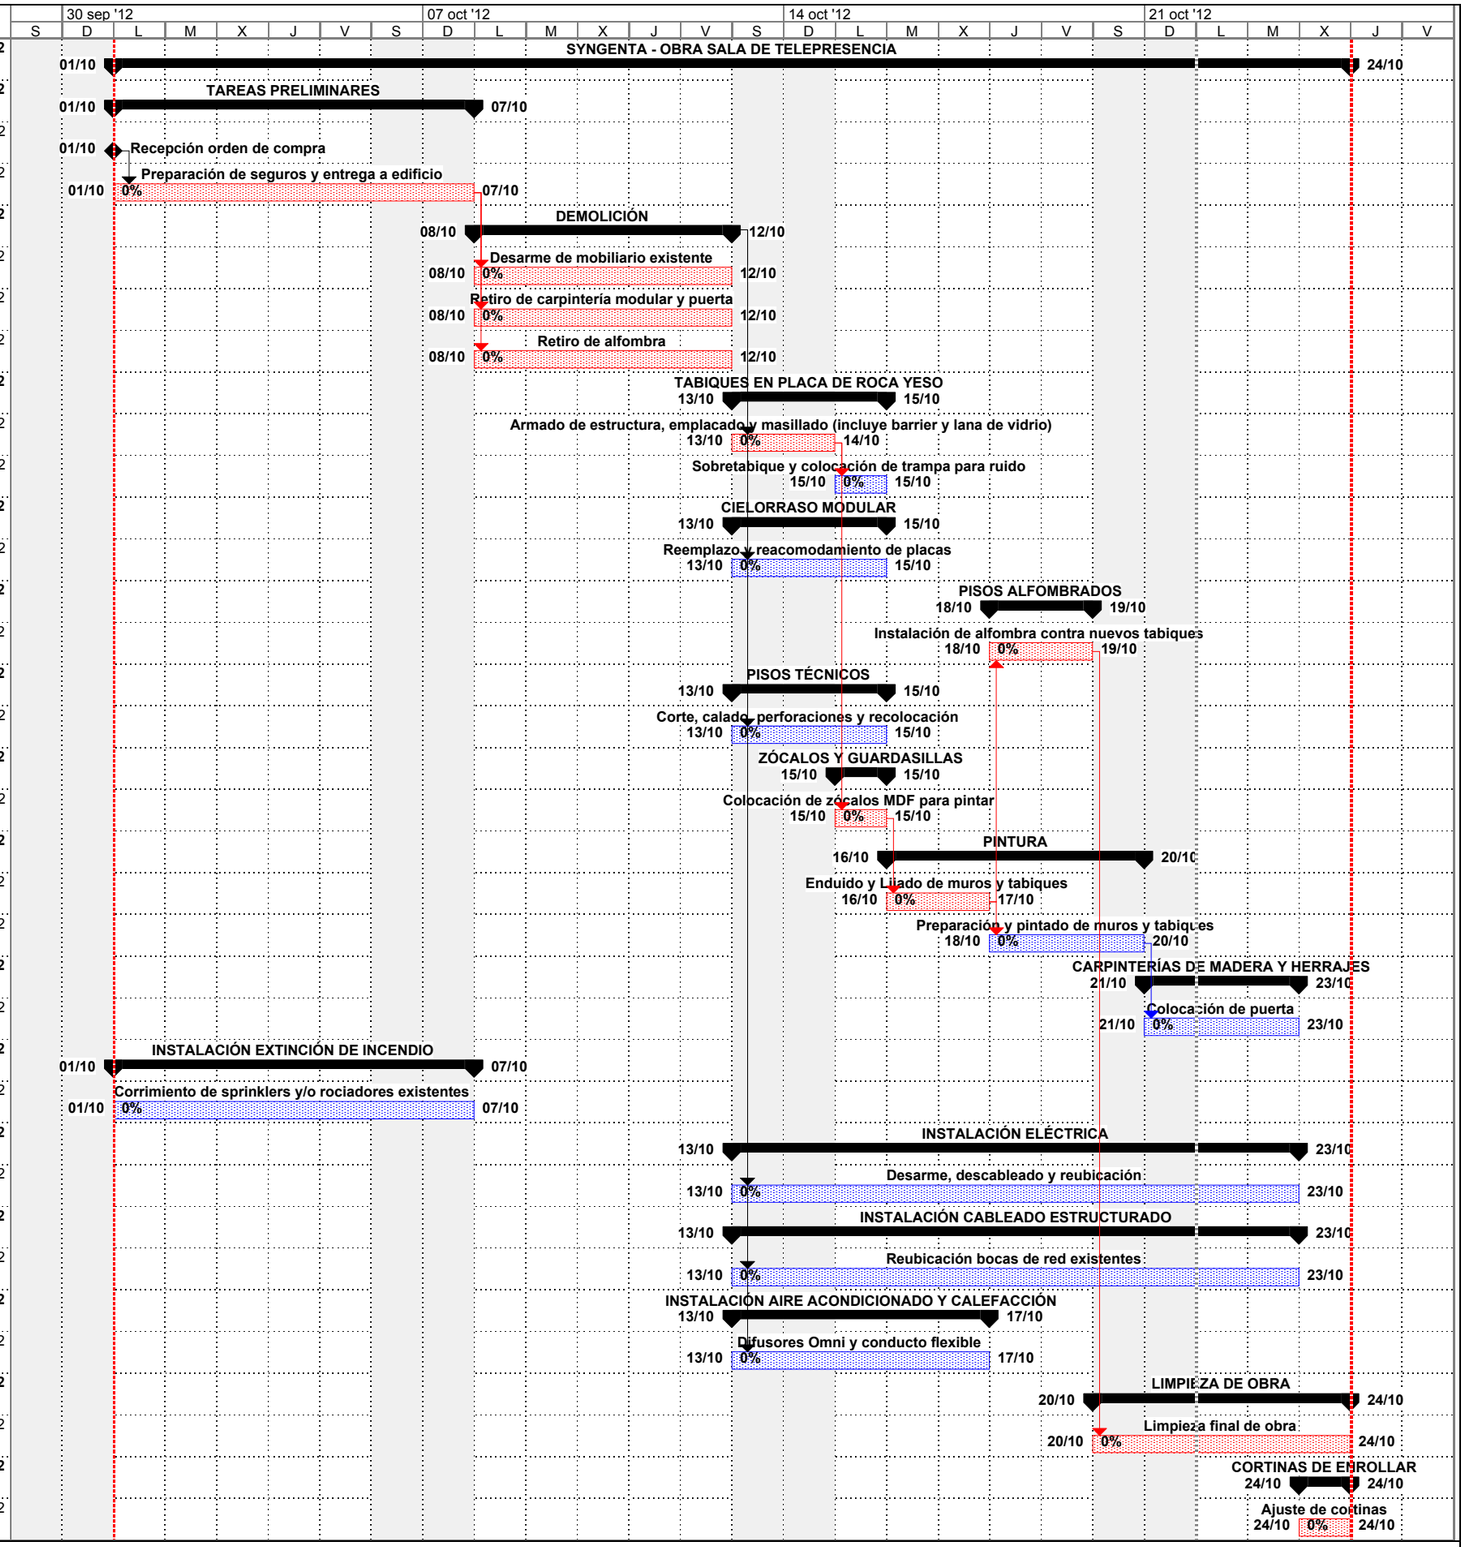

Proyecto: VISA I - PISO 3
Fecha: lun 22/10/12

Tarea		Hito		Tarea crítica resumida		División		Agrupar por síntesis	
Tarea crítica		Resumen		Hito resumido		Tareas externas		Fecha límite	
Progreso		Tarea resumida		Progreso resumido		Resumen del proyecto			
