PSI CRO - Proyect Final

Id	Nombres de los recursos	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ADMINISTRACIÓN DE OBRA**	**25 días**	**vie 16/11/12**	**vie 21/12/12**
2		Firma Acta Acuerdo	0 días	vie 16/11/12	vie 16/11/12
3	Contract	Gestión Documentación de Seg e Higiene	5 días	vie 16/11/12	jue 22/11/12
4	Contract	Comienzo de obra	0 días	jue 22/11/12	jue 22/11/12
5	Contract	Tiempos de Obra acordados (35 días Corridos)	20 días	vie 23/11/12	vie 21/12/12
6					
7		**PRELIMINARES**	**11 días**	**vie 23/11/12**	**lun 10/12/12**
8	PSI-CRO	Retiro de Utiles	0 días	vie 23/11/12	vie 23/11/12
9	PSI-CRO	Desarme de Mobiliario y acopio en sector a designar	1 día	vie 23/11/12	vie 23/11/12
10	Contract	Desarme , corte y desconexión eléctrica de Muebles curvos (coffe	1 día	mar 27/11/12	mar 27/11/12
11	Electricista	Retiro de Periscopios en sector nuevo Tabique divisorio de Oficina	1 día	mié 28/11/12	mié 28/11/12
12	Consorcio	Protecciones	0 días	mié 28/11/12	mié 28/11/12
13	Consorcio	Armado de andamios	1 día	jue 29/11/12	jue 29/11/12
14	Consorcio	Descolocación de 2 cortinas	1 día	vie 30/11/12	vie 30/11/12
15	Baukasten	Retiro de las oficinas de 2 Cortinas a cortar en taller	1 día	lun 03/12/12	lun 03/12/12
16	Consorcio	Tabique divisorio de oficinas	5 días	mar 04/12/12	lun 10/12/12
17					
18		**PUERTA DE INGRESO**	**9 días**	**vie 30/11/12**	**mié 12/12/12**
19	Consorcio	Entrega de Puerta de ingreso	1 día	vie 30/11/12	vie 30/11/12
20	Herrero	Herrería en Puerta Acceso	1 día	lun 03/12/12	lun 03/12/12
21	Vidriero	Retiro de Vidrio p/coloc de Puerta Hall de Asc	1 día	lun 03/12/12	lun 03/12/12
22	Vidriero	Instalar Puerta con Caja freno y vidrio Ingreso a Oficinas	1 día	lun 03/12/12	lun 03/12/12
23		Medición y Fabricación de Cristales nuevos	5 días	mar 04/12/12	lun 10/12/12
24		Montaje de Nueva puerta y paño Fijo	2 días	mar 11/12/12	mié 12/12/12
25					
26					
27		**DEMOLICIÓN**	**9 días**	**jue 29/11/12**	**mar 11/12/12**
28	Obra Civil	Descolocación de alfombras	1 día	jue 29/11/12	jue 29/11/12
29	Contract Serv	Protecciones (nylon y cartones)	1 día	vie 30/11/12	vie 30/11/12
30	Obra Civil	Alquiler y armado de andamios	1 día	lun 03/12/12	lun 03/12/12
31	Obra Civil	Desmonte de Durlock	2 días	mar 04/12/12	mié 05/12/12
32	Electricista	Picado de canalizaciones	3 días	jue 06/12/12	lun 10/12/12
33	Obra Civil	Alquiler y carga de volquetes	1 día	mar 11/12/12	mar 11/12/12
34					
35		**ALBAÑILERÍA**	**3 días**	**mié 12/12/12**	**vie 14/12/12**
36	Obra Civil	Reparación de carpetas por retiro de Alfombra	1 día	mié 12/12/12	mié 12/12/12
37	Obra Civil	Tapado de canalizaciones	2 días	jue 13/12/12	vie 14/12/12
38					
39					
40		**DURLOCK**	**4 días**	**jue 06/12/12**	**mar 11/12/12**
41	Durlock	Nuevos Tabiques y Ajustes (estructura y 1 cara)	1 día	jue 06/12/12	jue 06/12/12
42		Emplaque 2da Cara, cinta y masilla	1 día	vie 07/12/12	vie 07/12/12
43		Cajón de Durlock en conducto de A°A°	1 día	mar 11/12/12	mar 11/12/12
44					
45		**HERRERÍA**	**21 días**	**vie 16/11/12**	**lun 17/12/12**
46		Cálculo estructural	10 días	vie 16/11/12	vie 30/11/12
47	Herrero	Escalera Fabricación	8 días	lun 03/12/12	mié 12/12/12
48	Herrero	Escalera Montaje	3 días	jue 13/12/12	lun 17/12/12
49					
50		**CRISTALES**	**8 días**	**jue 22/11/12**	**mié 05/12/12**
51	Vidriero	Medición de vidrios	0 días	jue 22/11/12	jue 22/11/12
52	Vidriero	Fabricación de cristales	5 días	vie 23/11/12	vie 30/11/12
53	Vidriero	Retiro de Frentes vidriados a reutilizar	1 día	lun 03/12/12	lun 03/12/12
54	Vidriero	Colocación de vidrios a reubicar y nuevos	2 días	mar 04/12/12	mié 05/12/12
55					
56					
57		**INST. ELECTRICA**	**18 días**	**vie 23/11/12**	**mié 19/12/12**
58	Electricista	Desvincular Puestos existentes y retiro de Periscopios	2 días	vie 23/11/12	mar 27/11/12
59	Electricista	Picado y tendido de canalizaciones por piso	5 días	vie 30/11/12	jue 06/12/12
60	Electricista	Canalizaciones por tabiques	1 día	vie 07/12/12	vie 07/12/12
61	Electricista	Cableados	2 días	lun 10/12/12	mar 11/12/12
62	Electricista	Descolocación , Limpieza y Reubicación de Artef Ilum	4 días	mié 12/12/12	lun 17/12/12
63	Electricista	Adecuación de Tableros	2 días	mar 18/12/12	mié 19/12/12
64					
65		**INST. CABLEADO ESTRUCTURADO**	**5 días**	**mié 28/11/12**	**mar 04/12/12**
66	Electricista	Reubicación de bocas de red	2 días	mié 28/11/12	jue 29/11/12
67	Electricista	Tendido de Nuevas bocas	1 día	vie 30/11/12	vie 30/11/12
68	Electricista	Readecuación de Rack existente	2 días	lun 03/12/12	mar 04/12/12
69					
70		**INST CONTROL DE ACCESO**	**1 día**	**jue 20/12/12**	**jue 20/12/12**
71	Electricista	Desarme y recolocación de Control de acceso	1 día	jue 20/12/12	jue 20/12/12
72					
73		**INST AIRE ACONDICIONADO**	**1 día**	**lun 10/12/12**	**lun 10/12/12**
74	A°A°	Adecuación de Conductos a nuevo Layout	1 día	lun 10/12/12	lun 10/12/12
75					
76		**GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**mar 18/12/12**	**mar 18/12/12**
77	Gráfica	Retiro de Logo existente y reubicación	1 día	mar 18/12/12	mar 18/12/12
78					
79		**ALFOMBRA**	**20 días**	**vie 16/11/12**	**vie 14/12/12**
80	Contract	Compra de alfombra	2 días	vie 16/11/12	lun 19/11/12
81	Alfombra	Fabricación	10 días	mar 20/11/12	mar 04/12/12
82	Alfombra	Entrega	0 días	mié 12/12/12	mié 12/12/12
83	Alfombra	Colocación	2 días	jue 13/12/12	vie 14/12/12
84					
85		**ZÓCALOS**	**2 días**	**lun 10/12/12**	**mar 11/12/12**
86	Carpintero	Provisión y colocación de Zócalos	2 días	lun 10/12/12	mar 11/12/12
87					
88		**PINTURA**	**9 días**	**mar 11/12/12**	**vie 21/12/12**
89	Pintor	Preparación y pintura de Tabique divisorio	2 días	mar 11/12/12	mié 12/12/12
90	Pintor	Preparación y pintura de Nuevos tabiques	2 días	jue 13/12/12	vie 14/12/12
91	Pintor	Pintura de Zócalos	1 día	lun 17/12/12	lun 17/12/12
92	Pintor	Pintura de escalera	2 días	mar 18/12/12	mié 19/12/12
93	Pintor	Pintura de Puertas y marcos	2 días	jue 20/12/12	vie 21/12/12
94					
95		**CARPINTERÍA DE MADERA Y HERRAJES**	**7 días**	**jue 06/12/12**	**vie 14/12/12**
96	Carpintero	Retiro de Puertas	1 día	jue 06/12/12	jue 06/12/12
97	Carpintero	Acopio de Puertas en desuso	1 día	vie 07/12/12	vie 07/12/12
98	Carpintero	Recolocación c/ readecuación de Herrajes	3 días	lun 10/12/12	mié 12/12/12
99	Carpintero	Colocación Topes de puerta	1 día	jue 13/12/12	jue 13/12/12
100	Carpintero	Corte de mesas de Coffee y colocación	1 día	vie 14/12/12	vie 14/12/12
101					
102		**MOBILIARIO**	**4 días**	**lun 17/12/12**	**jue 20/12/12**
103	PSI-CRO	Armado de Puestos de trabajo	3 días	lun 17/12/12	mié 19/12/12
104	PSI-CRO	Armado de mesas de Salas de Reuniones	1 día	jue 20/12/12	jue 20/12/12
105					
106		**CORTINAS**	**1 día**	**lun 17/12/12**	**lun 17/12/12**
107	Cortinero	Entrega y reinstalación de 2 Cortinas	1 día	lun 17/12/12	lun 17/12/12
108					
109					
110		**PENDIENTES Y CAMBIO DE COLORES**	**8 días**	**mié 26/12/12**	**mar 08/01/13**
111	Varios	Pendientes y nuevos trabajos por cambio de pintura	8 días	mié 26/12/12	mar 08/01/13
112					
113		**LIMPIEZA DE OBRA**	**28 días**	**vie 23/11/12**	**mar 08/01/13**
114	Limpieza	Periódica	28 días	vie 23/11/12	mar 08/01/13
115	Limpieza	Final	5 días	mié 19/12/12	mar 08/01/13

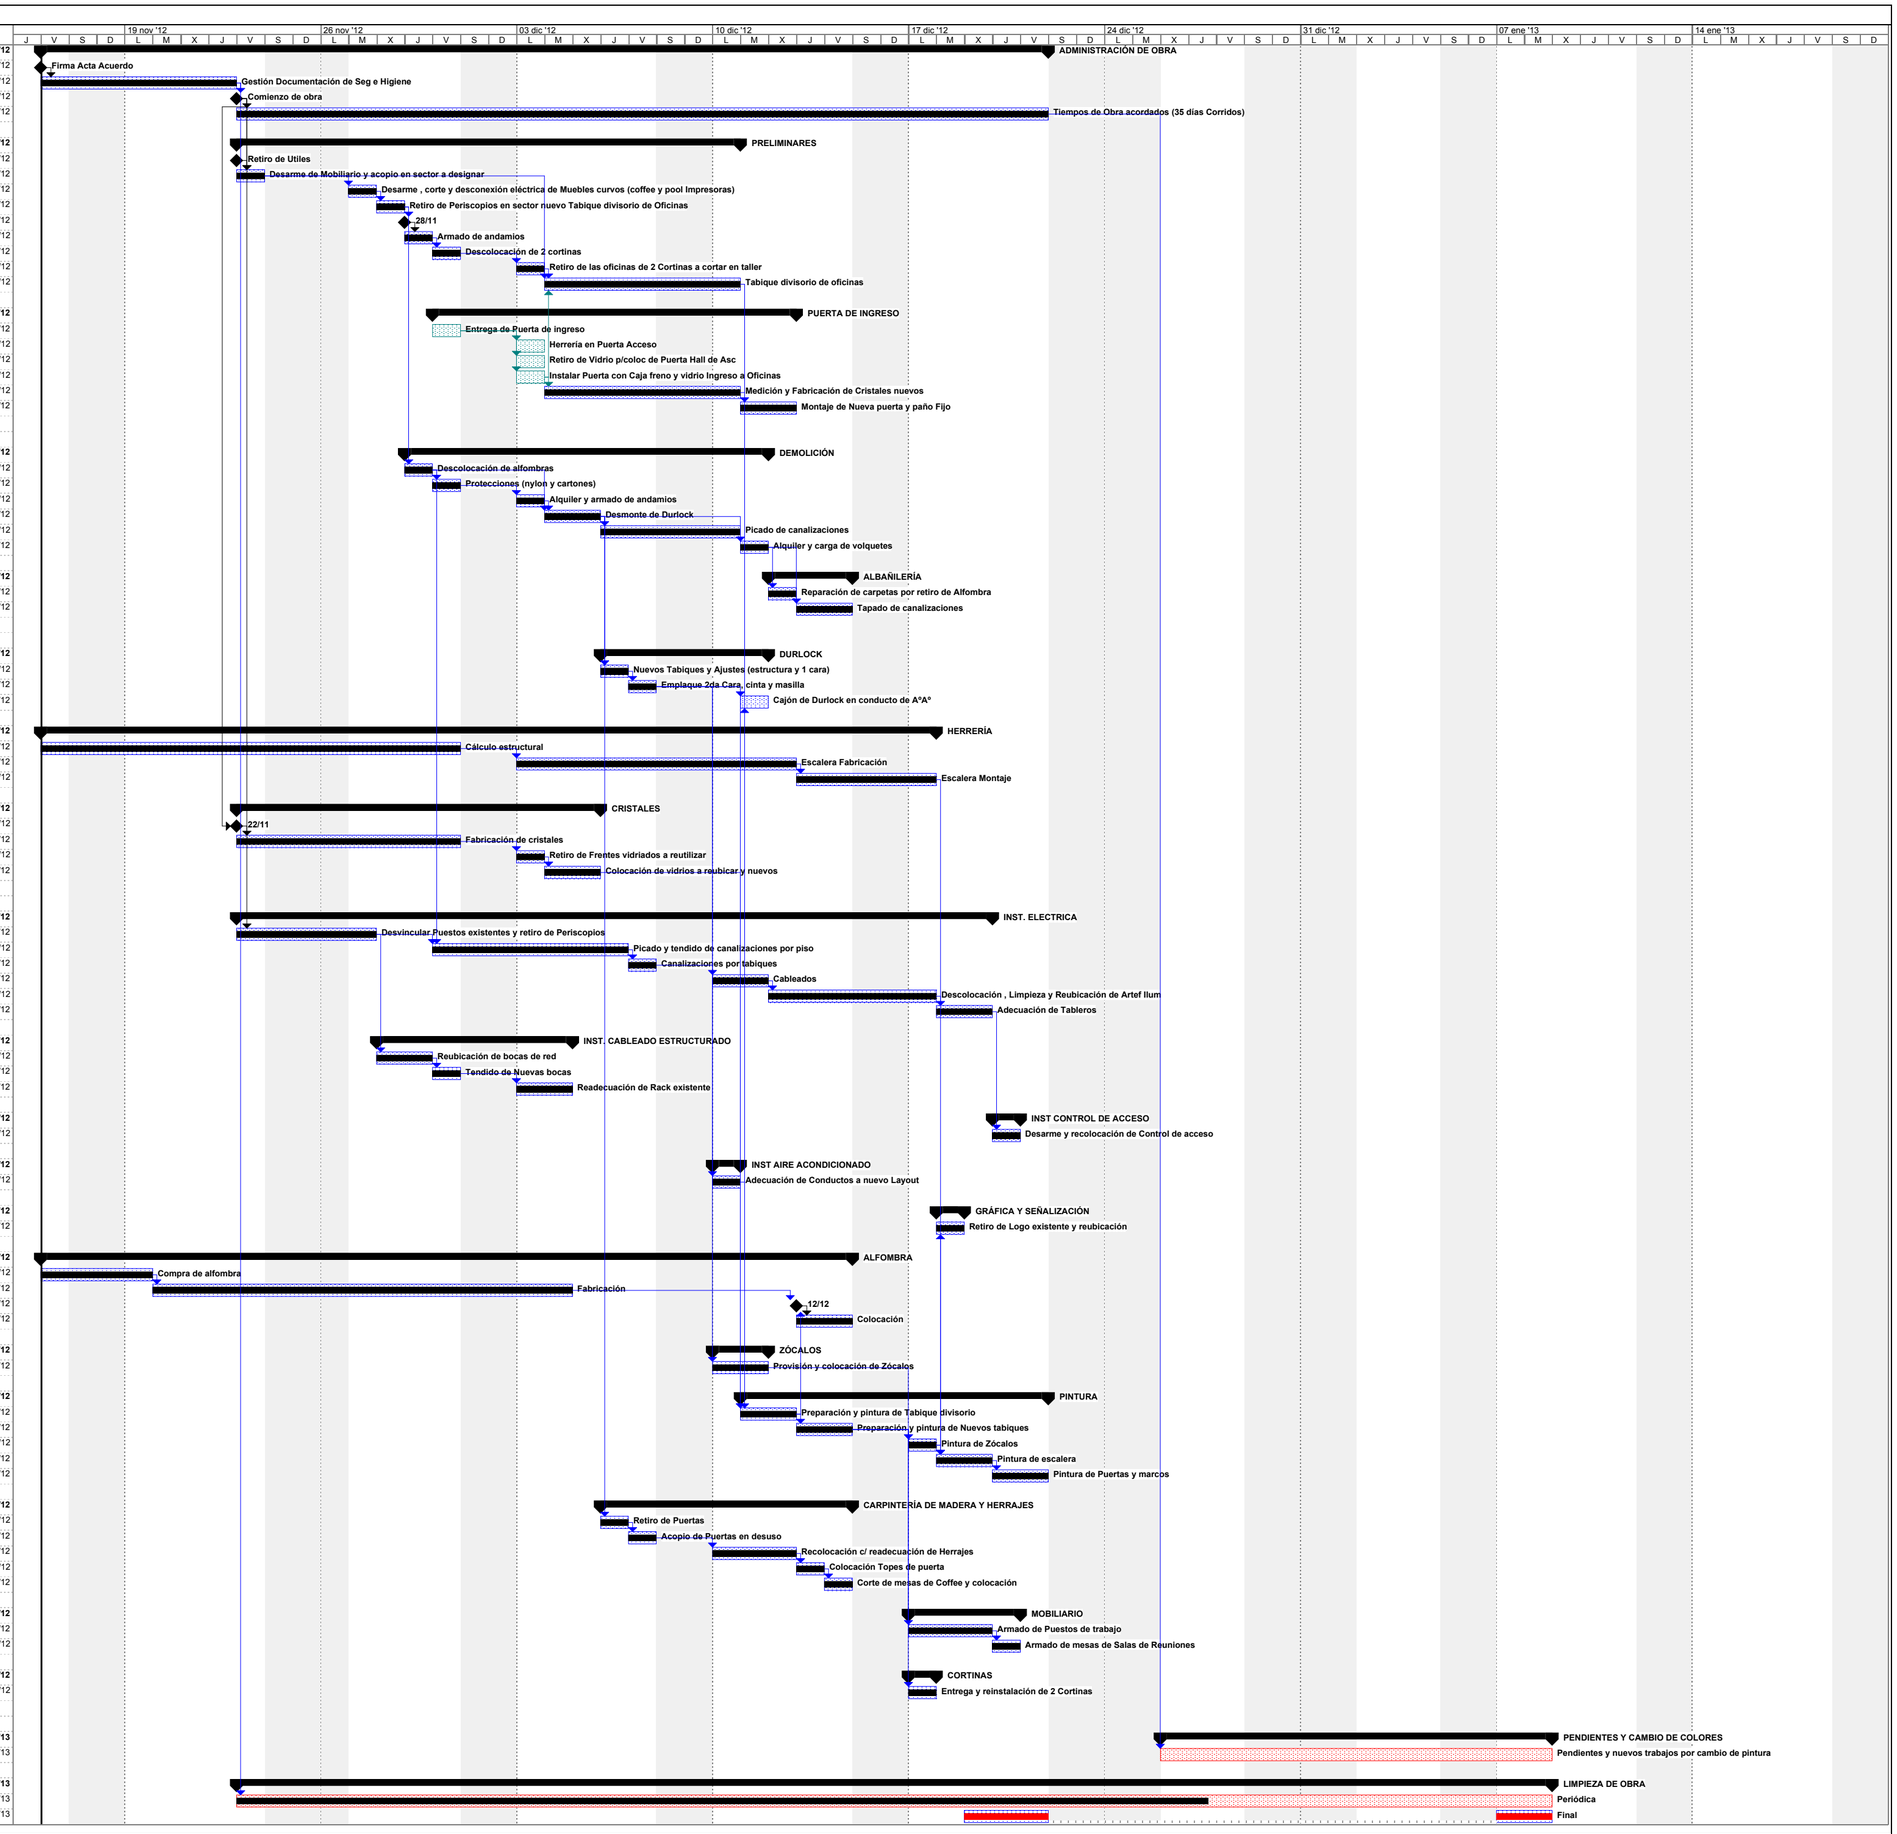

Project Final

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite
