ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**OBRA ETAPA 1**	37 días	lun 14-01-13	mar 05-03-13
2	**REQUISITOS INGRESO A OBRA**	4 días	lun 14-01-13	lun 14-01-13
3	Entrega de plan 1/3 planta para 4	0 días	lun 14-01-13	lun 14-01-13
4	Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio.	4 días	lun 14-01-13	lun 14-01-13
5	**OBRA NOVO NORDISK PISO 8º ETAPA 1 Plazo en días hábiles.**	37 días	lun 14-01-13	mar 05-03-13
6	**INICIO DE OBRA**	37 días	mié 09-03-13	mié 09-03-13
7	**PROYECTOS**	10 días	lun 14-01-13	vie 25-01-13
8	Entrega de proyectos de especialidades	0 días	lun 14-01-13	lun 14-01-13
9	Entrega de proyectos de seguridad	0 días	jue 24-01-13	jue 24-01-13
10	Entrega de proyectos de estructuras y cableado estructurado	0 días	jue 24-01-13	jue 24-01-13
11	**TRABAJOS PRELIMINARES**	5 días	lun 14-01-13	vie 18-01-13
12	Inst. de tablero elect. Provi.	1 día	lun 14-01-13	lun 14-01-13
13	Inst. de suministro provisorio	1 día	lun 14-01-13	mar 15-01-13
14	Inst. de faenas	2 días	lun 14-01-13	mié 16-01-13
15	Cerco perim. de tablero de madera existente	1 día	mié 16-01-13	jue 17-01-13
16	Levantamiento de especialidades seguridad y clima	1 día	mié 16-01-13	mié 16-01-13
17	Entrega de levantamiento de seguridad y clima	0 días	vie 18-01-13	vie 18-01-13
18	**DEMOLICIÓN Nº1 1/3 PLANTA INICIAL**	4 días	mar 19-01-13	mar 22-01-13
19	Desmontaje de artefactos sanitarios	1 día	mié 16-01-13	mié 16-01-13
20	Desmontaje de cielos y tabiques	1 día	mié 16-01-13	mié 16-01-13
21	Desmontaje de cielos a tabique	1 día	mié 16-01-13	mié 16-01-13
22	Levantar de piso en madera en sugeos existente	2 días	mié 16-01-13	vie 18-01-13
23	Desarme de inst. eléctrica actual	3 días	vie 18-01-13	lun 21-01-13
24	Desarme de inst. de seguridad actual	2 días	vie 18-01-13	lun 21-01-13
25	Desarme de inst. de clima actual	2 días	vie 18-01-13	lun 21-01-13
26	Tabique	1 día	mié 20-01-13	mié 20-01-13
27	**VANDEKEN**	7 días	lun 21-01-13	mar 29-01-13
28	LADRIL TABIQUE (SOLICITO A APROB. TRAZADO)	2 días	mié 23-01-13	jue 24-01-13
29	Empalmado 1º cara y aislación	2 días	lun 21-01-13	mié 23-01-13
30	Empalmado 2º cara	2 días	mié 23-01-13	vie 25-01-13
31	Instalaciones de apoyo	3 días	vie 25-01-13	mar 29-01-13
32	**CIELO, VIGA Y CUBIERTA**	19 días	jue 17-01-13	jue 07-02-13
33	**CIELO SUR**	12 días	jue 17-01-13	vie 01-02-13
34	Estructura Cielo Duro y cenefas	4 días	vie 18-01-13	mié 23-01-13
35	Empalmado Cielo duro y cenefas	2 días	vie 25-01-13	lun 27-01-13
36	**Cielo americano**	2 días	mié 06-02-13	jue 07-02-13
37	Instalación de perfiles (estructura)	2 días	mié 06-02-13	jue 07-02-13
38	Instalación de palmetas	2 días	mié 06-02-13	jue 07-02-13
39	**Viga Volcanela**	2 días	jue 17-01-13	vie 25-01-13
40	Estructura rigida	2 días	jue 17-01-13	vie 18-01-13
41	Empalmado de vigas	2 días	mié 23-01-13	vie 25-01-13
42	**TABIQUERIA DE VIDRIO**	12 días	lun 21-01-13	mié 06-02-13
43	Rectificación de medidas nuevas	2 días	lun 21-01-13	mié 23-01-13
44	Instalación de perfiles, cristales nuevos y existentes (modificados)	2 días	lun 28-01-13	mié 30-01-13
45	**PAVIMENTOS**	5 días	lun 21-01-13	vie 25-01-13
46	Instalación de piso de madera reutilizado	3 días	lun 21-01-13	mié 23-01-13
47	Instalación de porcelanatos PISO	2 días	mié 23-01-13	vie 25-01-13
48	**GUARDARROPA**	2 días	vie 18-01-13	lun 21-01-13
49	Instalación de guardapolvos	2 días	vie 18-01-13	lun 21-01-13
50	**PUERTAS**	22 días	lun 18-03-13	mié 17-04-13
51	**P. Madera**	22 días	lun 18-03-13	mié 17-04-13
52	Rectificación de medidas	3 días	lun 18-03-13	mié 20-03-13
53	Instalación de Marcos	2 días	mié 03-04-13	vie 05-04-13
54	Instalación de puertas	2 días	mié 03-04-13	vie 05-04-13
55	**P. de cristal**	2 días	lun 15-04-13	lun 15-04-13
56	Reubicación de puertas de cristal existente	2 días	vie 12-04-13	lun 15-04-13
57	**PINTURA**	27 días	mié 13-03-13	mié 17-04-13
58	Preparación de tabiques y muros	4 días	mié 13-03-13	lun 18-03-13
59	Pintura en muros y tabiques 1º mano	2 días	mié 20-03-13	vie 22-03-13
60	Pintura en muros y tabiques 2º mano	2 días	mié 27-03-13	jue 28-03-13
61	Preparación y empastado de vigas	2 días	lun 18-03-13	mié 20-03-13
62	Preparación y empastado cielo	2 días	mié 20-03-13	vie 22-03-13
63	Pintura en cielos 1º mano	2 días	lun 25-03-13	mié 27-03-13
64	Pintura en cielos 2º mano	2 días	mié 27-03-13	vie 29-03-13
65	Barniz puertas	2 días	mié 03-04-13	jue 04-04-13
66	**INSTALACIÓN SANITARIA**	3 días	jue 17-01-13	mié 23-01-13
67	Tubería y ductos alcantarillado	2 días	jue 17-01-13	lun 21-01-13
68	Inst. cañerías agua potable	2 días	jue 17-01-13	lun 21-01-13
69	Inst. de grifería	2 días	mié 23-01-13	jue 24-01-13
70	Inst. de artefactos	2 días	mié 23-01-13	jue 24-01-13
71	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	28 días	lun 28-01-13	lun 04-03-13
72	**ANDEN/SIDE 2 (MM)**	28 días	lun 28-01-13	lun 04-03-13
73	Canalizaciones por tabiquería	3 días	vie 25-01-13	mié 30-01-13
74	Canalizaciones por cielo	3 días	vie 25-01-13	mié 30-01-13
75	Cableado por tabiquería	2 días	jue 31-01-13	vie 01-02-13
76	Cableado por cielo	2 días	jue 31-01-13	vie 01-02-13
77	Canalizaciones por piso	2 días	jue 31-01-13	vie 01-02-13
78	Cableado por piso	2 días	mié 06-02-13	jue 07-02-13
79	Canalización perimetral	2 días	vie 08-02-13	mié 13-02-13
80	Cableado perimetral	2 días	vie 08-02-13	mié 13-02-13
81	Canalización por modulares	2 días	mié 13-02-13	jue 14-02-13
82	Cableado por modulares	2 días	mié 13-02-13	jue 14-02-13
83	Instalación de luminarias	2 días	lun 18-02-13	mié 20-02-13
84	Trabajos en tablero	2 días	mié 20-02-13	jue 21-02-13
85	Arranques eléctricos para clima	2 días	jue 21-02-13	vie 22-02-13
86	Instalación de sensores	2 días	lun 25-02-13	mié 27-02-13
87	Instalación de interruptores	2 días	lun 25-02-13	mié 27-02-13
88	Instalación de tiras pilotos	2 días	lun 25-02-13	mié 27-02-13
89	Trabajos en Rack	2 días	mié 27-02-13	vie 01-03-13
90	Certificación	2 días	vie 01-03-13	lun 04-03-13
91	Rotulación	2 días	vie 01-03-13	lun 04-03-13
92	**CLIMA**	17 días	lun 28-01-13	mié 13-02-13
93	Revisión y mantención de equipos de clima existentes	2 días	lun 28-01-13	mié 30-01-13
94	Reubicación, baja y montaje de equipos de clima	2 días	lun 28-01-13	mié 30-01-13
95	Inst. de cañerías y tuberías. (Reubicación e instalación de nuevos tramos)	2 días	mié 30-01-13	jue 31-01-13
96	Inst. de ductos y difusores	2 días	mié 30-01-13	jue 31-01-13
97	Pruebas hidraulicas	1 día	vie 01-02-13	vie 01-02-13
98	Instalación de plenos y ductos en hojalatería	2 días	mié 20-02-13	vie 22-02-13
99	Conexión electrica de equipos	2 días	vie 25-02-13	lun 25-02-13
100	Instalación de mangas flexibles	2 días	lun 04-03-13	lun 11-03-13
101	Instalación de difusores y rejillas	2 días	lun 04-03-13	lun 11-03-13
102	Pruebas y puesta en marcha	1 día	mié 06-03-13	mié 06-03-13
103	**SEGURIDAD**	15 días	lun 18-03-13	jue 11-04-13
104	**Detectores**	15 días	lun 18-03-13	jue 11-04-13
105	Canalización	3 días	lun 18-03-13	mié 20-03-13
106	Cableado	1 día	mar 26-03-13	mar 26-03-13
107	Instalación de detectores	2 días	mié 27-03-13	jue 28-03-13
108	Conexión a central	1 día	vie 29-03-13	vie 29-03-13
109	Puesta en marcha	1 día	vie 10-04-13	vie 10-04-13
110	**Extinción**	15 días	vie 29-03-13	jue 18-04-13
111	Red Pipping matriz de agua	3 días	vie 29-03-13	mié 29-03-13
112	Instalación de gabinetes de vidrio	2 días	jue 04-04-13	vie 05-04-13
113	Prueba de presión	1 día	mié 10-04-13	mié 10-04-13
114	Instalación de aplicadores	1 día	mié 10-04-13	mié 10-04-13
115	Pruebas y puesta en marcha	1 día	jue 18-04-13	jue 18-04-13
116	**CORTINAS**	20 días	lun 21-01-13	vie 15-02-13
117	Rectificación de cortinas existentes	2 días	lun 21-01-13	mié 23-01-13
118	Adquisición de cortinas existentes	1 día	vie 15-02-13	vie 15-02-13
119	**MOBILIARIO ESPECIAL**	2 días	mié 22-01-13	vie 25-01-13
120	Instalación mobiliario especial	2 días	mié 22-01-13	vie 25-01-13
121	**INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA**	32 días	lun 18-03-13	mié 27-03-13
122	Compra de modulares	5 días	lun 18-03-13	vie 22-03-13
123	Llegada de modulares PRIMERA ETAPA a obra	0 días	vie 22-03-13	vie 22-03-13
124	Instalación y armado	5 días	lun 25-03-13	vie 29-03-13
125	Aseo Final	2 días	mié 24-04-13	jue 25-04-13
126	**ENTREGA DE OBRA**	1 día	mié 08-05-13	mié 08-05-13
127	Entrega provisoria de Etapa 1	1 día	mié 08-05-13	mié 08-05-13
128				
129				
130	**ETAPA 2**	26 días	mié 08-05-13	vie 28-06-13
131	**REQUISITOS INGRESO A OBRA**	4 días	mié 08-05-13	mié 08-05-13
132	Entrega de plan 2/3(SOMA 13 pisos para 8	0 días	mié 08-05-13	mié 08-05-13
133	**OBRA NOVO NORDISK PISO 8º ETAPA 2 Plazo en días hábiles.**	26 días	mié 08-05-13	vie 28-06-13
134	**INICIO DE OBRA**	26 días	mié 08-05-13	vie 28-06-13
135	**DEMOLICIÓN Nº2 1/3 PLANTA FINAL**	4 días	mié 08-05-13	mié 13-05-13
136	Desmontaje de artefactos sanitarios	1 día	mié 08-05-13	mié 08-05-13
137	Desmontaje de cielos y tabiques	1 día	mié 08-05-13	mié 08-05-13
138	Desmontaje de cielos a tabique	1 día	mié 08-05-13	mié 08-05-13
139	Desarme de inst. eléctrica actual	2 días	jue 09-05-13	vie 10-05-13
140	Desarme de inst. de seguridad actual	2 días	jue 09-05-13	vie 10-05-13
141	Desarme de inst. de clima actual	2 días	jue 09-05-13	vie 10-05-13
142	Tabique	1 día	lun 13-05-13	lun 13-05-13
143	**TABIQUES**	4 días	mar 14-05-13	vie 17-05-13
144	Ladrill tabique (SOLICITO A APROB. TRAZADO)	2 días	mié 15-05-13	jue 16-05-13
145	Empalmado 1º cara y aislación	2 días	mié 15-05-13	mié 15-05-13
146	Empalmado 2º cara	2 días	vie 17-05-13	lun 20-05-13
147	Instalaciones de apoyo	3 días	vie 17-05-13	mié 22-05-13
148	**CIELO, VIGA Y CUBIERTA**	19 días	vie 06-05-13	mié 22-06-13
149	**CIELO SUR**	12 días	vie 06-05-13	mié 22-05-13
150	Estructura Cielo Duro y cenefas	4 días	vie 06-05-13	mié 13-05-13
151	Empalmado Cielo duro y cenefas	2 días	lun 13-05-13	mié 15-05-13
152	**Cielo americano**	2 días	mié 20-05-13	jue 21-05-13
153	Instalación de perfiles (estructura)	2 días	mié 20-05-13	jue 21-05-13
154	Instalación de palmetas	2 días	mié 20-05-13	jue 21-05-13
155	**Viga Volcanela**	2 días	vie 08-05-13	lun 13-05-13
156	Estructura rigida	2 días	vie 08-05-13	mié 10-05-13
157	Empalmado de vigas	2 días	mié 15-05-13	jue 16-05-13
158	**TABIQUERIA DE VIDRIO**	12 días	lun 13-05-13	mié 29-05-13
159	Rectificación de medidas nuevas	2 días	lun 13-05-13	mié 15-05-13
160	Instalación de perfiles, cristales nuevos y existentes (modificados)	2 días	vie 17-05-13	lun 20-05-13
161	**PAVIMENTOS**	5 días	lun 13-05-13	vie 17-05-13
162	Instalación de piso de madera reutilizado	3 días	lun 13-05-13	mié 15-05-13
163	Instalación de porcelanatos PISO	2 días	mié 15-05-13	vie 17-05-13
164	**GUARDARROPA**	2 días	vie 10-05-13	lun 13-05-13
165	Instalación de guardapolvos	2 días	vie 10-05-13	lun 13-05-13
166	**PUERTAS**	22 días	lun 10-06-13	mié 17-07-13
167	**P. Madera**	22 días	lun 10-06-13	mié 17-07-13
168	Rectificación de medidas	3 días	lun 10-06-13	mié 12-06-13
169	Instalación de Marcos	2 días	mié 26-06-13	vie 28-06-13
170	Instalación de puertas	2 días	mié 26-06-13	vie 28-06-13
171	**P. de cristal**	2 días	lun 15-04-13	lun 15-04-13
172	Reubicación de puertas de cristal existente	2 días	vie 12-04-13	lun 15-04-13
173	**PINTURA**	27 días	mié 13-06-13	mié 17-07-13
174	Preparación de tabiques y muros	4 días	mié 13-06-13	lun 17-06-13
175	Pintura en muros y tabiques 1º mano	2 días	mié 20-06-13	vie 21-06-13
176	Pintura en muros y tabiques 2º mano	2 días	mié 26-06-13	jue 27-06-13
177	Preparación y empastado de vigas	2 días	lun 17-06-13	mié 19-06-13
178	Preparación y empastado cielo	2 días	mié 19-06-13	vie 21-06-13
179	Pintura en cielos 1º mano	2 días	lun 24-06-13	mié 26-06-13
180	Pintura en cielos 2º mano	2 días	mié 26-06-13	vie 28-06-13
181	Barniz puertas	2 días	mié 03-07-13	jue 04-07-13
182	**INSTALACIÓN SANITARIA**	3 días	jue 17-01-13	mié 23-01-13
183	Tubería y ductos alcantarillado	2 días	jue 17-01-13	lun 21-01-13
184	Inst. cañerías agua potable	2 días	jue 17-01-13	lun 21-01-13
185	Inst. de grifería	2 días	mié 23-01-13	jue 24-01-13
186	Inst. de artefactos	2 días	mié 23-01-13	jue 24-01-13
187	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	28 días	lun 28-01-13	lun 04-03-13
188	**ANDEN/SIDE 2 (MM)**	28 días	lun 28-01-13	lun 04-03-13
189	Canalizaciones por tabiquería	3 días	vie 25-01-13	mié 30-01-13
190	Canalizaciones por cielo	3 días	vie 25-01-13	mié 30-01-13
191	Cableado por tabiquería	2 días	jue 31-01-13	vie 01-02-13
192	Cableado por cielo	2 días	jue 31-01-13	vie 01-02-13
193	Canalizaciones por piso	2 días	jue 31-01-13	vie 01-02-13
194	Cableado por piso	2 días	mié 06-02-13	jue 07-02-13
195	Canalización perimetral	2 días	vie 08-02-13	mié 13-02-13
196	Cableado perimetral	2 días	vie 08-02-13	mié 13-02-13
197	Canalización por modulares	2 días	mié 13-02-13	jue 14-02-13
198	Cableado por modulares	2 días	mié 13-02-13	jue 14-02-13
199	Instalación de luminarias	2 días	lun 18-02-13	mié 20-02-13
200	Trabajos en tablero	2 días	mié 20-02-13	jue 21-02-13
201	Arranques eléctricos para clima	2 días	jue 21-02-13	vie 22-02-13
202	Instalación de sensores	2 días	lun 25-02-13	mié 27-02-13
203	Instalación de interruptores	2 días	lun 25-02-13	mié 27-02-13
204	Instalación de tiras pilotos	2 días	lun 25-02-13	mié 27-02-13
205	Trabajos en Rack	2 días	mié 27-02-13	vie 01-03-13
206	Certificación	2 días	vie 01-03-13	lun 04-03-13
207	Rotulación	2 días	vie 01-03-13	lun 04-03-13
208	**CLIMA**	15 días	jue 14-03-13	mié 03-04-13
209	Revisión y mantención de equipos de clima existentes	2 días	jue 14-03-13	vie 15-03-13
210	Reubicación, baja y montaje de equipos de clima	2 días	lun 18-03-13	mié 19-03-13
211	Inst. de cañerías y tuberías. (Reubicación e instalación de nuevos tramos)	2 días	mié 20-03-13	jue 21-03-13
212	Inst. de ductos y difusores	2 días	mié 20-03-13	jue 21-03-13
213	Pruebas hidraulicas	1 día	vie 22-03-13	vie 22-03-13
214	Instalación de plenos y ductos en hojalatería	2 días	mié 20-03-13	jue 21-03-13
215	Conexión electrica de equipos	2 días	vie 29-03-13	lun 01-04-13
216	Instalación de mangas flexibles	2 días	jue 04-04-13	lun 08-04-13
217	Instalación de difusores y rejillas	2 días	jue 04-04-13	lun 08-04-13
218	Instalación de sensores	2 días	mié 03-04-13	jue 04-04-13
219	Pruebas y puesta en marcha	1 día	mié 03-04-13	mié 03-04-13
220	**SEGURIDAD**	15 días	lun 18-03-13	jue 11-04-13
221	**Detectores**	15 días	lun 18-03-13	jue 11-04-13
222	Canalización	3 días	lun 18-03-13	mié 20-03-13
223	Cableado	1 día	mar 26-03-13	mar 26-03-13
224	Instalación de detectores	2 días	mié 27-03-13	jue 28-03-13
225	Conexión a central	1 día	vie 29-03-13	vie 29-03-13
226	Puesta en marcha	1 día	vie 10-04-13	vie 10-04-13
227	**Extinción**	15 días	vie 29-03-13	jue 18-04-13
228	Red Pipping matriz de agua	3 días	vie 29-03-13	mié 29-03-13
229	Instalación de gabinetes de vidrio	2 días	jue 04-04-13	vie 05-04-13
230	Prueba de presión	1 día	mié 10-04-13	mié 10-04-13
231	Instalación de aplicadores	1 día	mié 10-04-13	mié 10-04-13
232	Pruebas y puesta en marcha	1 día	jue 18-04-13	jue 18-04-13
233	**CORTINAS**	21 días	lun 21-01-13	mié 13-03-13
234	Rectificación de cortinas existentes	2 días	lun 21-01-13	mié 23-01-13
235	Adquisición de cortinas existentes	1 día	vie 15-02-13	vie 15-02-13
236	**MOBILIARIO ESPECIAL**	2 días	lun 18-03-13	mié 20-03-13
237	Instalación mobiliario especial	2 días	lun 18-03-13	mié 20-03-13
238	**INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA**	3 días	mié 17-04-13	lun 22-04-13
239	Llegada de modulares PRIMERA ETAPA a obra	0 días	mié 17-04-13	mié 17-04-13
240	Instalación y armado	3 días	jue 18-04-13	lun 22-04-13
241	Aseo Final	2 días	mié 24-04-13	jue 25-04-13
242	**ENTREGA DE OBRA**	1 día	vie 28-06-13	vie 28-06-13
243	Entrega provisoria de Etapa 1	1 día	vie 28-06-13	vie 28-06-13

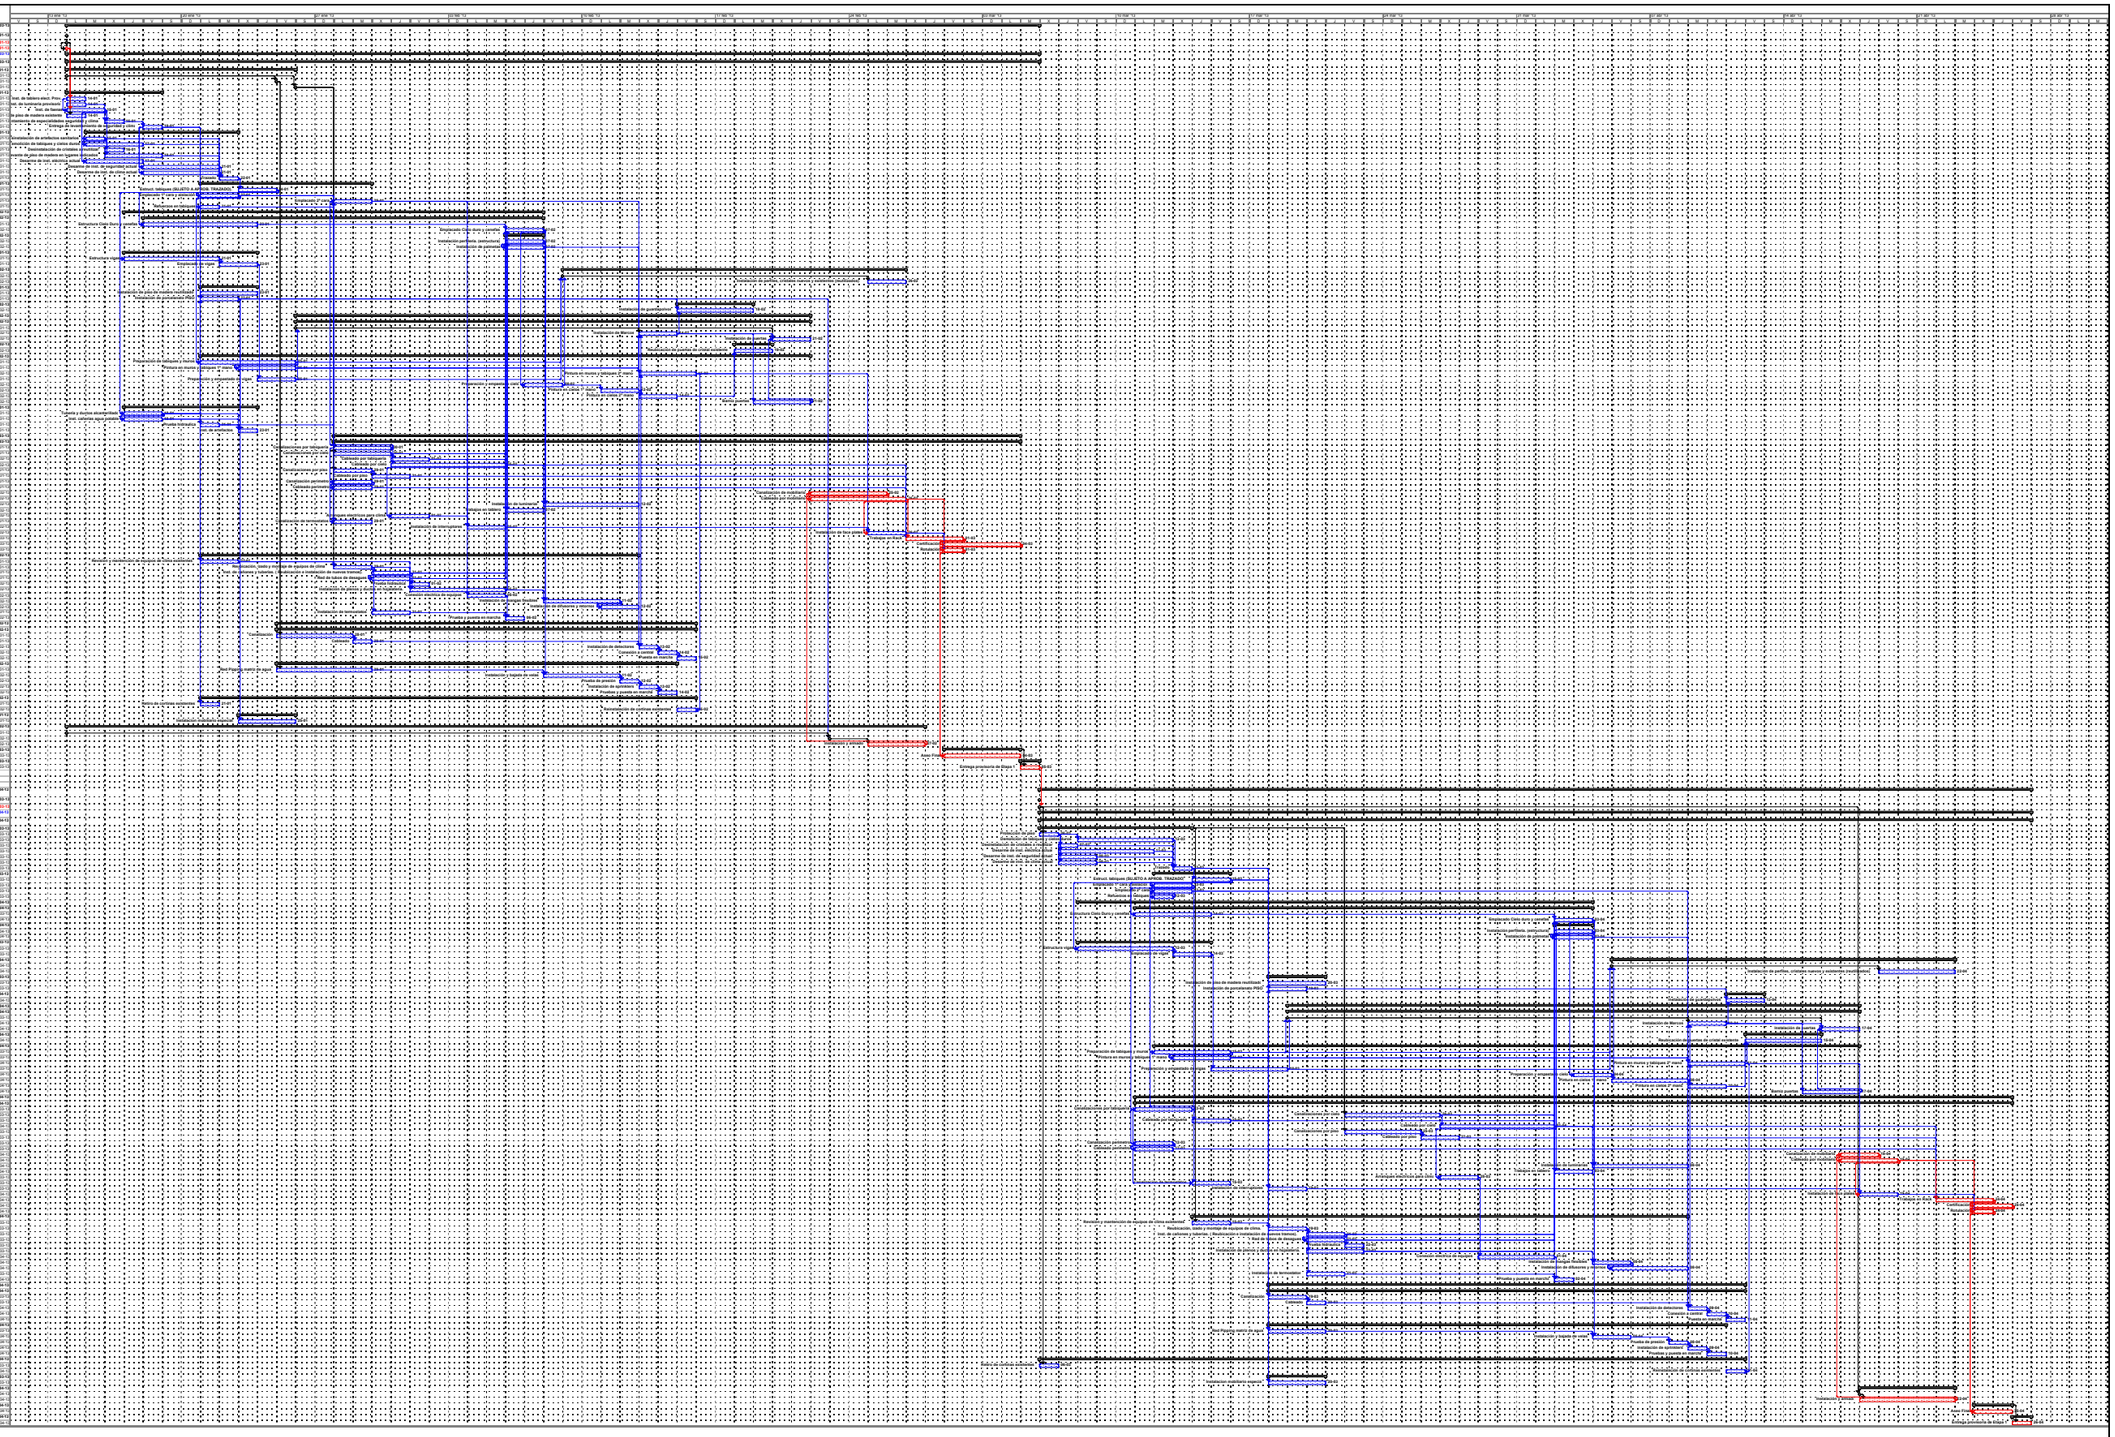

Proyecto: Plan de obra Cencosud
Jueve, jue 11-01-13
