Cronograma Final de tareas al 31-07-08 Reconquista Obra BREA SOLANO -V- UTE CJ.R.A.

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**BREA SOLANO 1º PISO**	**20 días**	**vie 12/06/08**	**mié 16/07/08**	
2	**DEMOLICIONES**	**9 días**	**vie 12/06/08**	**mié 24/06/08**	
3	Desmonte de carpintería modular y mobiliario.	2 días	vie 12/06/08	mar 17/06/08	
4	Desmonte de artefactos eléctricos	2 días	vie 12/06/08	mar 17/06/08	3CC
5	Desmonte de aparatos sanitarios	2 días	vie 12/06/08	mar 17/06/08	3FC-1 días
6	Desmonte de extractores y rejas exterior	2 días	vie 12/06/08	mar 17/06/08	3FC-1 días
7	Desmonte de conductos de aire acondicionado.	1 día	lun 23/06/08	mar 24/06/08	5
8	Desmonte de puertas y ventanas	2 días	jue 19/06/08	vie 20/06/08	
9	**ALBAÑILERIA**	**10 días**	**lun 23/06/08**	**mié 02/07/08**	
10	Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas	2 días	lun 23/06/08	jue 26/06/08	7
11	Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas pisos	2 días	mié 25/06/08	vie 27/06/08	48FC-1 día
12	Reparación cielorraso en sectores varios	2 días	lun 07/07/08	mié 09/07/08	11
13	Contrapiso de pertiquerías existentes	2 días	vie 13/07/08	mar 15/07/08	
14	**TANQUES DURLOCK**	**7 días**	**mié 25/06/08**	**vie 27/06/08**	
15	Estructura y empilazado 1 cara	1 día	mié 25/06/08	jue 26/06/08	
16	Cerramiento 1 cara 1 placa	2 días	mié 25/06/08	jue 26/06/08	15
17	**CIELORRASO REMONTABLE**	**5 días**	**vie 27/06/08**	**jue 03/07/08**	
18	Armado de pelliterio	2 días	vie 27/06/08	lun 30/06/08	19CF
19	Emplazado y nivelado para iluminación	2 días	mar 01/07/08	mié 02/07/08	48FC-2 días
20	**CIELORRASO DURLOCK**	**5 días**	**mié 25/06/08**	**mar 01/07/08**	
21	Armado de cielorraso empilazado.	2 días	mié 25/06/08	jue 26/06/08	15
22	Placas de cielorraso tipo/ancho para 4º-1º	2 días	vie 27/06/08	lun 30/06/08	45
23	**CARPINTERIA MODULAR**	**8 días**	**mié 02/07/08**	**lun 07/07/08**	
24	Retiramo para carpintería	1 día	mié 02/07/08	jue 03/07/08	19FC-1 día
25	Armado de carpintería.	3 días	jue 03/07/08	lun 07/07/08	24
26	**CRISTALES**	**7 días**	**vie 13/06/08**	**lun 23/06/08**	
27	Desmonte de ventas rellenado y puertas blindex	5 días	vie 13/06/08	lun 18/06/08	
28	**PISO ALFOMBRA**	**3 días**	**mié 09/07/08**	**vie 11/07/08**	
29	Mesa metálica para colocación de Alfombra.	1 día	mié 09/07/08	jue 10/07/08	12
30	Colocación de alfombra modular	2 días	jue 10/07/08	vie 11/07/08	29
31	**CARPINTERIA DE MADERA**	**1 día**	**vie 20/06/08**	**lun 30/06/08**	
32	Provisión y colocación puerta simple y puertas (pliegues reunidos)	1 día	vie 20/06/08	lun 30/06/08	
33	**ZOCALOS**	**2 días**	**mié 09/07/08**	**jue 10/07/08**	
34	Colocación de zocalos.	1 día	lun 07/07/08	mar 08/07/08	15CF
35	**PINTURA**	**10 días**	**vie 20/06/08**	**jue 10/07/08**	
36	Lijado cerrado en cielorrasos	2 días	mié 02/07/08	vie 04/07/08	21
37	Lijado cielorraso para interior en mures	4 días	vie 20/06/08	jue 03/07/08	16CF1 días
38	Pintura de cielorrasos	2 días	mié 09/07/08	jue 10/07/08	37
39	Esmalte sintetico en carpinteria existentes	2 días	mié 04/07/08	lun 07/07/08	38CC
40	Detalles varios	2 días	mié 09/07/08	jue 10/07/08	38
41	**INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	**21 días**	**vie 13/06/08**	**mié 16/07/08**	
42	Desarme Instalación Exterior	2 días	lun 23/06/08	mié 25/06/08	9FC-1 día
43	Conexión y Tablero tensión central existente	2 días	mié 09/07/08	vie 11/07/08	53FC-2 días
44	Conexión y Tablero Tomas dedicada existente	2 días	mié 09/07/08	vie 11/07/08	43CC
45	Tomas Nuevas Varios	2 días	mié 09/07/08	vie 11/07/08	43
46	Instalación nuevas Artefactos de Iluminación	3 días	lun 30/06/08	jue 03/07/08	19FC4 días
47	Iluminación emergencia en provisión artefactos	1 día	vie 27/06/08	vié 28/06/08	46FC-2 días
48	Cañerías para canalizaciones grales. de pisos, complemento de cañerías existen	2 días	mar 01/07/08	jue 03/07/08	
49	Cableado 220 v nuevo	3 días	lun 30/06/08	jue 03/07/08	
50	Cableado Data Categoria 5E	3 días	mié 04/07/08	vie 06/07/08	49CC
51	Cableado Data Categoria 5E	3 días	mié 04/07/08	mié 09/07/08	50FC-1 día
52	Cableado Voz Categoria 5E	3 días	mié 04/07/08	mié 09/07/08	51CC
53	Pertiquerías	2 días	lun 14/07/08	mié 16/07/08	54FC-2 días
54	Puesta a Tierra	1 día	mié 09/07/08	jue 10/07/08	43CC
55	**ARTEFACTOS ILUMINACION**	**2 días**	**mié 09/07/08**	**jue 10/07/08**	
56	Instalación artefacto Iluminación	2 días	mié 09/07/08	jue 10/07/08	38FC-2 días
57	**EQUIPAMIENTO**	**2 días**	**vie 11/07/08**	**mar 15/07/08**	
58	Armado de muebles existentes.	2 días	vie 11/07/08	mar 15/07/08	53FC-2 días
59	**LIMPIEZA DE OBRA**	**2 días**	**lun 14/07/08**	**mié 16/07/08**	
60	Limpieza de Obra final	2 días	lun 14/07/08	mié 16/07/08	58FC-2 días

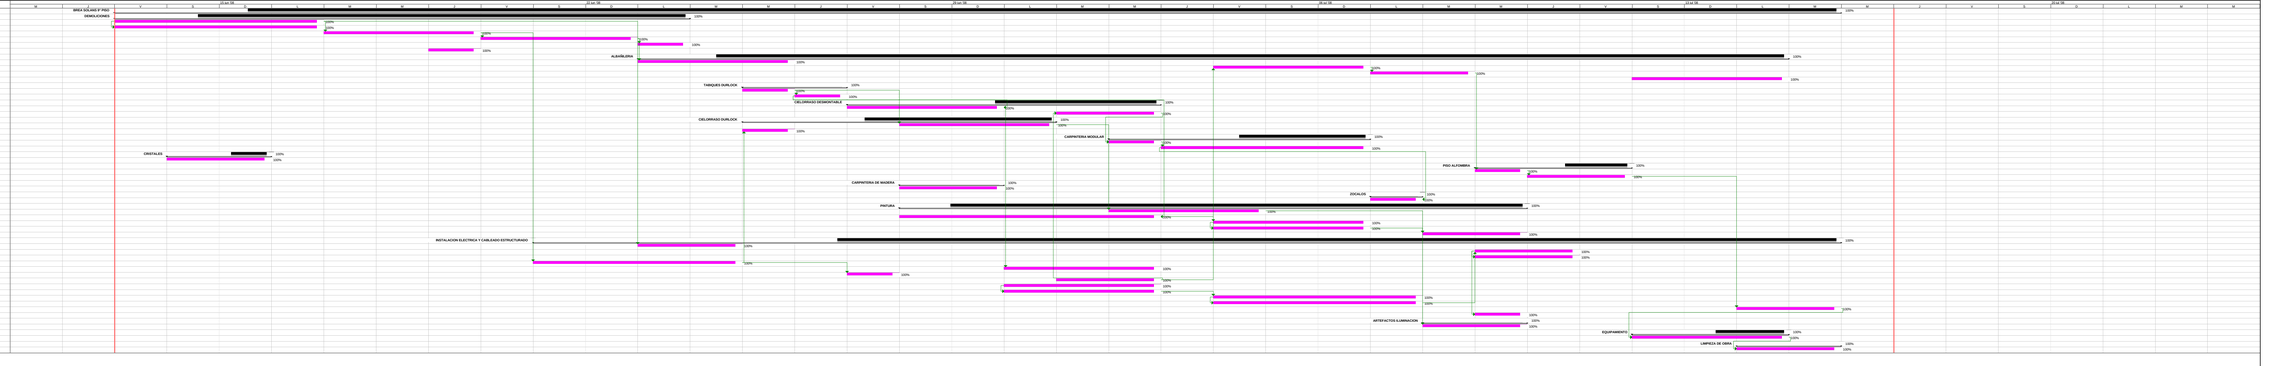

Fecha: 31-07-08

Critical | Critical Split | Critical Progress | Task | Split | Task Progress | Baseline | Baseline Split | Baseline Milestone | Milestone | Summary Progress | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline
