CRONOGRAMA GENERAL DE TAREAS Y OBRAS

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
11	**TAREAS PRELIMINARES**	**2 días**	**mar 05/03/13**	**mié 06/03/13**	
12	PRESENTAC.OBRA A ADMINIST EDIF	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	
13	TRAMITACION ART/PROG SEGURIDAD	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	12CC
14	CONDIC. SEGURIDAD/CARTEL/EXTINT	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	12CC
15	REPLANTEOS	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	14CC
16	TABLERO ELECTRICO PROVISORIO	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	15CC
17	LUZ DE OBRA PROVISORIA	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	16CC
18	PROTECCIONES AREAS COMUNES	1 día	mié 06/03/13	mié 06/03/13	15;13
19	**OBRA GENERAL**	**106 días**	**mié 06/03/13**	**sáb 06/07/13**	
20	**PISO TECNICO**	**25 días**	**mié 06/03/13**	**mié 03/04/13**	
21	ARMADO PISO TECNICO SECTOR A	10 días	mié 06/03/13	sáb 16/03/13	17
22	ARMADO PISO TECNICO SECTOR B	10 días	mié 20/03/13	sáb 30/03/13	21;42
23	DESARME PISO TECNICO SECTOR A	3 días	lun 18/03/13	mié 20/03/13	21
24	DESARME PISO TECNICO SECTOR B	3 días	lun 01/04/13	mié 03/04/13	22
25	**DURLOCK**	**41 días**	**lun 18/03/13**	**vie 03/05/13**	
26	ARMADO ESTRUCTURA SECTOR A	10 días	lun 18/03/13	jue 28/03/13	21
27	ARMADO ESTRUCTURA SECTOR B	10 días	vie 29/03/13	mar 09/04/13	26
28	AISLACION INTERNA SECTOR A	5 días	vie 29/03/13	mié 03/04/13	26
29	AISLACION INTERNA SECTOR B	5 días	mié 10/04/13	lun 15/04/13	27
30	EMPLACADO 1º CARA SECTOR A	8 días	jue 04/04/13	vie 12/04/13	28
31	EMPLACADO 1º CARA SECTOR B	8 días	mar 16/04/13	mié 24/04/13	29
32	EMPLACADO 2º CARA SECTOR A	8 días	sáb 13/04/13	lun 22/04/13	30
33	EMPLACADO 2º CARA SECTOR B	8 días	jue 25/04/13	vie 03/05/13	31
34	**CANALIZACIONES**	**78 días**	**mié 06/03/13**	**mar 04/06/13**	
35	**BANDEJAS**	**19 días**	**jue 21/03/13**	**jue 11/04/13**	
36	TENDIDO BANDEJAS BAJO PISO TECNICO S/A	7 días	jue 21/03/13	jue 28/03/13	23
37	TENDIDO BANDEJAS BAJO PISO TECNICO S/B	7 días	jue 04/04/13	jue 11/04/13	24
38	TENDIDO BANDEJAS EN DATA CENTERS	6 días	jue 21/03/13	vie 05/04/13	23
39	**ELECTRICIDAD /ILUMINACION**	**40 días**	**mié 06/03/13**	**sáb 20/04/13**	
40	CAÑERIA INTERNA TABIQUES S/A	5 días	jue 04/04/13	mar 09/04/13	28
41	CAÑERIA INTERNA TABIQUES S/B	5 días	mar 16/04/13	sáb 20/04/13	29;43
42	CANALIZACIONES AEREAS S/B	12 días	mié 06/03/13	mar 19/03/13	17
43	CANALIZACIONES AEREAS S/A	12 días	mié 20/03/13	mar 02/04/13	42
44	**CANALIZACIONES DE INSTALACIONES ANEXAS**	**15 días**	**mié 03/04/13**	**vie 19/04/13**	
45	PARA CCTV	7 días	mié 03/04/13	mié 10/04/13	43
46	PARA ALARMAS	7 días	mié 03/04/13	mié 10/04/13	43
47	PARA CONTROL DE ACCESOS	10 días	mié 03/04/13	sáb 13/04/13	43
48	VARIAS ANEXAS	5 días	lun 15/04/13	vie 19/04/13	45;46
49	**AIRE ACONDICIONADO GENERAL**	**78 días**	**mié 06/03/13**	**mar 04/06/13**	
50	MONTAJE CONDUCTOS S/A	15 días	sáb 23/03/13	mar 09/04/13	51
51	MONTAJE CONDUCTOS S/B	15 días	mié 06/03/13	vie 22/03/13	17
52	AISLACIONES/TERMINACIONES	20 días	mié 10/04/13	jue 02/05/13	50
53	PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PRECISIÓN	1 día	mar 21/05/13	mar 21/05/13	52FC días
54	INSTALACION DE EQUIPOS DE PRECISION	7 días	mié 22/05/13	mié 29/05/13	53
55	APROBACION FABRICANTE EQUIPOS	5 días	jue 30/05/13	mar 04/06/13	54
56	**CONEXIONES EQUIPOS EXISTENTES**	**32 días**	**mié 06/03/13**	**jue 11/04/13**	
57	CONEXIONADO EQUIPOS EXISTENTES	8 días	mié 13/03/13	jue 21/03/13	17CC días
58	DESAGUES DE CONDENSADO S/A	12 días	sáb 23/03/13	vie 05/04/13	57;64
59	DESAGUES CONDENSADO S/B	12 días	mié 06/03/13	mar 19/03/13	17
60	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	5 días	sáb 06/04/13	jue 11/04/13	58;59
61	**INSTALACION SANITARIA NORMAL**	**15 días**	**mié 06/03/13**	**vie 22/03/13**	
62	CONEXIONES DESAGUES COFFE	7 días	mié 06/03/13	mié 13/03/13	17
63	CONEXIONES ALIMENTACIONES COFFE	5 días	jue 14/03/13	mar 19/03/13	62
64	TERMINACIONES INSTAL. SANITARIA	3 días	mié 20/03/13	vie 22/03/13	63
65	**ALBAÑILERIA GENERAL**	**15 días**	**mié 06/03/13**	**vie 22/03/13**	
66	DESARMES PROPIOS	3 días	mié 06/03/13	vie 08/03/13	17
67	CONTRAPISOS LIVIANOS	7 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13	66
68	REFUERZOS BAJO PISO	3 días	lun 18/03/13	mié 20/03/13	67
69	REFUERZOS SOBRE CIELORRASOS S/B	5 días	sáb 09/03/13	jue 14/03/13	66
70	REFUERZOS SOBRE CIELORRASOS S/A	5 días	lun 18/03/13	vie 22/03/13	21
71	COLOCACIONES COFFE BREAKS	4 días	lun 18/03/13	jue 21/03/13	67
72	REFORMAS EN RECINTOS EXISTENTES	7 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13	66
73	**DETECCION DE INCENDIOS**	**22 días**	**mié 06/03/13**	**sáb 30/03/13**	
74	CANALIZACIONES SECTOR A	7 días	jue 14/03/13	jue 21/03/13	75
75	CANALIZACIONES SECTOR B	7 días	mié 06/03/13	mié 13/03/13	17
76	CABLEADOS	5 días	vie 22/03/13	mié 27/03/13	74;75
77	TERMINACIONES	3 días	jue 28/03/13	sáb 30/03/13	76
78	**EXTINCION DE INCENDIOS**	**33 días**	**mié 06/03/13**	**vie 12/04/13**	
79	CANALIZACIONES SECTOR A	12 días	mié 20/03/13	mar 02/04/13	80
80	CANALIZACIONES SECTOR B	12 días	mié 06/03/13	mar 19/03/13	17
81	ACCESORIOS GENERALES	5 días	mié 03/04/13	lun 08/04/13	79
82	CONEXIONADO FINAL	2 días	mar 09/04/13	mié 10/04/13	81
83	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	2 días	jue 11/04/13	vie 12/04/13	82
84	**CIELORRASOS CONTINUOS**	**36 días**	**mié 06/03/13**	**mar 16/04/13**	
85	C. CONT.-ESTRUCTURAS S/A	9 días	mar 19/03/13	jue 28/03/13	86
86	C. CONT.-ESTRUCTURAS S/B	11 días	mié 06/03/13	lun 18/03/13	15
87	C. CONT.-EMPLACADOS	12 días	vie 29/03/13	jue 11/04/13	85
88	C.CONT.-TERMINACIONES	4 días	vie 12/04/13	mar 16/04/13	87
89	**CIELORRASOS DESMONTABLES**	**26 días**	**mié 06/03/13**	**jue 04/04/13**	
90	C.DESM.-ESTRUCTURAS S/A	7 días	jue 14/03/13	jue 21/03/13	91
91	C. DESM.-ESTRUCTURAS S/B	7 días	mié 06/03/13	mié 13/03/13	15
92	C.DESM.-COLOCACION PLACAS DESMONTABLES	7 días	jue 28/03/13	jue 04/04/13	93
93	C.DESM.-TERMINACIONES	5 días	vie 22/03/13	mié 27/03/13	90
94	**TABIQUERIA VIDRIADA**	**75 días**	**sáb 09/03/13**	**mar 04/06/13**	
95	TABIQUERIA VIDRIADA-CONTRATACION /LIMITE	1 día	sáb 09/03/13	sáb 09/03/13	17CC días
96	TAB. VIDR.-REPLANTEOS ESPECIFICOS	2 días	lun 11/03/13	mar 12/03/13	15;95
97	TAB. VIDR.-FABRICACION	50 días	mié 13/03/13	jue 09/05/13	96
98	TAB. VIDR.-ARMADO EN OBRA	20 días	vie 10/05/13	sáb 01/06/13	97
99	TAB. VIDR.-TERMINACIONES	2 días	lun 03/06/13	mar 04/06/13	98
100	**CRISTALES**	**26 días**	**mié 10/04/13**	**jue 09/05/13**	
101	CRISTALES-REPLANTEO ESPECIFICO	1 día	mié 10/04/13	mié 10/04/13	26;27
102	CRISTALES-FABRICACION	15 días	jue 11/04/13	sáb 27/04/13	101
103	CRISTALES-MONTAJE EN OBRA	10 días	lun 29/04/13	jue 09/05/13	102
104	**CABLEADO ENERGIA**	**47 días**	**lun 01/04/13**	**vie 24/05/13**	
105	CABLEADO ENERGIA-TENDIDO GENERAL	20 días	lun 01/04/13	mar 23/04/13	21;22
106	CABLEADOENERGIA-TERMINACIONES	7 días	mié 24/04/13	mié 01/05/13	105
107	CABLEADO ENERGIA-PRUEBAS DEL SISTEMA	5 días	lun 20/05/13	vie 24/05/13	106;1
108	**CABLEADO ILUMINACION**	**45 días**	**mié 03/04/13**	**vie 24/05/13**	
109	CABLEADO ILUMINACION-TENDIDO GENERAL	20 días	mié 03/04/13	jue 25/04/13	42;43
110	CABLEADO ILUMINACION-TERMINACIONES	12 días	vie 26/04/13	jue 09/05/13	109
111	PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	1 día	vie 10/05/13	vie 10/05/13	110
112	CABLEADO Y CONEXIONADO DE GE	7 días	sáb 11/05/13	sáb 18/05/13	111
113	CABLEADO ILUMINACION-PRUEBAS DEL SISTEMA	5 días	lun 20/05/13	vie 24/05/13	112
114	**CABLEADO ESTRUCTURADO**	**15 días**	**vie 12/04/13**	**lun 29/04/13**	
115	CABLEADO ESTRUCTURADO-TENDIDO GENERAL	7 días	vie 12/04/13	vie 19/04/13	36;37
116	CABLEADO ESTRUCTURADO-TERMINACIONES	3 días	sáb 20/04/13	mar 23/04/13	115
117	CABL. ESTRUCT.-PRUEBAS DEL SISTEMA /CERTIFICACIONES	5 días	mié 24/04/13	lun 29/04/13	116
118	**CABLEADOS ANEXOS**	**18 días**	**vie 12/04/13**	**jue 02/05/13**	**36;37**
119	CABLEADOS ANEXOS-TENDIDO GENERAL	10 días	vie 12/04/13	mar 23/04/13	36;37
120	CABLEADOS ANEXOS-TERMINACIONES	3 días	mié 24/04/13	vie 26/04/13	119
121	CABLEADOS ANEXOS-PRUEBAS DEL SISTEMA	5 días	sáb 27/04/13	jue 02/05/13	120
122	**PISOS CERAMICOS**	**16 días**	**lun 18/03/13**	**jue 04/04/13**	
123	COLOCACIONES	12 días	lun 18/03/13	sáb 30/03/13	67
124	TERMINACIONES	4 días	lun 01/04/13	jue 04/04/13	123
125	**REVESTIMIENTOS CERAMICOS**	**7 días**	**lun 01/04/13**	**lun 08/04/13**	
126	COLOCACIONES	5 días	lun 01/04/13	vie 05/04/13	123
127	TERMINACIONES	2 días	sáb 06/04/13	lun 08/04/13	126
128	**PINTURA**	**53 días**	**sáb 04/05/13**	**jue 04/07/13**	
129	PINTURA-ENDUIDOS Y PREPARACIONES GENERALES	12 días	sáb 04/05/13	vie 17/05/13	32;33
130	PINTURA-PINTURA GENERAL	27 días	sáb 18/05/13	mar 18/06/13	129
131	PINTURA-TERMINACIONES	14 días	mié 19/06/13	jue 04/07/13	130
132	**ZOCALOS GENERALES**	**14 días**	**sáb 04/05/13**	**lun 20/05/13**	
133	ZOCALOS-COLOCACIONES	7 días	sáb 04/05/13	sáb 11/05/13	32;33
134	ZOCALOS-TERMINACIONES Y PINTURA	7 días	lun 13/05/13	lun 20/05/13	133
135	**ARTEFACTOS ILUMINACION**	**30 días**	**mié 17/04/13**	**mar 21/05/13**	
136	ARTS. ILUMINACION-COLOCACIONES	14 días	mié 17/04/13	jue 02/05/13	88
137	ARTS. ILUMINACION-CONEXIONADOS	16 días	vie 03/05/13	mar 21/05/13	136
138	**ALFOMBRA**	**101 días**	**sáb 09/03/13**	**jue 04/07/13**	
139	ALFOMBRA-CONTRATACION /LIMITE	1 día	sáb 09/03/13	sáb 09/03/13	17CC días
140	ALFOMBRA-INGRESO A OBRA - FECHA LIMITE	1 día	mié 19/06/13	mié 19/06/13	130;1
141	ALFOMBRA-SUBIDA A OBRA	2 días	jue 20/06/13	vie 21/06/13	140
142	ALFOMBRA-COLOCACIONES	7 días	sáb 22/06/13	sáb 29/06/13	141;1
143	ALFOMBRA-TERMINACIONES	4 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13	142
144	**GRAFICA**	**18 días**	**sáb 18/05/13**	**vie 07/06/13**	
145	GRAFICA-INSTALACION EN OBRA	14 días	sáb 18/05/13	lun 03/06/13	103;1
146	GRAFICA-TERMINACIONES	4 días	mar 04/06/13	vie 07/06/13	145
147	**EQUIPAMIENTO ESPECIAL**	**13 días**	**mié 19/06/13**	**mié 03/07/13**	
148	INGRESO Y SUBIDA A OBRA	3 días	mié 19/06/13	vie 21/06/13	130
149	MONTAJE Y AJUSTES	7 días	sáb 22/06/13	sáb 29/06/13	148
150	TERMINACIONES	3 días	lun 01/07/13	mié 03/07/13	149
151	**LIMPIEZA DE OBRA**	**106 días**	**mié 06/03/13**	**sáb 06/07/13**	
152	LIMPIEZA DE OBRA DIARIA	106 días	mié 06/03/13	sáb 06/07/13	15
153	**EQUIPAMIENTO OPERATIVO**	**19 días**	**lun 01/07/13**	**lun 22/07/13**	
154	EQUIPAMIENTO STAFF OPERATIVO / ARMADOS	12 días	lun 01/07/13	sáb 13/07/13	142
155	EQUIPAMIENTO GERENCIAL / ARMADOS	12 días	lun 01/07/13	sáb 13/07/13	142
156	CABLEADO ELECTRICO Y ESTRUCTURADO EN PUESTOS DE TRABAJO	7 días	lun 15/07/13	lun 22/07/13	155
157	EQUIPAMIENTO ESPECIAL / ARMADOS	4 días	vie 05/07/13	mar 09/07/13	143
158	SILLAS -SILLONES -VARIOS /ENTREGA EN OBRA	3 días	vie 12/07/13	lun 15/07/13	154F días; 4días
159	TERMINACIONES DE CONEXIONADOS	3 días	lun 15/07/13	mié 17/07/13	154;1
160	**MUDANZA GENERAL**	**9 días**	**lun 15/07/13**	**mié 24/07/13**	
161	INICIO TAREAS	1 día	lun 15/07/13	lun 15/07/13	159C
162	LIMPIEZA FINAL	8 días	mar 16/07/13	mié 24/07/13	161
163	INSTRUCTIVOS	3 días	mar 16/07/13	jue 18/07/13	161
164	ENVIO CAJAS / CANASTOS	1 día	jue 18/07/13	jue 18/07/13	163F día
165	TRASLADO	3 días	vie 19/07/13	lun 22/07/13	159F días;
166	EN OBRA	2 días	mar 23/07/13	mié 24/07/13	165

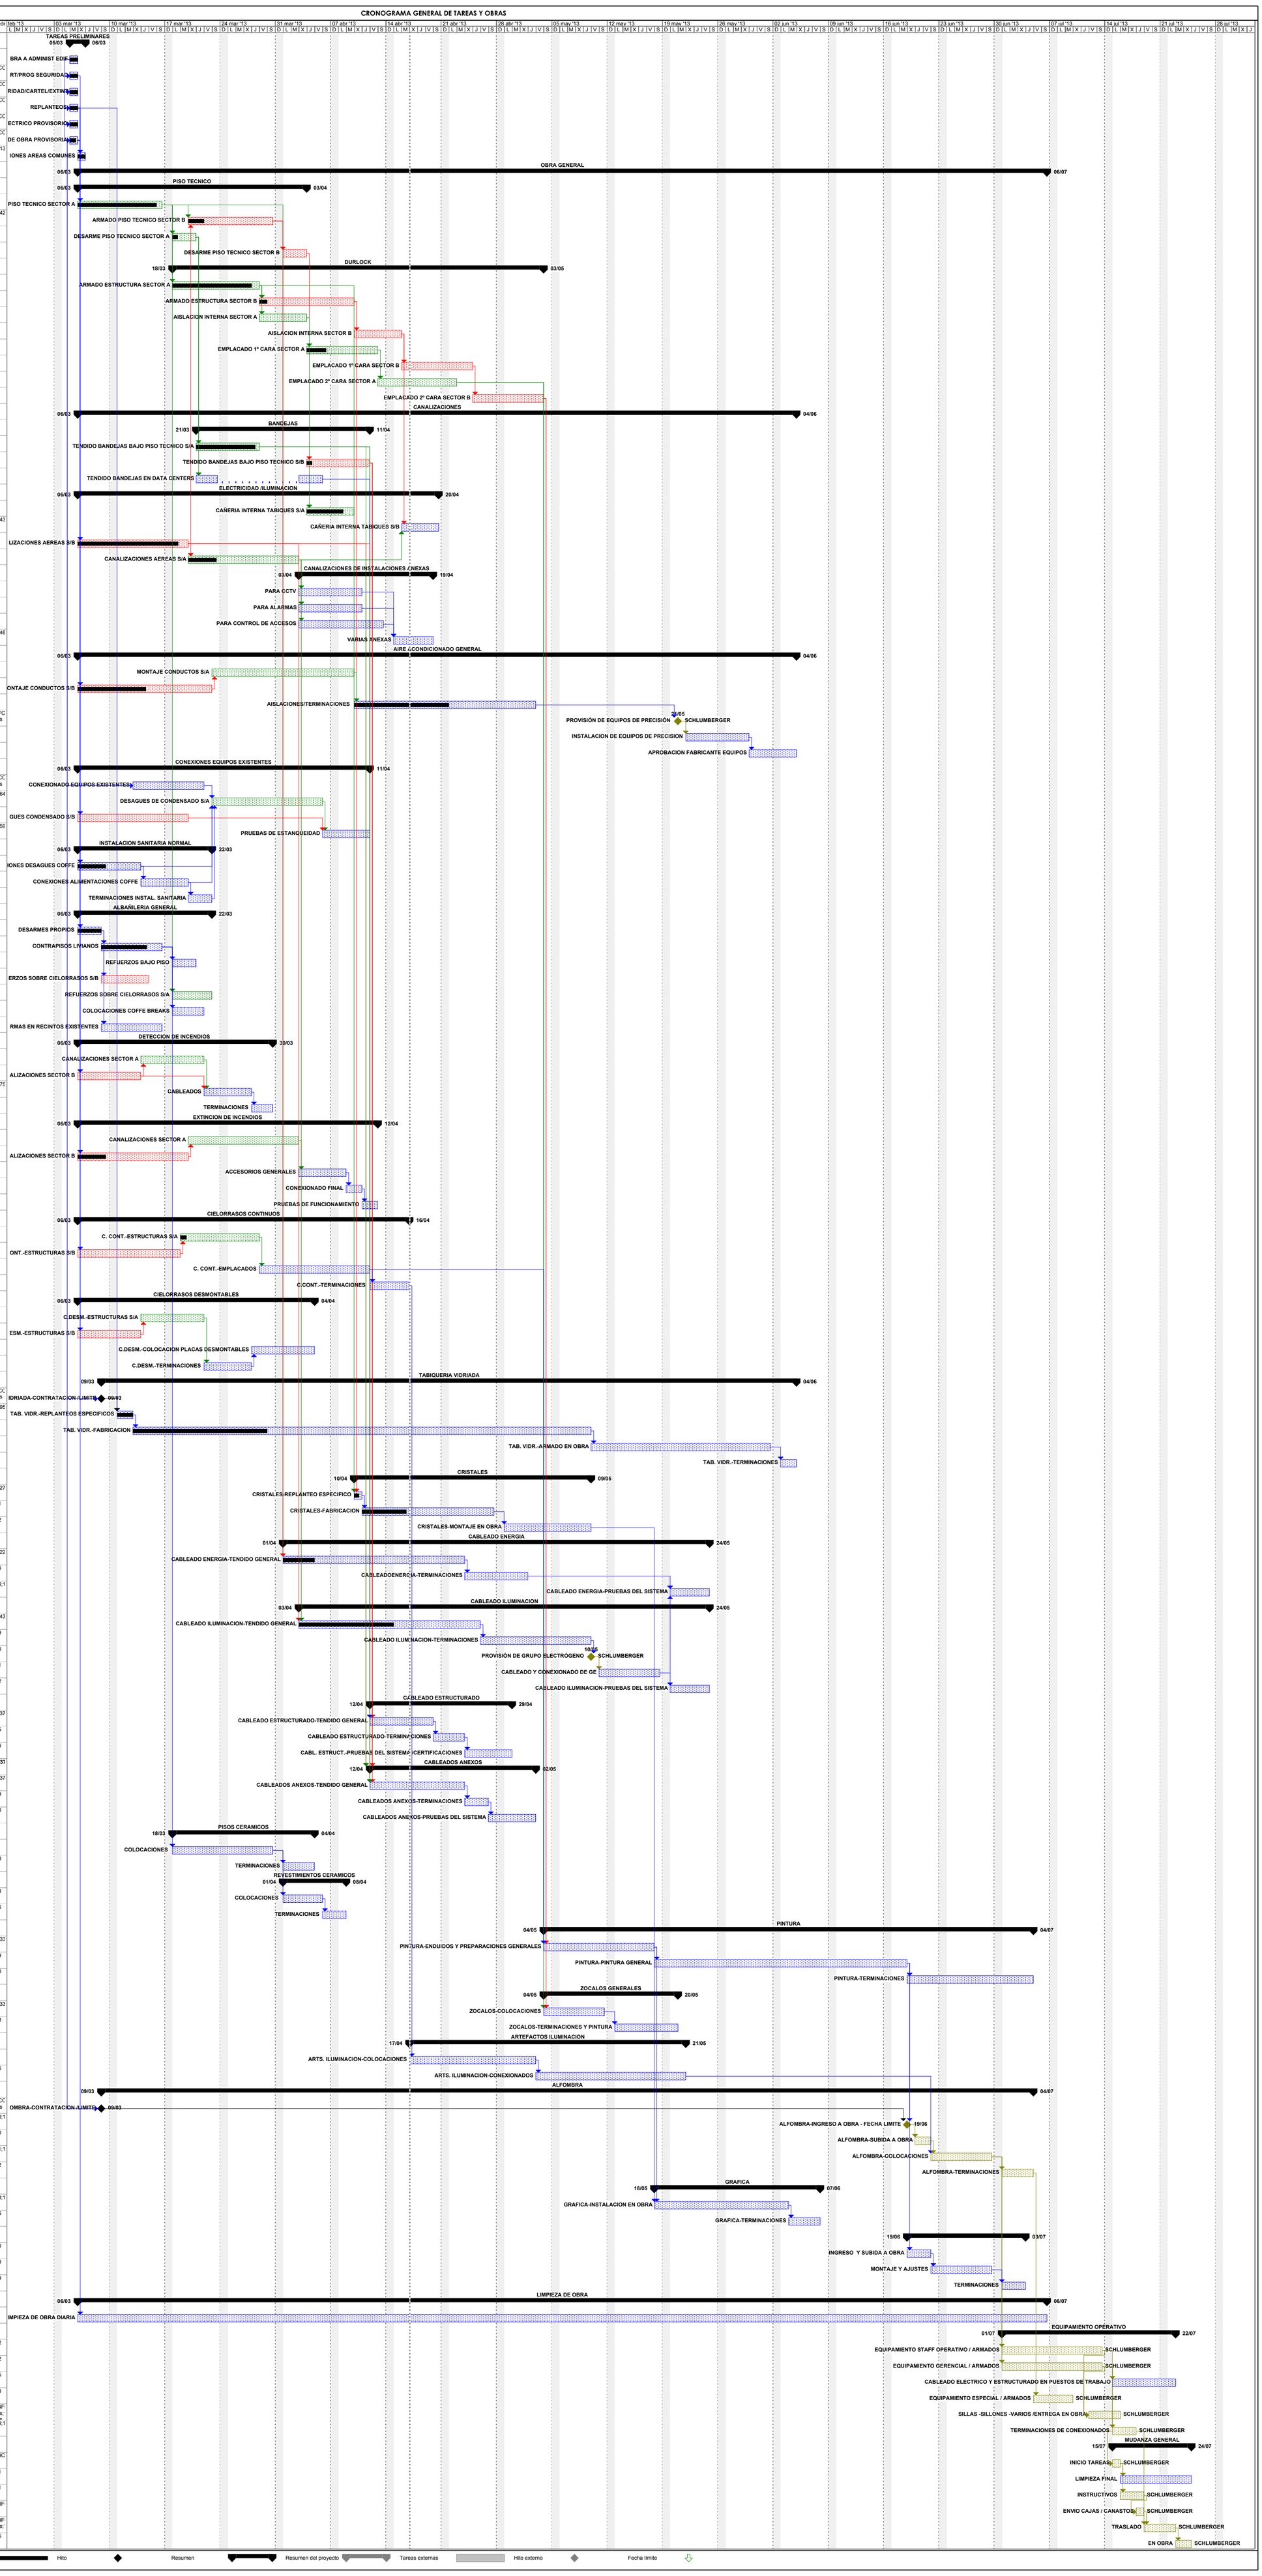

Proyecto: SLB - CRONOGRAMA C
Fecha: mié 17/04/13

Tarea | División | Progreso | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite
