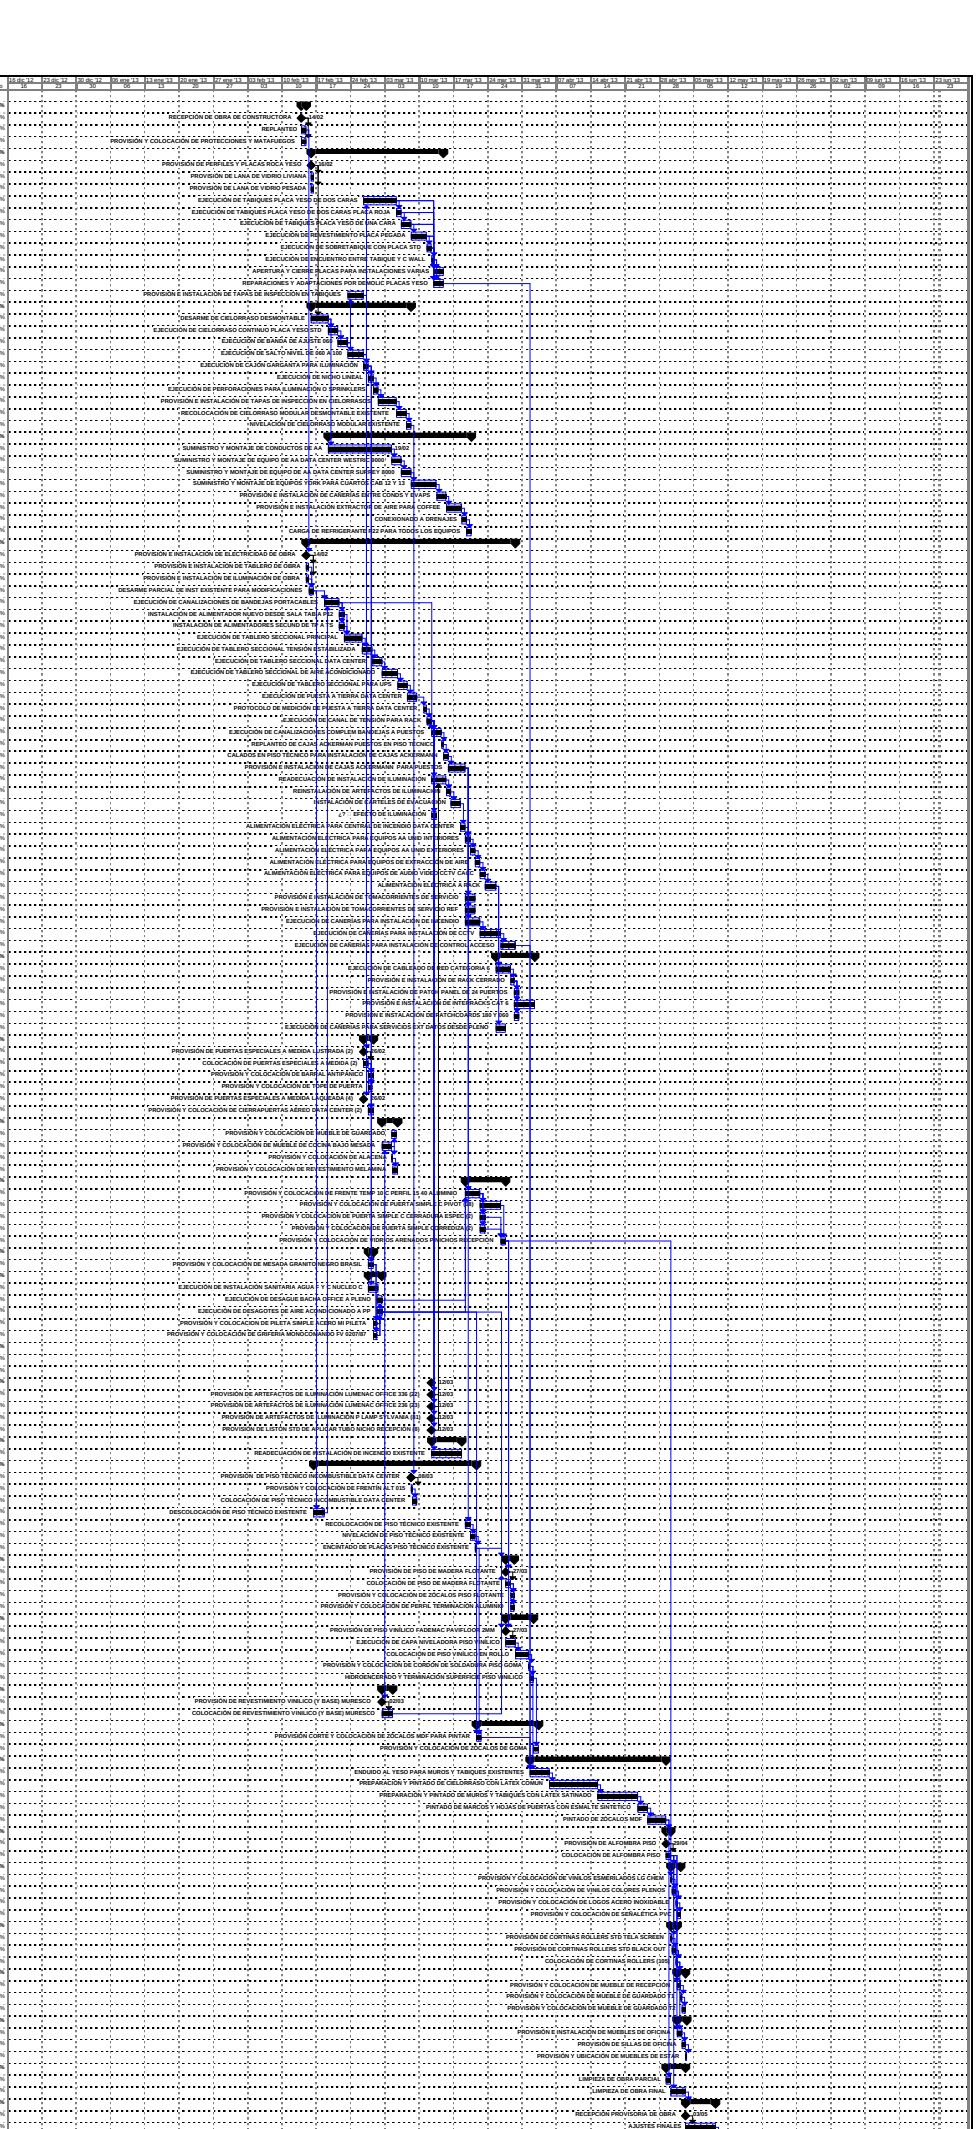Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred	% completado
1						
2	**INICIO DE OBRA**	**1 día**	**jue 14/02/13**	**jue 14/02/13**		**100%**
3	RECEPCIÓN DE OBRA DE CONSTRUCTORA	0 días	jue 14/02/13	jue 14/02/13		100%
4	REPLANTEO	1 día	jue 14/02/13	jue 14/02/13	3	100%
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES Y MATAFUEGOS	1 día	jue 14/02/13	jue 14/02/13	3	100%
6	**TABIQUES DE ROCA DE YESO**	**21,1 días**	**sab 16/02/13**	**sab 16/03/13**		**100%**
7	PROVISIÓN DE PERFILES Y PLACAS ROCA YESO	0 días	sab 16/02/13	sab 16/02/13		100%
8	PROVISIÓN DE LANA DE VIDRIO LAMINA	0,5 días	sab 16/02/13	sab 16/02/13	7	100%
9	PROVISIÓN DE LANA DE VIDRIO PESADA	0,5 días	sab 16/02/13	sab 16/02/13	7	100%
10	EJECUCIÓN DE TABIQUES PLACA YESO DE DOS CARAS	5 días	mar 26/02/13	mar 05/03/13	23	100%
11	EJECUCIÓN DE TABIQUES PLACA YESO DE DOS CARAS PLACA ROJA	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	10	100%
12	EJECUCIÓN DE TABIQUES PLACA YESO DE UNA CARA	2 días	vie 08/03/13	vie 08/03/13	11	100%
13	EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTO PLACA PEGADA	2 días	vie 08/03/13	lun 11/03/13	12	100%
14	EJECUCIÓN DE SOBRETABIQUE CON PLACA STD	1 día	lun 11/03/13	mar 12/03/13	13	100%
15	EJECUCIÓN DE ENCUENTRO ENTRE TABIQUE Y C WALL	0,5 días	mar 12/03/13	mar 12/03/13	14	100%
16	APERTURA Y CIERRE PLACAS PARA INSTALACIONES VARIAS	2 días	mié 13/03/13	jue 14/03/13	10;1	100%
17	REPARACIONES Y ADAPTACIONES POR DEMOLIC PLACAS YESO	2 días	mié 13/03/13	jue 14/03/13	10;1	100%
18	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS DE INSPECCIÓN EN TABIQUES	2 días	sab 23/02/13	mar 26/02/13	22	100%
19	**CIELORRASOS DE PLACA DE ROCA DE YESO**	**14 días**	**sab 16/02/13**	**vie 08/03/13**		**100%**
20	DESARME DE CIELORRASO DESMONTABLE	2 días	sab 16/02/13	mar 19/02/13	7	100%
21	EJECUCIÓN DE CIELORRASO CONTINUO PLACA YESO STD	2 días	lun 18/02/13	jue 21/02/13	20	100%
22	EJECUCIÓN DE BANDA DE AJUSTE DE	2 días	jue 21/02/13	sab 23/02/13	21	100%
23	EJECUCIÓN DE SALTO NIVEL DE 060 A 100	2 días	sab 23/02/13	mar 26/02/13	22	100%
24	EJECUCIÓN DE CAJON GARGANTA PARA ILUMINACIÓN	1 día	mar 26/02/13	mié 27/02/13	23	100%
25	EJECUCIÓN DE NICHO LINEAL	1 día	mié 27/02/13	jue 28/02/13	24	100%
26	EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA ILUMINACIÓN O SPRINKLERS	1 día	jue 28/02/13	vie 01/03/13	25	100%
27	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS DE INSPECCIÓN EN CIELORRASOS	2 días	vie 01/03/13	mar 05/03/13	26	100%
28	RECOLOCACIÓN DE CIELORRASO MODULAR DESMONTABLE EXISTENTE	2 días	mar 05/03/13	jue 07/03/13	27	100%
29	NIVELACIÓN DE CIELORRASO MODULAR EXISTENTE	1 día	jue 07/03/13	vie 08/03/13	28	100%
30	**AIRE ACONDICIONADO**	**24 días**	**mar 19/02/13**	**mié 20/03/13**		**100%**
31	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOS DE AA	10 días	mar 19/02/13	lun 04/03/13	20	100%
32	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE AA DATA CENTER WESTRIC 8000	2 días	lun 04/03/13	mar 05/03/13	31	100%
33	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE AA DATA CENTER SURREY 8000	2 días	mié 06/03/13	vie 08/03/13	32	100%
34	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS YORK PARA CUARTOS CAB 12 Y 13	4 días	vie 08/03/13	mié 13/03/13	33	100%
35	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS ENTRE CONDS Y EVAPS	2 días	mié 13/03/13	vie 15/03/13	34	100%
36	PROVISIÓN E INSTALACIÓN EXTRACTOR DE AIRE PARA COFFEE	2 días	vie 15/03/13	lun 18/03/13	35	100%
37	CONDENSADO A DRENAJES	1 día	lun 18/03/13	mar 19/03/13	36	100%
38	CARGA DE REFRIGERANTE R22 PARA TODOS LOS EQUIPOS	1 día	mar 19/03/13	mar 20/03/13	37	100%
39	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**34,5 días**	**jue 14/02/13**	**vie 29/03/13**		**100%**
40	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DE OBRA	0 días	jue 14/02/13	jue 14/02/13	4	100%
41	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE OBRA	0,5 días	vie 15/02/13	vie 15/02/13	40	100%
42	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE OBRA	0,5 días	vie 15/02/13	vie 15/02/13	40	100%
43	DESARME PARCIAL DE INST EXISTENTE PARA MODIFICACIONES	1 día	vie 15/02/13	sab 16/02/13	41;4	100%
44	EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES DE BANDEJAS PORTACABLES	3 días	lun 18/02/13	jue 21/02/13	43;1	100%
45	INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR NUEVO DESDE SALA TAB A P12	1 día	jue 21/02/13	vie 22/02/13	44	100%
46	INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES SECUNDO DE TP A TS	1 día	jue 21/02/13	vie 22/02/13	44	100%
47	EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL	2 días	vie 22/02/13	mar 26/02/13	45;4	100%
48	EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL TENSIÓN ESTABILIZADA	2 días	mar 26/02/13	jue 28/02/13	47	100%
49	EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL DATA CENTER	2 días	jue 28/02/13	sab 02/03/13	48	100%
50	EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL DE AIRE ACONDICIONADO	2 días	sab 02/03/13	mar 05/03/13	49	100%
51	EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL PARA UPS	2 días	mar 05/03/13	jue 07/03/13	50	100%
52	EJECUCIÓN DE PUESTA A TIERRA DATA CENTER	2 días	jue 07/03/13	sab 09/03/13	51	100%
53	PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA DATA CENTER	0,5 días	lun 11/03/13	lun 11/03/13	52	100%
54	EJECUCIÓN DE CANAL DE TENSIÓN PARA RACK	1 día	lun 11/03/13	mar 12/03/13	53	100%
55	EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES COMPLEM BANDEJAS A PUESTOS	2 días	jue 12/03/13	jue 14/03/13	44;3	100%
56	REPLANTEO DE CAJAS ACKERMAN PUESTOS EN PISO TÉCNICO	0,5 días	jue 14/03/13	jue 14/03/13	55	100%
57	CALADOS EN PISO TÉCNICO PARA INSTALACIÓN DE CAJAS ACKERMAN	1 día	vie 15/03/13	vie 15/03/13	56	100%
58	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJAS ACKERMAN PARA PUESTOS	2 días	lun 18/03/13	mar 19/03/13	57	100%
59	READECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN	3 días	lun 18/03/13	vie 15/03/13	54;1	100%
60	REINSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	1 día	vie 15/03/13	sab 16/03/13	59	100%
61	INSTALACIÓN DE CARTELES DE EVACUACIÓN	0,5 días	sab 16/03/13	lun 18/03/13	60	100%
62	¿? EFECTO DE ILUMINACIÓN	1 día	mar 12/03/13	mié 13/03/13	54	100%
63	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CENTRAL DE INCENDIO DATA CENTER	1 día	lun 18/03/13	mar 19/03/13	61	100%
64	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS AA UNID INTERIORES	1 día	mar 19/03/13	mié 20/03/13	63	100%
65	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS AA UNID EXTERIORES	1 día	jue 20/03/13	jue 21/03/13	64	100%
66	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE	1 día	jue 21/03/13	vie 22/03/13	65	100%
67	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE AUDIO VIDEO CCTV CACS	1 día	vie 22/03/13	sab 23/03/13	66	100%
68	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A RACK	1 día	sab 23/03/13	lun 25/03/13	67	100%
69	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO	2 días	mar 19/03/13	jue 21/03/13	58	100%
70	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO BEP	2 días	mar 19/03/13	jue 21/03/13	58	100%
71	EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PARA INSTALACIÓN DE INCENDIO	3 días	lun 18/03/13	vie 22/03/13	58	100%
72	EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PARA INSTALACIÓN DE CCTV	3 días	vie 22/03/13	mar 26/03/13	71	100%
73	EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PARA INSTALACIÓN DE CONTROL ACCESO	3 días	mar 26/03/13	vie 29/03/13	72	100%
74	**INSTALACIÓN DE DATOS**	**6,5 días**	**lun 25/03/13**	**mar 02/04/13**		**100%**
75	EJECUCIÓN DE CABLEADO DE RED CATEGORIA 6	3 días	lun 25/03/13	jue 28/03/13	68	100%
76	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO	0,5 días	jue 28/03/13	jue 28/03/13	75	100%
77	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	1 día	vie 29/03/13	sab 30/03/13	76	100%
78	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRACKS CAT 6	3 días	vie 29/03/13	mar 02/04/13	76	100%
79	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCHCORDS 180 Y 060	1 día	vie 29/03/13	sab 30/03/13	76	100%
80	EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PARA SERVICIOS EXT DATOS DESDE PLENO	2 días	lun 25/03/13	mar 27/03/13	68	100%
81	**CARPINTERIA**	**2 días**	**mar 26/02/13**	**jue 28/02/13**		**100%**
82	PROVISIÓN DE PUERTAS ESPECIALES A MEDIDA LIQUIDADA (2)	2 días	mar 26/02/13	mar 26/02/13	18	100%
83	COLOCACIÓN DE PUERTAS ESPECIALES A MEDIDA (2)	1 día	mar 26/02/13	mar 27/02/13	82	100%
84	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRAL ANTIPÁNICO	1 día	mar 27/02/13	jue 28/02/13	83	100%
85	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PUERTA	0,5 días	mar 27/02/13	jue 28/02/13	83	100%
86	PROVISIÓN DE PUERTAS ESPECIALES A MEDIDA LIQUIDADA (4)	2 días	mar 26/02/13	mar 26/02/13	18	100%
87	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERRAPUERTAS AÉREO DATA CENTER (2)	1 día	mar 27/02/13	jue 28/02/13	83	100%
88	**MUEBLES DE COCINA**	**2 días**	**sab 02/03/13**	**mar 05/03/13**		**100%**
89	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO	1 día	lun 04/03/13	mar 05/03/13	90	100%
90	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA	0,5 días	sab 02/03/13	lun 04/03/13	104	100%
91	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALACENA	0,5 días	lun 04/03/13	lun 04/03/13	90	100%
92	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO MELAMINA	1 día	lun 04/03/13	mar 05/03/13	91	100%
93	**VIDRIOS**	**7 días**	**mar 19/02/13**	**mié 27/02/13**		**100%**
94	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTE TEMP 10 C PERFIL 15 AL AMINIO	3 días	mar 19/02/13	vie 22/02/13	56;1	100%
95	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA SIMPLE C PIVOT (18)	3 días	vie 22/02/13	mar 26/02/13	94	100%
96	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA SIMPLE C CERRADURA ESPEC (2)	1 día	vie 22/02/13	sab 23/02/13	94	100%
97	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA SIMPLE CORREDIZA (2)	1 día	vie 22/02/13	sab 23/02/13	94	100%
98	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS ARENADOS P NICHOS RECEPCIÓN	1 día	mar 26/02/13	mié 27/02/13	95;3	100%
99	**MESADAS**	**1 día**	**mié 27/02/13**	**jue 28/02/13**		**100%**
100	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA GRANITO NEGRO BRASIL	1 día	mié 27/02/13	jue 28/02/13	24	100%
101	**INSTALACIÓN SANITARIA**	**2,5 días**	**mié 27/02/13**	**sab 02/03/13**		**100%**
102	EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA AGUA F Y C NUCLEO C	2 días	mié 27/02/13	vie 01/03/13	24	100%
103	EJECUCIÓN DE DESAGUE BACHA OFFICE A PLENO	1 día	vie 01/03/13	sab 02/03/13	105	100%
104	EJECUCIÓN DE DESAGÜTES DE AIRE ACONDICIONADO A PF	1 día	vie 01/03/13	sab 02/03/13	105	100%
105	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILETA SIMPLE ACERO MI PILETA	0,5 días	jue 28/02/13	vie 01/03/13	103	100%
106	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA MONOCOMANDO FV 1207/87	0,5 días	jue 28/02/13	vie 01/03/13	100	100%
107	**SPRINKLERS**	**6 días**	**vie 23/11/12**	**vie 30/11/12**		**100%**
108	READECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE SPRINKLERS	5 días	vie 23/11/12	jue 29/11/12		100%
109	PRUEBA Y PURGADO DE CAÑERÍAS SPRINKLERS	1 día	jue 29/11/12	vie 30/11/12	108	100%
110	**ILUMINACIÓN**	**0 días**	**mar 12/03/13**	**mar 12/03/13**		**100%**
111	PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LUMINAC OFFICE 336 (25)	0 días	mar 12/03/13	mar 12/03/13	54	100%
112	PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LUMINAC OFFICE 236 (23)	0 días	mar 12/03/13	mar 12/03/13	54	100%
113	PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN P LAMP SYLVANIA (81)	0 días	mar 12/03/13	mar 12/03/13	54	100%
114	PROVISIÓN DE LISTÓN STD DE APLICAR TUBO NICHO RECEPCIÓN (8)	0 días	mar 12/03/13	mar 12/03/13	54	100%
115	**INCENDIO**	**5 días**	**mar 12/03/13**	**lun 18/03/13**		**100%**
116	READECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE INCENDIO EXISTENTE	5 días	mar 12/03/13	lun 18/03/13	54	100%
117	**PISOS TÉCNICOS**	**20,5 días**	**sab 16/02/13**	**jue 21/03/13**		**100%**
118	PROVISIÓN DE PISO TÉCNICO INCOMBUSTIBLE DATA CENTER	0 días	vie 08/03/13	vie 08/03/13	29	100%
119	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTIN ALT 015	0,5 días	vie 08/03/13	vie 08/03/13	118	100%
120	COLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO INCOMBUSTIBLE DATA CENTER	1 día	vie 08/03/13	sab 09/03/13	119	100%
121	DESCOLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO EXISTENTE	1 día	sab 16/02/13	lun 18/02/13	87	100%
122	RECOLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO EXISTENTE	1 día	lun 18/03/13	mar 20/03/13	84	100%
123	NIVELACIÓN DE PISO TÉCNICO EXISTENTE	1 día	mié 20/03/13	jue 21/03/13	122	100%
124	ENCINTADO DE PLACAS PISO TÉCNICO EXISTENTE	0,5 días	jue 21/03/13	jue 21/03/13	123	100%
125	**PISOS DE MADERA**	**1,5 días**	**mié 27/02/13**	**vie 29/03/13**	**124**	**100%**
126	PROVISIÓN DE PISO DE MADERA FLOTANTE	0 días	mié 27/02/13	mié 27/02/13	88;1	100%
127	COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA FLOTANTE	1 día	mié 27/02/13	jue 28/02/13	126	100%
128	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS PISO FLOTANTE	0,5 días	jue 28/02/13	jue 28/02/13	127	100%
129	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PERFIL TERMINACIÓN ALUMINIO	0,5 días	jue 28/02/13	vie 29/03/13	127	100%
130	**PISOS VINÍLICOS**	**4 días**	**mié 27/02/13**	**mar 02/04/13**		**100%**
131	PROVISIÓN DE PISO VINÍLICO FADEMAC PAWFLOOR 2MM	0 días	mié 27/02/13	mié 27/02/13	104	100%
132	EJECUCIÓN DE CAPA NIVELADORA PISO VINÍLICO	2 días	mié 27/02/13	vie 29/03/13	131	100%
133	COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO EN ROLLO	1 día	vie 29/03/13	lun 01/04/13	132	100%
134	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE SOLDADURA PISO GOMA	0,5 días	lun 01/04/13	lun 01/04/13	133	100%
135	HIDROENCERADO Y TERMINACIÓN SUPERFICIE PISO VINÍLICO	0,5 días	lun 01/04/13	mar 02/04/13	134	100%
136	**REVESTIMIENTOS**	**1 día**	**sab 02/03/13**	**lun 04/03/13**		**100%**
137	PROVISIÓN DE REVESTIMIENTO VINÍLICO (Y BASE) MURESCO	0 días	sab 02/03/13	sab 02/03/13	104	100%
138	COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO VINÍLICO (Y BASE) MURESCO	1 día	sab 02/03/13	lun 04/03/13	137	100%
139	**ZÓCALOS**	**9,5 días**	**jue 21/03/13**	**mié 03/04/13**		**100%**
140	PROVISIÓN CORTE Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS MDF PARA PINTAR	1 día	jue 21/03/13	vie 22/03/13	104	100%
141	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DE GOMA	1 día	mar 02/04/13	mié 03/04/13	135	100%
142	**PINTURA**	**22 días**	**lun 01/04/13**	**lun 29/04/13**		**100%**
143	ENDUIDO AL YESO PARA MUROS Y TABIQUES EXISTENTES	4 días	lun 01/04/13	vie 05/04/13	134	100%
144	PREPARACIÓN Y PINTADO DE CIELORRASO CON LATEX COMÚN	7 días	vie 05/04/13	lun 15/04/13	143	100%
145	PREPARACIÓN Y PINTADO DE MUROS Y TABIQUES CON LATEX SATINADO	7 días	lun 15/04/13	mar 23/04/13	144	100%
146	PINTADO DE MARCOS Y HOJAS DE PUERTAS CON ESMALTE SINTETICO	2 días	mar 23/04/13	jue 25/04/13	145	100%
147	PINTADO DE ZÓCALOS MDF	2 días	jue 25/04/13	lun 29/04/13	146	100%
148	**ALFOMBRAS**	**1 día**	**lun 29/04/13**	**mar 30/04/13**	**147**	**100%**
149	PROVISIÓN DE ALFOMBRA PISO	0 días	lun 29/04/13	lun 29/04/13	147	100%
150	COLOCACIÓN DE ALFOMBRA PISO	1 día	lun 29/04/13	mar 30/04/13	149	100%
151	**GRAFICA**	**2 días**	**mar 30/04/13**	**jue 02/05/13**	**150**	**100%**
152	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILOS ESMERILADOS LG CHEM	0,5 días	mar 30/04/13	mar 30/04/13	98	100%
153	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILOS COLORES PLENOS	0,5 días	mar 30/04/13	mié 01/05/13	152	100%
154	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOGOS ACERO MOVIBLE	0,5 días	mié 01/05/13	mié 01/05/13	153	100%
155	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA PVC	0,5 días	mié 01/05/13	jue 02/05/13	154	100%
156	**CORTINAS**	**1,5 días**	**mar 30/04/13**	**mié 01/05/13**		**100%**
157	PROVISIÓN DE CORTINAS ROLLERS STD TELA SCREEN	0,5 días	mar 30/04/13	mar 30/04/13	150	100%
158	PROVISIÓN DE CORTINAS ROLLERS STD BLACK OUT	0,5 días	mar 30/04/13	mié 01/05/13	157	100%
159	COLOCACIÓN DE CORTINAS ROLLERS (325)	0,5 días	mié 01/05/13	mié 01/05/13	158	100%
160	**MUEBLES ESPECIALES**	**1,5 días**	**mié 01/05/13**	**jue 02/05/13**	**159**	**100%**
161	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE RECEPCIÓN	0,5 días	mié 01/05/13	jue 02/05/13	160	100%
162	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO T1	0,5 días	jue 02/05/13	jue 02/05/13	161	100%
163	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO T2	0,5 días	jue 02/05/13	vie 03/05/13	162	100%
164	**MUEBLES DE OFICINA**	**2 días**	**mié 01/05/13**	**vie 03/05/13**		**100%**
165	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	1 día	mié 01/05/13	jue 02/05/13	159	100%
166	PROVISIÓN DE SILLAS DE OFICINA	0,5 días	jue 02/05/13	jue 02/05/13	165	100%
167	PROVISIÓN Y UBICACIÓN DE MUEBLES DE ESTAR	0,5 días	vie 03/05/13	vie 03/05/13	166	100%
168	**LIMPIEZA**	**4 días**	**lun 29/04/13**	**vie 03/05/13**		**100%**
169	LIMPIEZA DE OBRA PARCIAL	1 día	lun 29/04/13	mar 30/04/13	147	100%
170	LIMPIEZA DE OBRA FINAL	3 días	mar 30/04/13	vie 03/05/13	150	100%
171	**FINAL DE OBRA**	**5 días**	**vie 03/05/13**	**jue 09/05/13**	**170**	**100%**
172	RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA	0 días	vie 03/05/13	vie 03/05/13		100%
173	AJUSTES FINALES	3 días	vie 03/05/13	jue 09/05/13	172	100%
174	RECEPCIÓN FINAL DE OBRA	0 días	jue 09/05/13	jue 09/05/13	173	100%
