Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Etapa 1**	**26 días**	**sáb 10/11/12**	**jue 06/12/12**	
2		Inicio etapa 1	0 días	sáb 10/11/12	sáb 10/11/12	
3		Retiro de artefactos en cielorraso	1 día	sáb 10/11/12	dom 11/11/12	2
4		Descolocación de revest de madera	1 día	sáb 10/11/12	dom 11/11/12	2
5		Demoliciones	2 días	sáb 10/11/12	lun 12/11/12	2
6		Tabiques de roca de yeso	4 días	lun 12/11/12	vie 16/11/12	3;4;5
7		Cielorrasos de roca de yeso	6 días	mié 14/11/12	mar 20/11/12	6FC-2 días
8		Instalacion electrica	10 días	dom 18/11/12	mié 28/11/12	7FC-2 días
9		Cielorraso modular	4 días	lun 19/11/12	vie 23/11/12	7FC-1 día
10		Instalacion cableado estructurado	6 días	dom 25/11/12	sáb 01/12/12	8FC-3 días
11		Aire acondicionado	8 días	dom 18/11/12	lun 26/11/12	7FC-2 días
12		Solados	10 días	mar 20/11/12	vie 30/11/12	7
13		Deteccion de incendio	4 días	dom 25/11/12	jue 29/11/12	8FC-3 días
14		Tabiqueria de sistema	2 días	sáb 01/12/12	lun 03/12/12	5;6;7
15		Muebles especiales	4 días	lun 12/11/12	vie 16/11/12	5
16		Pintura	10 días	mié 21/11/12	sáb 01/12/12	7FC+1 día
17		Grafica	1 día	lun 03/12/12	mar 04/12/12	14
18		Limpieza final	2 días	mar 04/12/12	jue 06/12/12	9;10;11;12;13;14;1
19		Final etapa 1	0 días	jue 06/12/12	jue 06/12/12	18
20		**Etapa 2**	**45 días**	**jue 13/12/12**	**dom 27/01/13**	**19FC+7 días**
21		Inicio Etapa 2	0 días	jue 13/12/12	jue 13/12/12	
22		Retiro de artefactos en cielorraso	1 día	jue 13/12/12	vie 14/12/12	21
23		Cercos y protecciones	2 días	vie 14/12/12	dom 16/12/12	22;21
24		Demoliciones	3 días	dom 16/12/12	mié 19/12/12	23;21
25		Tabiques de roca de yeso	15 días	mié 19/12/12	jue 03/01/13	24;22;23
26		Cielorrasos de roca de yeso	10 días	dom 30/12/12	mié 09/01/13	25FC-4 días
27		Cielorraso modular	10 días	lun 07/01/13	jue 17/01/13	26FC-2 días
28		Instalacion electrica	15 días	mié 19/12/12	jue 03/01/13	25CC
29		Instalacion cableado estructurado	10 días	lun 31/12/12	jue 10/01/13	28FC-3 días
30		Aire acondicionado	22 días	mié 19/12/12	jue 10/01/13	25CC
31		Solados	12 días	jue 10/01/13	mar 22/01/13	29
32		Equipamiento	4 días	lun 21/01/13	vie 25/01/13	31FC-1 día
33		Instalacion de incendio	7 días	mié 19/12/12	mié 26/12/12	25CC
34		Tabiqueria de sistema	8 días	dom 13/01/13	lun 21/01/13	27FC-4 días
35		Pintura	15 días	mié 09/01/13	jue 24/01/13	26
36		Limpieza	2 días	vie 25/01/13	dom 27/01/13	35FC-1 día;27;28;:
37		Final Etapa 2	0 días	dom 27/01/13	dom 27/01/13	36
38		**Etapa 3**	**45 días**	**lun 28/01/13**	**jue 14/03/13**	**36FC+1 día**
39		Inicio Etapa 3	0 días	lun 28/01/13	lun 28/01/13	37
40		Retiro de artefactos de cielorraso	1 día	lun 28/01/13	mar 29/01/13	39;37
41		Demoliciones	3 días	mar 29/01/13	vie 01/02/13	40;39;37
42		Tabiques de roca de yeso	3 días	jue 31/01/13	dom 03/02/13	41FC-1 día;39
43		Cielorrasos de roca de yeso	9 días	vie 01/02/13	dom 10/02/13	42FC-2 días
44		Cielorraso modular	8 días	vie 08/02/13	sáb 16/02/13	43FC-2 días
45		Instalacion electrica	17 días	jue 31/01/13	dom 17/02/13	41FC-1 día
46		Instalación cable estructurado	12 días	jue 14/02/13	mar 26/02/13	45FC-3 días
47		Aire acondicionado	15 días	vie 01/02/13	sáb 16/02/13	41
48		Solados	10 días	mar 26/02/13	vie 08/03/13	46
49		Equipamiento	5 días	mié 06/03/13	lun 11/03/13	48FC-2 días
50		Instalacion de incendio	5 días	jue 31/01/13	mar 05/02/13	41FC-1 día
51		Muebles Especiales	5 días	vie 08/03/13	mié 13/03/13	48
52		Tabiqueria de sistema	2 días	vie 08/03/13	dom 10/03/13	48
53		Pintura	15 días	sáb 09/02/13	dom 24/02/13	43FC-1 día
54		Limpieza	1 día	mié 13/03/13	jue 14/03/13	51;44;45;46;47;48
55		Final Etapa 3	0 días	jue 14/03/13	jue 14/03/13	54

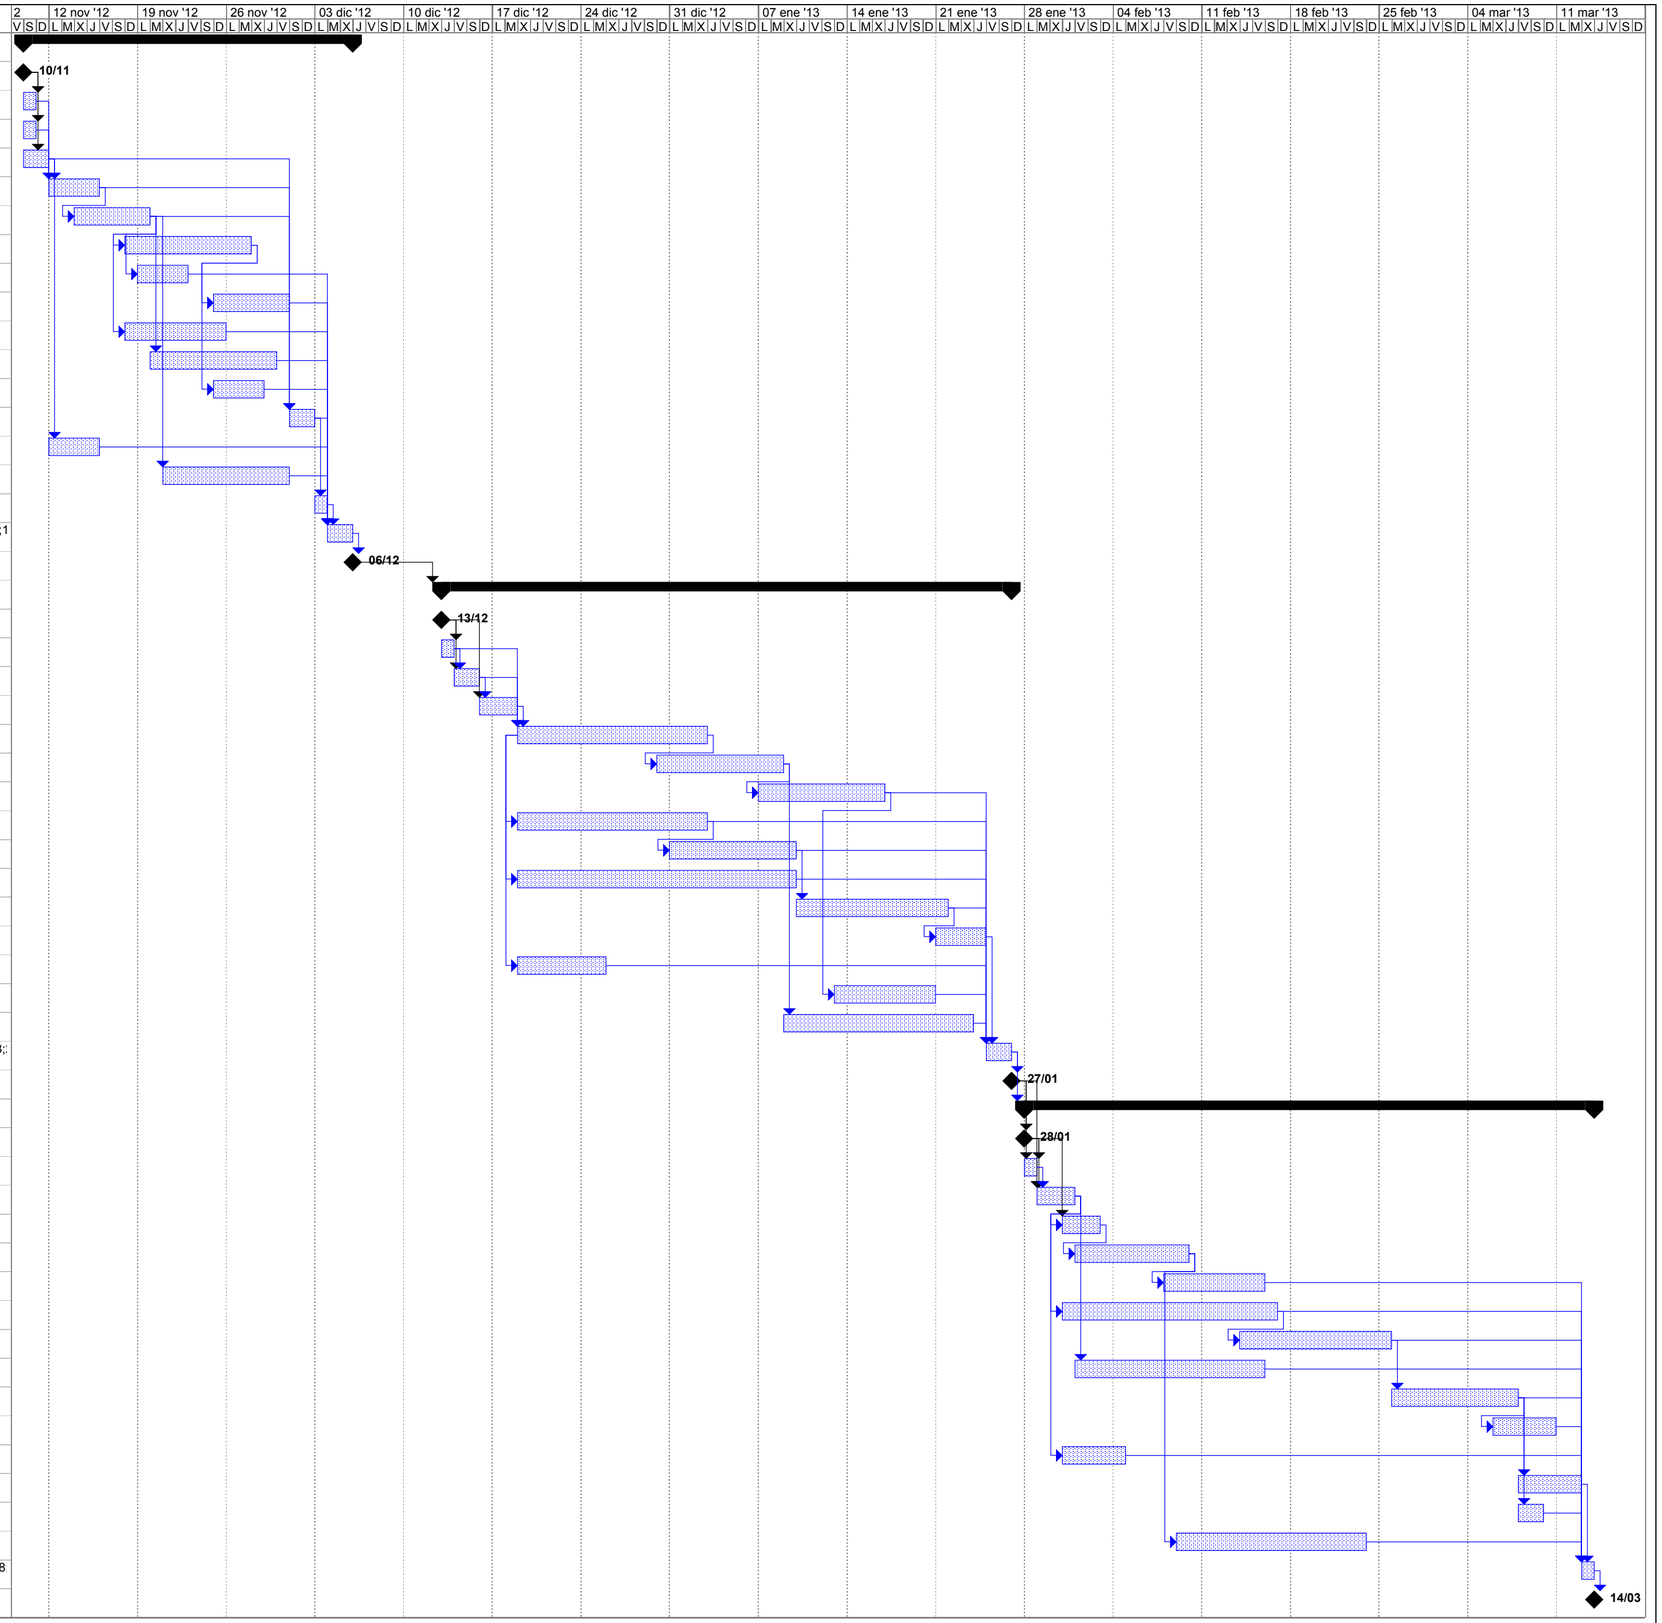

Proyecto: Project-15-10
Fecha: jue 18/10/12

Tarea | Progreso | Resumen | Tareas externas | Fecha límite
División | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo
