CRONOGRAMA GENERAL DE TAREAS Y OBRAS

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
11	✓	**TAREAS PRELIMINARES**	**2 días**	**mar 05/03/13**	**mié 06/03/13**	
12	✓	PRESENTAC.OBRA A ADMINIST EDIF	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	
13	✓	TRAMITACION ART/PROG SEGURIDAD	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	12CC
14	✓	CONDIC. SEGURIDAD/CARTEL/EXTINT	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	12CC
15	✓	REPLANTEOS	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	14CC
16	✓	TABLERO ELECTRICO PROVISORIO	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	15CC
17	✓	LUZ DE OBRA PROVISORIA	1 día	mar 05/03/13	mar 05/03/13	16CC
18	✓	PROTECCIONES AREAS COMUNES	1 día	mié 06/03/13	mié 06/03/13	15;13
19		**OBRA GENERAL**	**106 días**	**mié 06/03/13**	**sáb 06/07/13**	
20	✓	**PISO TECNICO**	**25 días**	**mié 06/03/13**	**mié 03/04/13**	
21	✓	ARMADO PISO TECNICO SECTOR A	10 días	mié 06/03/13	sáb 16/03/13	17
22	✓	ARMADO PISO TECNICO SECTOR B	10 días	mié 20/03/13	sáb 30/03/13	21;42
23	✓	DESARME PISO TECNICO SECTOR A	3 días	lun 18/03/13	mié 20/03/13	21
24	✓	DESARME PISO TECNICO SECTOR B	3 días	lun 01/04/13	mié 03/04/13	22
25	✓	**DURLOCK**	**41 días**	**lun 18/03/13**	**vie 03/05/13**	
26	✓	ARMADO ESTRUCTURA SECTOR A	10 días	lun 18/03/13	jue 28/03/13	21
27	✓	ARMADO ESTRUCTURA SECTOR B	10 días	vie 29/03/13	mar 09/04/13	26
28	✓	AISLACION INTERNA SECTOR A	5 días	vie 29/03/13	mié 03/04/13	26
29	✓	AISLACION INTERNA SECTOR B	5 días	mié 10/04/13	lun 15/04/13	27
30	✓	EMPLACADO 1° CARA SECTOR A	8 días	jue 04/04/13	vie 12/04/13	28
31	✓	EMPLACADO 1° CARA SECTOR B	8 días	mar 16/04/13	mié 24/04/13	29
32	✓	EMPLACADO 2° CARA SECTOR A	8 días	sáb 13/04/13	lun 22/04/13	30
33	✓	EMPLACADO 2° CARA SECTOR B	8 días	jue 25/04/13	vie 03/05/13	31
34		**CANALIZACIONES**	**78 días**	**mié 06/03/13**	**mar 04/06/13**	
35	✓	**BANDEJAS**	**19 días**	**jue 21/03/13**	**jue 11/04/13**	
36	✓	TENDIDO BANDEJAS BAJO PISO TECNICO S/A	7 días	jue 21/03/13	jue 28/03/13	23
37	✓	TENDIDO BANDEJAS BAJO PISO TECNICO S/B	7 días	jue 04/04/13	jue 11/04/13	24
38	✓	TENDIDO BANDEJAS EN DATA CENTERS	6 días	jue 21/03/13	vie 05/04/13	23
39	✓	**ELECTRICIDAD /ILUMINACION**	**40 días**	**mié 06/03/13**	**sáb 20/04/13**	
40	✓	CAÑERIA INTERNA TABIQUES S/A	5 días	jue 04/04/13	mar 09/04/13	28
41	✓	CAÑERIA INTERNA TABIQUES S/B	5 días	mar 16/04/13	sáb 20/04/13	29;43
42	✓	CANALIZACIONES AEREAS S/B	12 días	mié 06/03/13	mar 19/03/13	17
43	✓	CANALIZACIONES AEREAS S/A	12 días	mié 20/03/13	mar 02/04/13	42
44	✓	**CANALIZACIONES DE INSTALACIONES ANEXAS**	**15 días**	**mié 03/04/13**	**vie 19/04/13**	
45	✓	PARA CCTV	7 días	mié 03/04/13	mié 10/04/13	43
46	✓	PARA ALARMAS	7 días	mié 03/04/13	mié 10/04/13	43
47	✓	PARA CONTROL DE ACCESOS	10 días	mié 03/04/13	sáb 13/04/13	43
48	✓	VARIAS ANEXAS	5 días	lun 15/04/13	vie 19/04/13	45;46
49		**AIRE ACONDICIONADO GENERAL**	**78 días**	**mié 06/03/13**	**mar 04/06/13**	
50	✓	MONTAJE CONDUCTOS S/A	15 días	sáb 23/03/13	mar 09/04/13	51
51	✓	MONTAJE CONDUCTOS S/B	15 días	mié 06/03/13	vie 22/03/13	17
52	✓	AISLACIONES/TERMINACIONES	20 días	mié 10/04/13	jue 02/05/13	50
53	✓	PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PRECISIÓN	1 día	mar 21/05/13	mar 21/05/13	52FC días
54		INSTALACION DE EQUIPOS DE PRECISION	7 días	mié 22/05/13	mié 29/05/13	53
55		APROBACION FABRICANTE EQUIPOS	5 días	jue 30/05/13	mar 04/06/13	54
56	✓	**CONEXIONES EQUIPOS EXISTENTES**	**32 días**	**mié 06/03/13**	**jue 11/04/13**	
57	✓	CONEXIONADO EQUIPOS EXISTENTES	8 días	mié 13/03/13	jue 21/03/13	17CC días
58	✓	DESAGUES DE CONDENSADO S/A	12 días	sáb 23/03/13	vie 05/04/13	57;64
59	✓	DESAGUES CONDENSADO S/B	12 días	mié 06/03/13	mar 19/03/13	17
60	✓	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	5 días	sáb 06/04/13	jue 11/04/13	58;59
61	✓	**INSTALACION SANITARIA NORMAL**	**15 días**	**mié 06/03/13**	**vie 22/03/13**	
62	✓	CONEXIONES DESAGUES COFFE	7 días	mié 06/03/13	mié 13/03/13	17
63	✓	CONEXIONES ALIMENTACIONES COFFE	5 días	jue 14/03/13	mar 19/03/13	62
64	✓	TERMINACIONES INSTAL. SANITARIA	3 días	mié 20/03/13	vie 22/03/13	63
65		**ALBAÑILERIA GENERAL**	**15 días**	**mié 06/03/13**	**vie 22/03/13**	
66	✓	DESARMES PROPIOS	3 días	mié 06/03/13	vie 08/03/13	17
67	✓	CONTRAPISOS LIVIANOS	7 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13	66
68		REFUERZOS BAJO PISO	3 días	lun 18/03/13	mié 20/03/13	67
69	✓	REFUERZOS SOBRE CIELORRASOS S/B	5 días	sáb 09/03/13	jue 14/03/13	66
70	✓	REFUERZOS SOBRE CIELORRASOS S/A	5 días	lun 18/03/13	vie 22/03/13	21
71		COLOCACIONES COFFE BREAKS	4 días	lun 18/03/13	jue 21/03/13	67
72	✓	REFORMAS EN RECINTOS EXISTENTES	7 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13	66
73		**DETECCION DE INCENDIOS**	**22 días**	**mié 06/03/13**	**sáb 30/03/13**	
74	✓	CANALIZACIONES SECTOR A	7 días	jue 14/03/13	jue 21/03/13	75
75		CANALIZACIONES SECTOR B	7 días	mié 06/03/13	mié 13/03/13	17
76	✓	CABLEADOS	5 días	vie 22/03/13	mié 27/03/13	74;75
77		TERMINACIONES	3 días	jue 28/03/13	sáb 30/03/13	76
78		**EXTINCION DE INCENDIOS**	**33 días**	**mié 06/03/13**	**vie 12/04/13**	
79	✓	CANALIZACIONES SECTOR A	12 días	mié 20/03/13	mar 02/04/13	80
80	✓	CANALIZACIONES SECTOR B	12 días	mié 06/03/13	mar 19/03/13	17
81		ACCESORIOS GENERALES	5 días	mié 03/04/13	lun 08/04/13	79
82	✓	CONEXIONADO FINAL	2 días	mar 09/04/13	mié 10/04/13	81
83		PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	2 días	jue 11/04/13	vie 12/04/13	82
84	✓	**CIELORRASOS CONTINUOS**	**36 días**	**mié 06/03/13**	**mar 16/04/13**	
85	✓	C. CONT.-ESTRUCTURAS S/A	9 días	mar 19/03/13	jue 28/03/13	86
86	✓	C. CONT.-ESTRUCTURAS S/B	11 días	mié 06/03/13	lun 18/03/13	15
87	✓	C. CONT.-EMPLACADOS	12 días	vie 29/03/13	jue 11/04/13	85
88	✓	C.CONT.-TERMINACIONES	4 días	vie 12/04/13	mar 16/04/13	87
89		**CIELORRASOS DESMONTABLES**	**26 días**	**mié 06/03/13**	**jue 04/04/13**	
90		C.DESM.-ESTRUCTURAS S/A	7 días	jue 14/03/13	jue 21/03/13	91
91		C. DESM.-ESTRUCTURAS S/B	7 días	mié 06/03/13	mié 13/03/13	15
92		C.DESM.-COLOCACION PLACAS DESMONTABLES	7 días	jue 28/03/13	jue 04/04/13	93
93		C.DESM.-TERMINACIONES	5 días	vie 22/03/13	mié 27/03/13	90
94		**TABIQUERIA VIDRIADA**	**75 días**	**sáb 09/03/13**	**mar 04/06/13**	
95	✓	TABIQUERIA VIDRIADA-CONTRATACION /LIMITE	1 día	sáb 09/03/13	sáb 09/03/13	17CC días
96	✓	TAB. VIDR.-REPLANTEOS ESPECIFICOS	2 días	lun 11/03/13	mar 12/03/13	15;95
97	✓	TAB. VIDR.-FABRICACION	50 días	mié 13/03/13	jue 09/05/13	96
98		TAB. VIDR.-ARMADO EN OBRA	20 días	vie 10/05/13	sáb 01/06/13	97
99		TAB. VIDR.-TERMINACIONES	2 días	lun 03/06/13	mar 04/06/13	98
100		**CRISTALES**	**26 días**	**mié 10/04/13**	**jue 09/05/13**	
101	✓	CRISTALES-REPLANTEO ESPECIFICO	1 día	mié 10/04/13	mié 10/04/13	26;27
102		CRISTALES-FABRICACION	15 días	jue 11/04/13	sáb 27/04/13	101
103		CRISTALES-MONTAJE EN OBRA	10 días	lun 29/04/13	jue 09/05/13	102
104		**CABLEADO ENERGIA**	**47 días**	**lun 01/04/13**	**vie 24/05/13**	
105	✓	CABLEADO ENERGIA-TENDIDO GENERAL	20 días	lun 01/04/13	mar 23/04/13	21;22
106		CABLEADOENERGIA-TERMINACIONES	7 días	mié 24/04/13	mié 01/05/13	105
107		CABLEADO ENERGIA-PRUEBAS DEL SISTEMA	5 días	lun 20/05/13	vie 24/05/13	106;1
108		**CABLEADO ILUMINACION**	**45 días**	**mié 03/04/13**	**vie 24/05/13**	
109	✓	CABLEADO ILUMINACION-TENDIDO GENERAL	20 días	mié 03/04/13	jue 25/04/13	42;43
110		CABLEADO ILUMINACION-TERMINACIONES	12 días	vie 26/04/13	jue 09/05/13	109
111		PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	1 día	vie 10/05/13	vie 10/05/13	110
112		CABLEADO Y CONEXIONADO DE GE	7 días	sáb 11/05/13	sáb 18/05/13	111
113		CABLEADO ILUMINACION-PRUEBAS DEL SISTEMA	5 días	lun 20/05/13	vie 24/05/13	112
114		**CABLEADO ESTRUCTURADO**	**15 días**	**vie 12/04/13**	**lun 29/04/13**	
115	✓	CABLEADO ESTRUCTURADO-TENDIDO GENERAL	7 días	vie 12/04/13	vie 19/04/13	36;37
116		CABLEADO ESTRUCTURADO-TERMINACIONES	3 días	sáb 20/04/13	mar 23/04/13	115
117		CABL. ESTRUCT.-PRUEBAS DEL SISTEMA /CERTIFICACIONES	5 días	mié 24/04/13	lun 29/04/13	116
118		**CABLEADOS ANEXOS**	**18 días**	**vie 12/04/13**	**jue 02/05/13**	**36;37**
119	✓	CABLEADOS ANEXOS-TENDIDO GENERAL	10 días	vie 12/04/13	mar 23/04/13	36;37
120		CABLEADOS ANEXOS-TERMINACIONES	3 días	mié 24/04/13	vie 26/04/13	119
121		CABLEADOS ANEXOS-PRUEBAS DEL SISTEMA	5 días	sáb 27/04/13	jue 02/05/13	120
122		**PISOS CERAMICOS**	**16 días**	**lun 18/03/13**	**jue 04/04/13**	
123		COLOCACIONES	12 días	lun 18/03/13	sáb 30/03/13	67
124		TERMINACIONES	4 días	lun 01/04/13	jue 04/04/13	123
125		**REVESTIMIENTOS CERAMICOS**	**7 días**	**lun 01/04/13**	**lun 08/04/13**	
126		COLOCACIONES	5 días	lun 01/04/13	vie 05/04/13	123
127		TERMINACIONES	2 días	sáb 06/04/13	lun 08/04/13	126
128		**PINTURA**	**53 días**	**sáb 04/05/13**	**jue 04/07/13**	
129		PINTURA-ENDUIDOS Y PREPARACIONES GENERALES	12 días	sáb 04/05/13	vie 17/05/13	32;33
130		PINTURA-PINTURA GENERAL	27 días	sáb 18/05/13	mar 18/06/13	129
131		PINTURA-TERMINACIONES	14 días	mié 19/06/13	jue 04/07/13	130
132		**ZOCALOS GENERALES**	**14 días**	**sáb 04/05/13**	**lun 20/05/13**	
133		ZOCALOS-COLOCACIONES	7 días	sáb 04/05/13	sáb 11/05/13	32;33
134		ZOCALOS-TERMINACIONES Y PINTURA	7 días	lun 13/05/13	lun 20/05/13	133
135		**ARTEFACTOS ILUMINACION**	**30 días**	**mié 17/04/13**	**mar 21/05/13**	
136		ARTS. ILUMINACION-COLOCACIONES	14 días	mié 17/04/13	jue 02/05/13	88
137		ARTS. ILUMINACION-CONEXIONADOS	16 días	vie 03/05/13	mar 21/05/13	136
138		**ALFOMBRA**	**101 días**	**sáb 09/03/13**	**jue 04/07/13**	
139	✓	ALFOMBRA-CONTRATACION /LIMITE	1 día	sáb 09/03/13	sáb 09/03/13	17CC días
140	✓	ALFOMBRA-INGRESO A OBRA - FECHA LIMITE	1 día	mié 19/06/13	mié 19/06/13	130;1
141	✓	ALFOMBRA-SUBIDA A OBRA	2 días	jue 20/06/13	vie 21/06/13	140
142		ALFOMBRA-COLOCACIONES	7 días	sáb 22/06/13	sáb 29/06/13	141;1
143		ALFOMBRA-TERMINACIONES	4 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13	142
144		**GRAFICA**	**18 días**	**sáb 18/05/13**	**vie 07/06/13**	
145		GRAFICA-INSTALACION EN OBRA	14 días	sáb 18/05/13	lun 03/06/13	103;1
146		GRAFICA-TERMINACIONES	4 días	mar 04/06/13	vie 07/06/13	145
147		**EQUIPAMIENTO ESPECIAL**	**13 días**	**mié 19/06/13**	**mié 03/07/13**	
148		INGRESO Y SUBIDA A OBRA	3 días	mié 19/06/13	vie 21/06/13	130
149		MONTAJE Y AJUSTES	7 días	sáb 22/06/13	sáb 29/06/13	148
150		TERMINACIONES	3 días	lun 01/07/13	mié 03/07/13	149
151		**LIMPIEZA DE OBRA**	**106 días**	**mié 06/03/13**	**sáb 06/07/13**	
152		LIMPIEZA DE OBRA DIARIA	106 días	mié 06/03/13	sáb 06/07/13	15
153		**EQUIPAMIENTO OPERATIVO**	**19 días**	**lun 01/07/13**	**lun 22/07/13**	
154		EQUIPAMIENTO STAFF OPERATIVO / ARMADOS	12 días	lun 01/07/13	sáb 13/07/13	142
155		EQUIPAMIENTO GERENCIAL / ARMADOS	12 días	lun 01/07/13	sáb 13/07/13	142
156		CABLEADO ELECTRICO Y ESTRUCTURADO EN PUESTOS DE TRABAJO	7 días	lun 15/07/13	lun 22/07/13	155
157		EQUIPAMIENTO ESPECIAL / ARMADOS	4 días	vie 05/07/13	mar 09/07/13	143
158		SILLAS -SILLONES -VARIOS /ENTREGA EN OBRA	3 días	vie 12/07/13	lun 15/07/13	154FI días;1 días
159		TERMINACIONES DE CONEXIONADOS	3 días	lun 15/07/13	mié 17/07/13	154;1
160		**MUDANZA GENERAL**	**321 días?**	**lun 16/07/12**	**mié 24/07/13**	
161		INICIO TAREAS	1 día	lun 15/07/13	lun 15/07/13	159C
162		LIMPIEZA FINAL	8 días	mar 16/07/13	mié 24/07/13	161
163		INSTRUCTIVOS	3 días	mar 16/07/13	jue 18/07/13	161
164		ENVIO CAJAS / CANASTOS	1 día	jue 18/07/13	jue 18/07/13	163FI día
165		TRASLADO	3 días	vie 19/07/13	lun 22/07/13	159FI días;1
166		EN OBRA	2 días	mar 23/07/13	mié 24/07/13	165
167			1 día?	lun 16/07/12	lun 16/07/12	

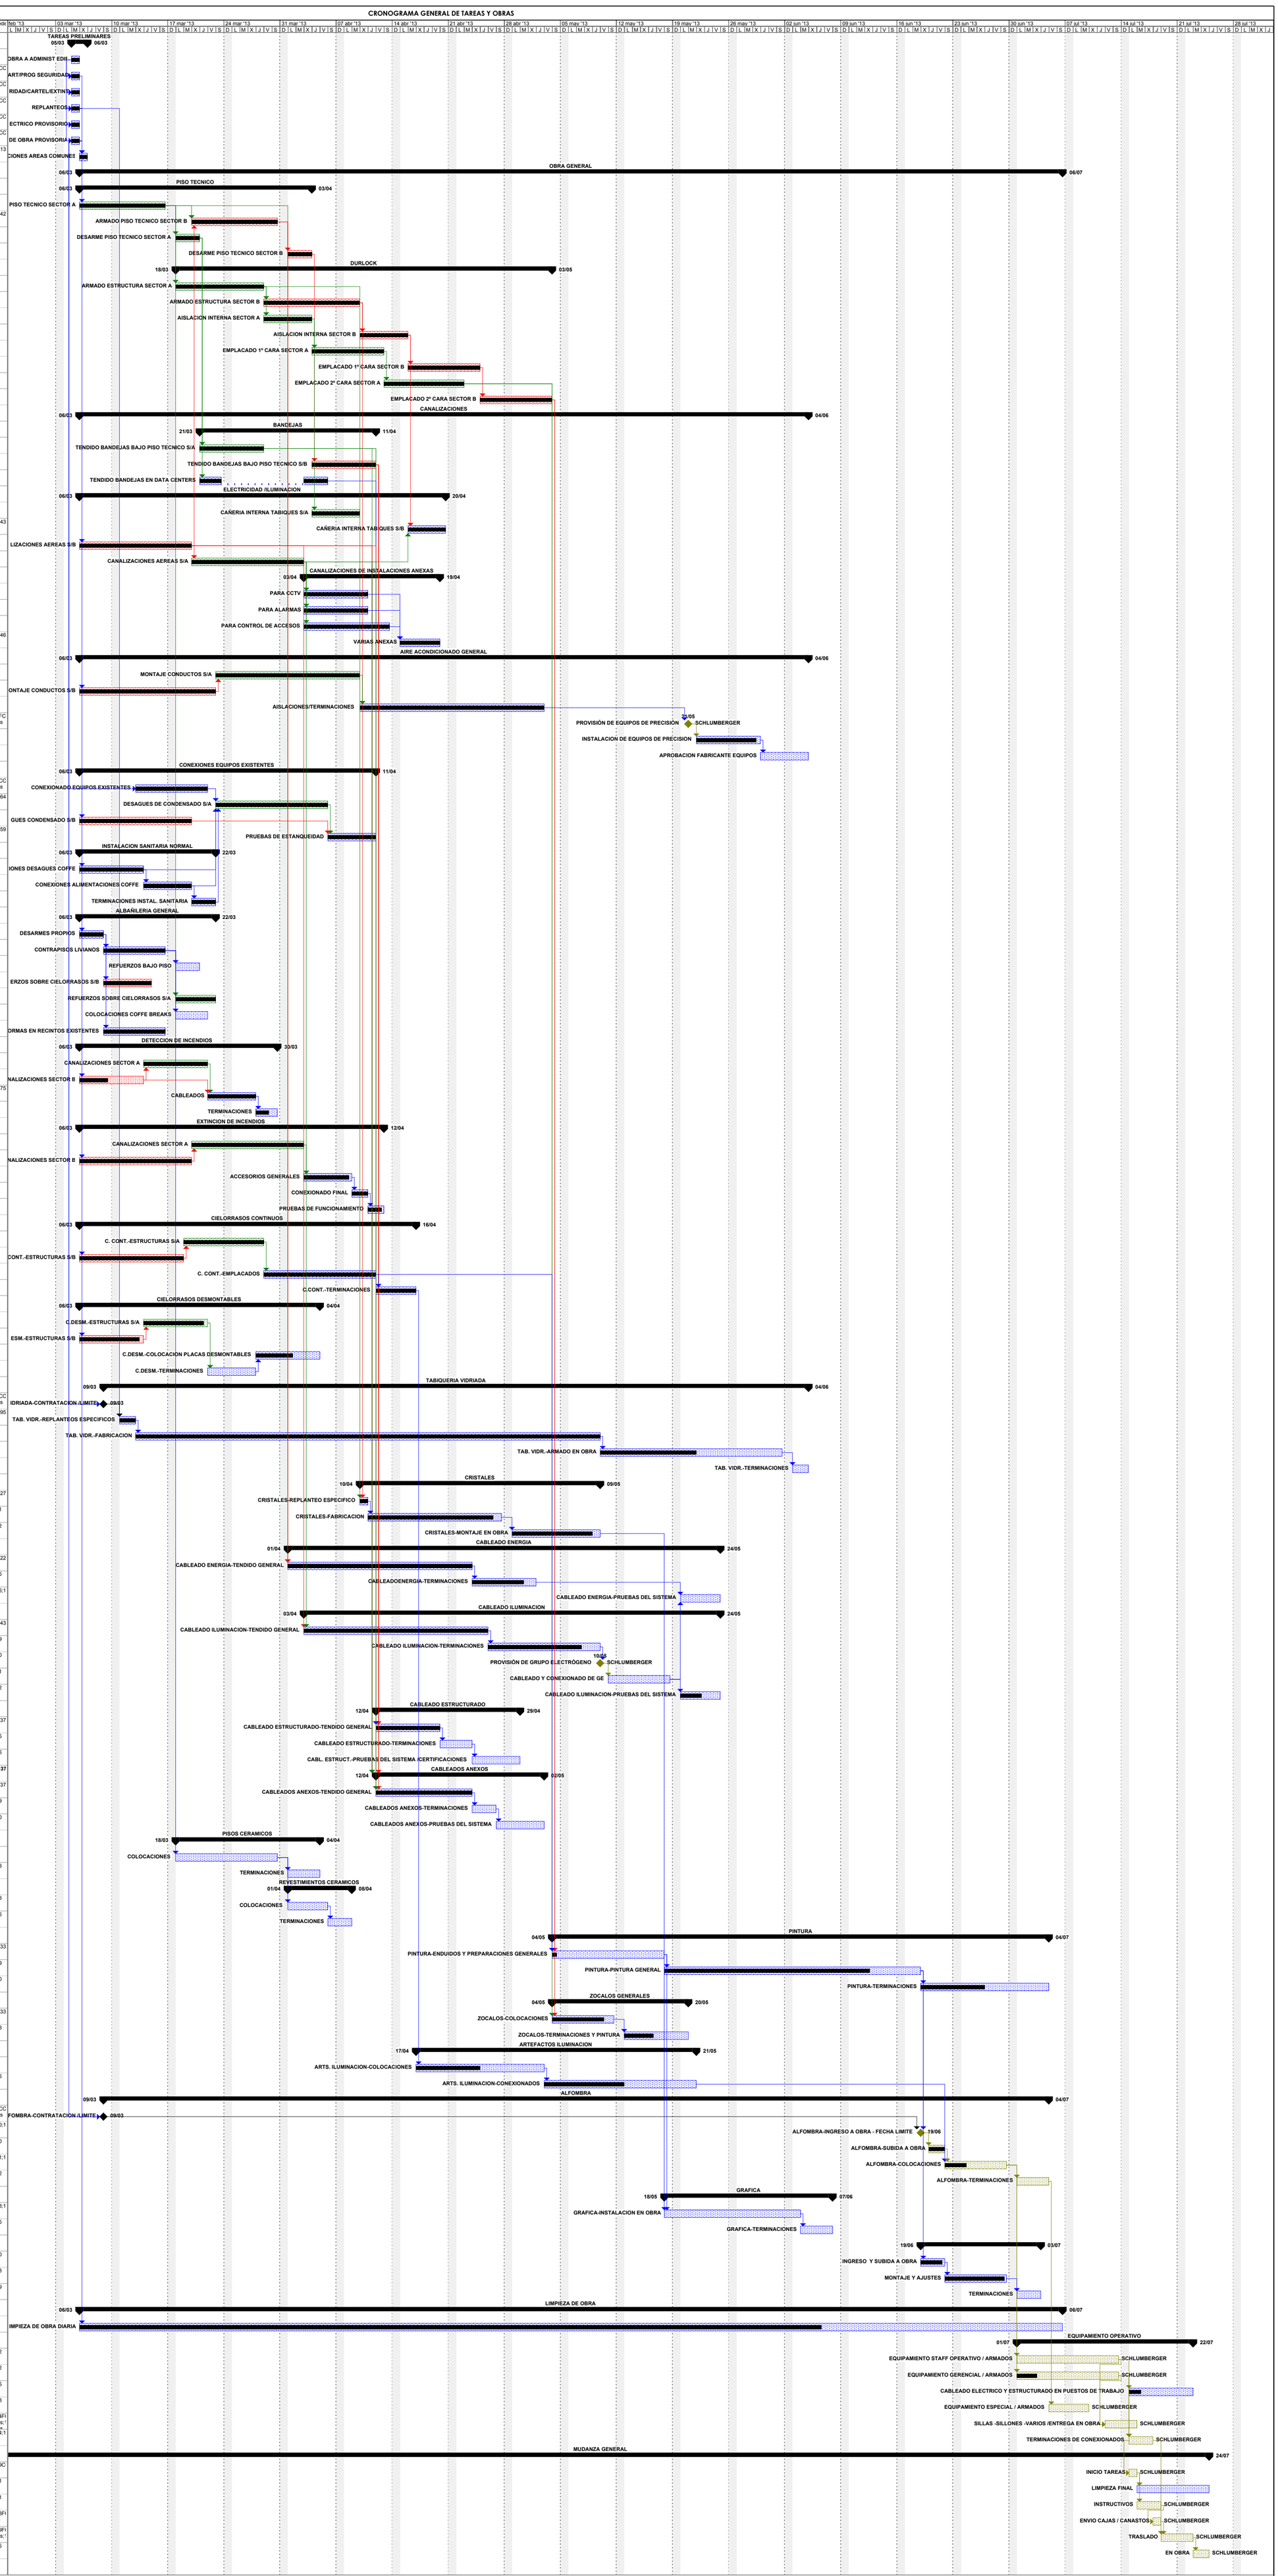

Proyecto: SLB - CRONOGRAMA G
Fecha: jue 21/11/13

Tarea | División | Progreso | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite
