Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	**Inicio**	**86 días**	**jue 27/06/13**	**jue 03/10/13**		
2	Aprobación del presupuesto	1 día	jue 27/06/13	vie 28/06/13		Autorización de ingreso al edi
3	Coordinación de inicio de obra	4 días	vie 28/06/13	mar 02/07/13	2	
4	ART / SeH	5 días	lun 01/07/13	dom 07/07/13	3FC-1 día	Pedido de documentación a c
5	Inicio de obra	1 día	dom 07/07/13	lun 08/07/13	4	Replanteos / Inicio de trabajos
6	**Demoliciones**	**30 días**	**lun 08/07/13**	**dom 11/08/13**		
7	Total del piso	30 días	lun 08/07/13	dom 11/08/13	5	Horario nocturno y fines de se
8	**Albañilería**	**23,5 días**	**jue 18/07/13**	**mié 14/08/13**		
9	Canalizaciones Grales	10 días	jue 18/07/13	mar 30/07/13	7FC-21 días	
10	Contrapisos + carpetas	10 días	mar 23/07/13	sáb 03/08/13	9FC-6 días	Incrementaron los m2 de cont
11	Losa+ contrapiso+ carpeta- (Vicio oculto)	4 días	sáb 10/08/13	mié 14/08/13		
12	Revoques	7 días	mar 30/07/13	mié 07/08/13	10FC-4 días	
13	**instalaciones/Canalizaciones Sanitarias**	**9 días**	**sáb 03/08/13**	**mar 13/08/13**		
14	Tendido de cañerías y prueba hidráulica	6 días	sáb 03/08/13	sáb 10/08/13	10	
15	Tapado	3 días	sáb 10/08/13	mar 13/08/13	14	
16	**instalaciones/Canalizaciones Electricas**	**16 días**	**dom 11/08/13**	**jue 29/08/13**		
17	Canalizaciones	7 días	dom 11/08/13	lun 19/08/13	7	
18	Cableado	9 días	lun 19/08/13	jue 29/08/13	17	
19	**instalaciones/Canalizaciones Baja Tensión**	**35 días**	**vie 26/07/13**	**mié 04/09/13**		
20	Canalizaciones	10 días	vie 26/07/13	mié 07/08/13	7FC-14 días	
21	Cableado + Armado de racks y certificaciones	25 días	mié 07/08/13	mié 04/09/13	20	
22	**instalaciones/Canalizaciones Seguridad**	**9 días**	**vie 16/08/13**	**lun 26/08/13**		
23	Canalizaciones	4 días	vie 16/08/13	mar 20/08/13	17FC-3 días	
24	Cableado	5 días	mar 20/08/13	lun 26/08/13	23	
25	**instalaciones/Canalizaciones Aire acondicionado**	**36,5 días**	**lun 29/07/13**	**dom 08/09/13**		
26	Fabricación de ductos	10 días	lun 29/07/13	vie 09/08/13	7FC-12 días	
27	Montaje de conductos	5 días	vie 09/08/13	jue 15/08/13	26	
28	Entrega de los equipos	15 días	mié 14/08/13	sáb 31/08/13	7;8	
29	Montaje con las cañerías de cobre: 3 dias.	3 días	sáb 31/08/13	mié 04/09/13	28	
30	Montaje de equipos, Puesta en marcha y regulación	4 días	mié 04/09/13	dom 08/09/13	29	
31	**Tabiquería**	**8 días**	**dom 11/08/13**	**mar 20/08/13**		
32	Estructura + Emplacado	4 días	dom 11/08/13	vie 16/08/13	7	
33	Emplacado + terminaciones	6 días	mié 14/08/13	mar 20/08/13	32FC-2 días	
34	**Cielorrasos**	**7 días**	**vie 16/08/13**	**sáb 24/08/13**		
35	Continuos, cajones, gargantas	7 días	vie 16/08/13	sáb 24/08/13	32	
36	**Pintura**	**16 días**	**mar 20/08/13**	**dom 08/09/13**		
37	Cielorrasos/ Losas	8 días	sáb 24/08/13	lun 02/09/13	35	
38	Tabiquerías	16 días	mar 20/08/13	dom 08/09/13	33	
39	**Revestimientos**	**6 días**	**mar 20/08/13**	**mar 27/08/13**		
40	Colocación ceramicos/Porcellanato	6 días	mar 20/08/13	mar 27/08/13	33	Piso / pared
41	**Artefactos Iluminación**	**5 días**	**lun 02/09/13**	**dom 08/09/13**		
42	Colocación de artefactos	5 días	lun 02/09/13	dom 08/09/13	37;35	
43	**Frente de oficinas**	**25 días**	**vie 16/08/13**	**vie 13/09/13**		
44	Replanteo	1 día	vie 16/08/13	sáb 17/08/13	32	
45	Colocación	4 días	lun 09/09/13	vie 13/09/13	44FC+20 días	
46	**Carpinterías**	**3 días**	**dom 08/09/13**	**mié 11/09/13**		
47	Colocación	3 días	dom 08/09/13	mié 11/09/13	33;38	
48	**Solados**	**14 días**	**mar 03/09/13**	**jue 19/09/13**		
49	Colocación	14 días	mar 03/09/13	jue 19/09/13	37FC-2 días;38FC-	Alfombras, cerámicos, maderi
50	**Artefactos sanitarios**	**4 días**	**mar 27/08/13**	**dom 01/09/13**		
51	Colocación, empastinado, terminaciones	4 días	mar 27/08/13	dom 01/09/13	40	
52	**Grafica**	**26 días**	**sáb 17/08/13**	**lun 16/09/13**		
53	Replanteo	1 día	sáb 17/08/13	dom 18/08/13	44	
54	Colocación	2 días	vie 13/09/13	lun 16/09/13	45	
55	**Cortinas**	**19 días**	**vie 16/08/13**	**vie 06/09/13**		
56	Replanteo	1 día	vie 16/08/13	sáb 17/08/13	32	
57	Colocación	3 días	mar 03/09/13	vie 06/09/13	56FC+15 días	
58	**Mobiliario**	**16 días**	**lun 09/09/13**	**vie 27/09/13**		
59	Armado	16 días	lun 09/09/13	vie 27/09/13	49FC-9 días	
60	**Limpieza**	**76 días**	**lun 08/07/13**	**jue 03/10/13**		
61	Diaria	70 días	lun 08/07/13	jue 26/09/13	5	
62	Final	6 días	jue 26/09/13	jue 03/10/13	61	

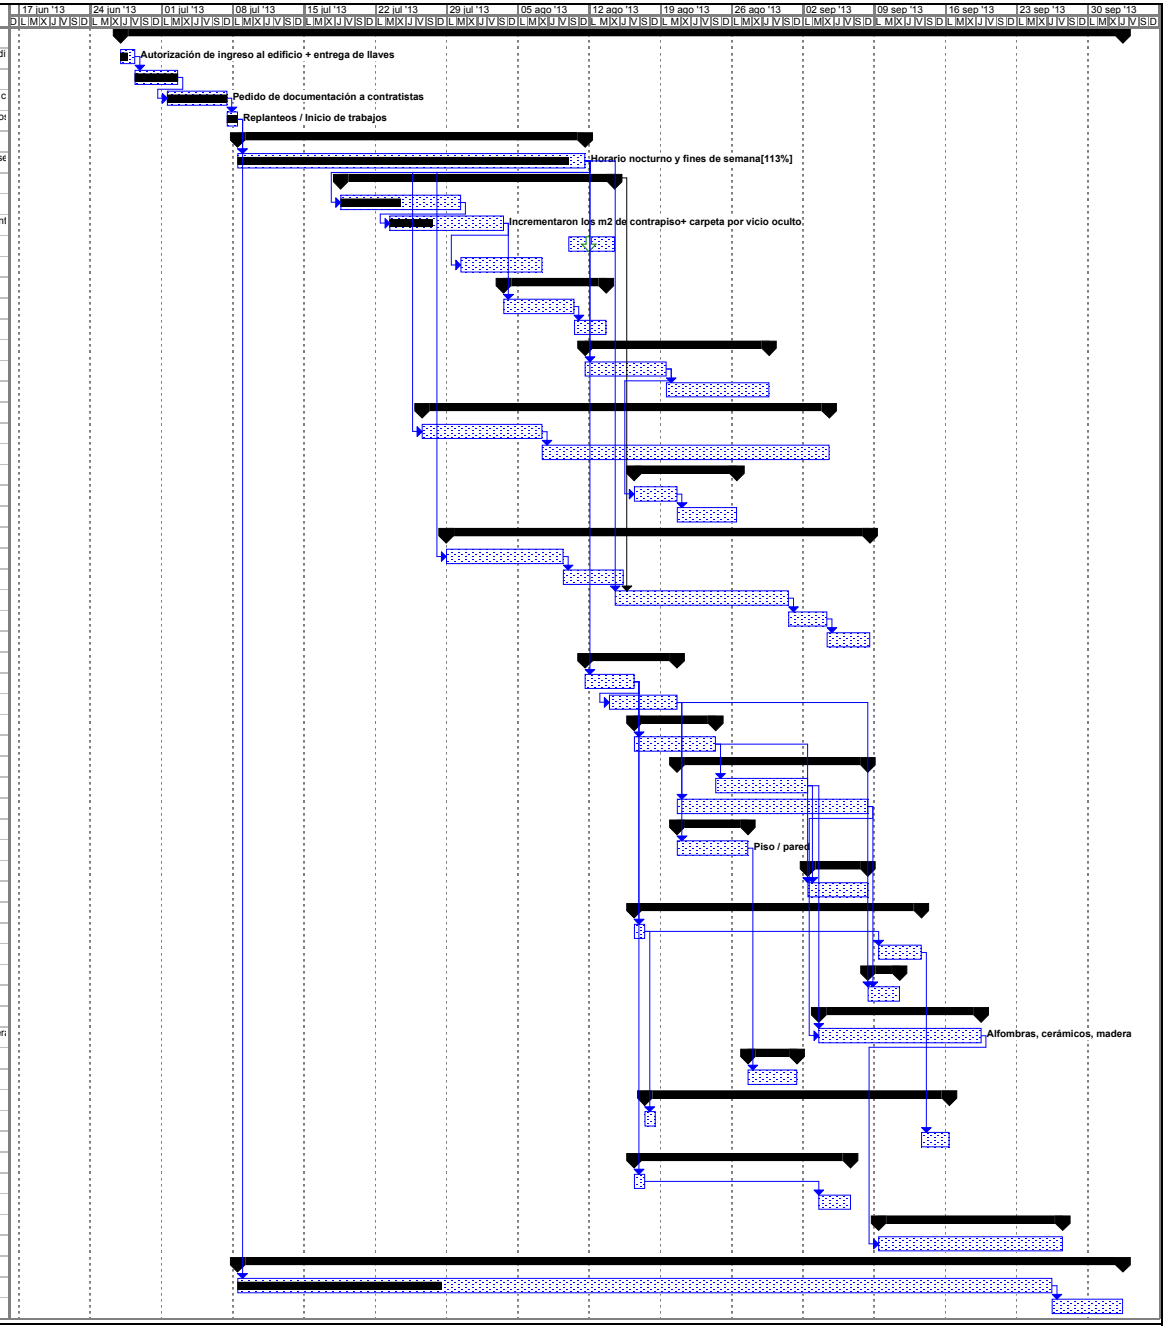

Proyecto: Proyect tercer semana.m
Fecha: jue 21/11/13

Tarea | Progreso | Resumen | Tareas externas | Fecha límite
División | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo
