ANEXO III

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**OBRA TW2**	**56 días**	**mar 01/04/14**	**dom 22/06/14**
2	**Preliminares**	**1 día**	**mar 01/04/14**	**mar 01/04/14**
3	Protecciones pallier e interior unidad, cierre provisorio hall	1 día	mar 01/04/14	mar 01/04/14
24	**Piso Técnico**	**10 días**	**mié 02/04/14**	**mar 22/04/14**
25	PT Replanteo	1 día	mié 02/04/14	mié 02/04/14
26	PT Instalación	8 días	vie 04/04/14	mar 22/04/14
11	**Eléctrica**	**52 días**	**jue 03/04/14**	**vie 20/06/14**
13	EL Canalizaciones bajo piso técnico	3 días	jue 03/04/14	lun 07/04/14
12	EL Canalizaciones sobre cielorraso	6 días	mar 08/04/14	mar 22/04/14
14	EL Canalizaciones en tabiques	2 días	mar 06/05/14	mié 07/05/14
15	EL Cableados	4 días	jue 08/05/14	mar 13/05/14
16	EL Inst de plaquetas	2 días	mar 27/05/14	mié 28/05/14
17	EL Trabajos en tableros	3 días	mar 27/05/14	jue 29/05/14
18	EL Inst. de luminarias	4 días	mar 17/06/14	vie 20/06/14
19	EL Electrificación de mobiliario	4 días	mar 17/06/14	vie 20/06/14
4	**Albañilería y otros**	**40 días**	**mar 08/04/14**	**mar 10/06/14**
5	AL Pase en losa de hormigón para CE	4 días	mar 08/04/14	vie 11/04/14
8	AL Carpeta hidrófuga	1 día	mar 29/04/14	mar 29/04/14
7	AL Contrapiso baños	3 días	mié 30/04/14	lun 05/05/14
10	AL Colocación porcellanato para pisos	3 días	vie 16/05/14	mar 20/05/14
9	AL Colocación cerámicos pared	3 días	mié 21/05/14	vie 23/05/14
6	AL Modificación acceso a oficina	3 días	vie 06/06/14	mar 10/06/14
66	**Derrames de agua**	**46 días**	**mar 08/04/14**	**mar 17/06/14**
67	DA Cableado e instalación	3 días	mar 08/04/14	jue 10/04/14
68	DA Puesta en marcha	1 día	mar 17/06/14	mar 17/06/14
27	**Tabiques**	**16 días**	**mié 23/04/14**	**jue 15/05/14**
28	T Replanteo de estructura	4 días	mié 23/04/14	lun 28/04/14
29	T Una Cara	7 días	jue 24/04/14	lun 05/05/14
30	T Refuerzos	2 días	mar 06/05/14	mié 07/05/14
31	T Segunda cara	5 días	vie 09/05/14	jue 15/05/14
69	**Cielorraso Modular y Durlock**	**41 días**	**mié 23/04/14**	**mié 18/06/14**
70	C Replanteo	3 días	mié 23/04/14	vie 25/04/14
73	C Cielo de yeso estructura	4 días	mié 14/05/14	lun 19/05/14
74	C Cielo de yeso emplacado, encintado, buñas	5 días	mar 20/05/14	lun 26/05/14
75	C Refuerzos	1 día	mar 20/05/14	mar 20/05/14
71	CM Estructura	3 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14
72	CM Placa Modular	2 días	mar 17/06/14	mié 18/06/14
46	**Aire Acondicionado**	**38 días**	**lun 28/04/14**	**mié 18/06/14**
47	AA Inst de equipos	2 días	lun 28/04/14	mar 29/04/14
48	AA Piping y condensado	6 días	mié 30/04/14	jue 08/05/14
49	AA Ductería	5 días	mié 07/05/14	mar 13/05/14
50	AA Inst de difusores y rejas.	2 días	mar 17/06/14	mié 18/06/14
51	AA Puesta en marcha	1 día	mar 17/06/14	mar 17/06/14
52	**Inst. Sanitaria**	**35 días**	**mar 29/04/14**	**lun 16/06/14**
53	SA Abastecimiento	3 días	mar 29/04/14	vie 02/05/14
54	SA Desague	3 días	lun 05/05/14	mié 07/05/14
55	SA Desagüe AA	2 días	lun 05/05/14	mar 06/05/14
56	SA Colocación artefactos, griferías y accesorios	3 días	vie 13/06/14	lun 16/06/14
63	**Inst. Contra Incendios**	**24 días**	**mar 06/05/14**	**vie 06/06/14**
64	II Cañería sobre cielo y rociadores	8 días	mar 06/05/14	jue 15/05/14
65	II Inst de embellecedores	1 día	vie 06/06/14	vie 06/06/14
20	**Cableado Estructurado**	**32 días**	**jue 08/05/14**	**jue 19/06/14**
21	CE Cableado	4 días	jue 08/05/14	mar 13/05/14
22	CE Trabajos en el rack	2 días	mié 14/05/14	jue 15/05/14
23	CE Terminaciones, certificaciones y rotulado	3 días	mar 17/06/14	jue 19/06/14
57	**Sensores**	**31 días**	**jue 08/05/14**	**mié 18/06/14**
58	SS Cableado	2 días	jue 08/05/14	vie 09/05/14
59	SS Inst. bajo piso	2 días	jue 08/05/14	vie 09/05/14
60	SS Inst s/ cielo	2 días	mar 20/05/14	mié 21/05/14
61	SS Inst ambiente	2 días	mar 17/06/14	mié 18/06/14
62	SS Programación y puesta en marcha	1 día	mar 17/06/14	mar 17/06/14
84	Colocación ménsulas para mesadas	1 día	jue 08/05/14	jue 08/05/14
39	**Pintura**	**25 días**	**vie 16/05/14**	**mié 18/06/14**
40	P Preparación de superficies tabiques	3 días	vie 16/05/14	mar 20/05/14
41	P En tabiques	4 días	mié 21/05/14	lun 26/05/14
45	P Preparación de superficies cielorrasos	4 días	mar 27/05/14	vie 30/05/14
42	P En cielorrasos cortinero y viga	4 días	lun 02/06/14	jue 05/06/14
43	P Color especial	2 días	vie 06/06/14	lun 09/06/14
44	P Ultima mano	3 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14
83	Colocación mesadas granito y entrepuerta acceso oficina	1 día	lun 26/05/14	lun 26/05/14
36	**Cristales**	**3 días**	**lun 02/06/14**	**mié 04/06/14**
37	V Inst. de mamparas y puertas	2 días	lun 02/06/14	mar 03/06/14
38	V Instalación espejos	1 día	mié 04/06/14	mié 04/06/14
76	**Inst. muebles especiales y puertas**	**14 días**	**lun 02/06/14**	**mié 18/06/14**
79	ME Instalación puertas	2 días	lun 02/06/14	mar 03/06/14
77	ME Instalación de muebles cocina	1 día	jue 12/06/14	jue 12/06/14
78	ME Instalación muebles Copy, Archive, Storage	3 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14
86	**Limpieza final**	**13 días**	**lun 09/06/14**	**dom 22/06/14**
87	Limpieza piso técnico pre-colocación moquette	1 día	lun 09/06/14	lun 09/06/14
88	Limpieza final	2 días	sáb 21/06/14	dom 22/06/14
32	**Pisos**	**8 días**	**mar 10/06/14**	**mié 18/06/14**
33	P Inst. de alfombra	5 días	mar 10/06/14	sáb 14/06/14
34	P Inst. piso vinílico cocina y coffee	2 días	mar 10/06/14	mié 11/06/14
35	P Inst de zócalos	3 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14
80	**Mobiliario de línea**	**5 días**	**lun 16/06/14**	**vie 20/06/14**
81	ML Instalación de mobiliario de línea	5 días	lun 16/06/14	vie 20/06/14
82	Gráfica y señalización	2 días	lun 16/06/14	mar 17/06/14
85	Cortinas	3 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14
89	Entrega de la Oficina	0 días	dom 22/06/14	dom 22/06/14

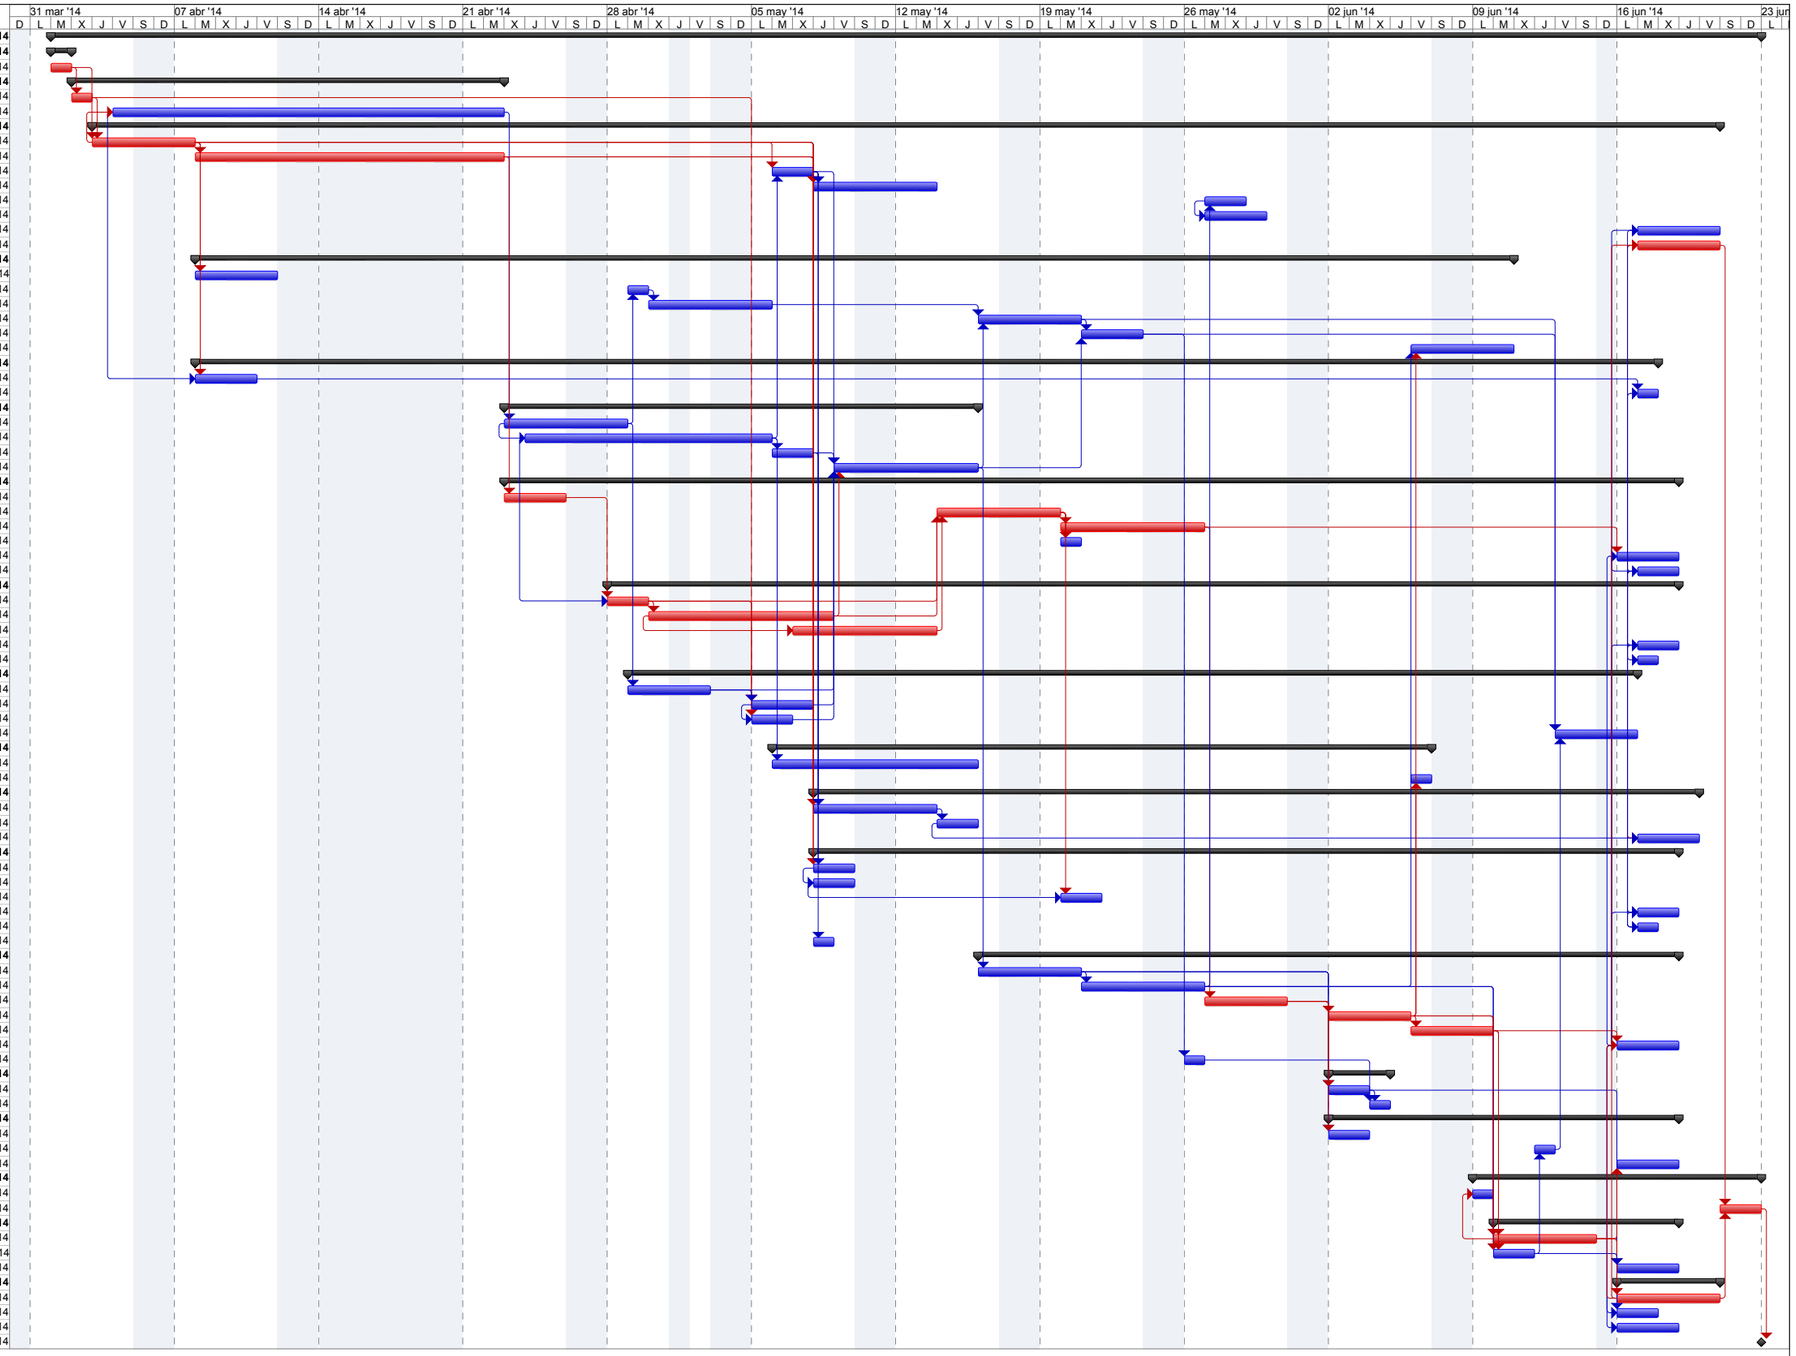

Proyecto: TW2 CONTRATO Anexo III
Fecha: mié 26/03/14

Tarea		Resumen		Hito resumido		Tareas externas		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Progreso			
Tarea crítica		Tarea resumida		Progreso resumido		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Sólo duración		Sólo el comienzo		Fecha límite			
Hito		Tarea crítica resumida		División		Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		Sólo fin					
