Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**OFICINAS RED HAT**	**65 días**	**jue 21/11/13**	**vie 24/01/14**
2	**ETAPA 1**	**15 días**	**jue 21/11/13**	**mié 11/12/13**
3	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**15 días**	**jue 21/11/13**	**mié 11/12/13**
4	Trazados Primera Etapa Tabiques y Vigas	1 día	jue 21/11/13	jue 21/11/13
5	Instalación Piso Técnico	13 días	lun 25/11/13	mié 11/12/13
6	**ETAPA 2**	**17 días**	**lun 25/11/13**	**mar 17/12/13**
7	**CLIMA**	**10 días**	**jue 28/11/13**	**mié 11/12/13**
8	Instalación de equipos y cajas VRV	2 días	jue 28/11/13	vie 29/11/13
9	Instalación cañerías de cobre, despiche y ducteria 30%	7 días	mar 03/12/13	mié 11/12/13
10	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO**	**10 días**	**lun 25/11/13**	**vie 06/12/13**
11	Canalización por losa, tabique y escalerilla	10 días	lun 25/11/13	vie 06/12/13
12	**SEGURIDAD**	**6 días**	**mar 10/12/13**	**mar 17/12/13**
13	Canalización y cableado de detección	3 días	mar 10/12/13	jue 12/12/13
14	Canalización de Control Acceso	3 días	vie 13/12/13	mar 17/12/13
15	**TABIQUERÍA VOLCOMETAL**	**5 días**	**lun 25/11/13**	**vie 29/11/13**
16	Estructuración	3 días	lun 25/11/13	mié 27/11/13
17	Forro 1era cara	2 días	jue 28/11/13	vie 29/11/13
18	**ETAPA 3**	**17 días**	**lun 02/12/13**	**mar 24/12/13**
19	**SANITARIO**	**5 días**	**mié 04/12/13**	**mar 10/12/13**
20	Instalación de Tuberías y cañerías para baños nuevos	5 días	mié 04/12/13	mar 10/12/13
21	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO**	**8 días**	**lun 09/12/13**	**mié 18/12/13**
22	Cableado eléctrico por losa, piso y tabiques	8 días	lun 09/12/13	mié 18/12/13
23	Electrificación de equipos VRV	2 días	vie 13/12/13	lun 16/12/13
24	**CLIMA**	**6 días**	**mar 17/12/13**	**mar 24/12/13**
25	Cableado de termostatos	2 días	lun 23/12/13	mar 24/12/13
26	Conexión eléctrica de VRV	2 días	mar 17/12/13	mié 18/12/13
27	Vacio de refrigerante	3 días	jue 19/12/13	lun 23/12/13
28	**TABIQUERÍA VOLCOMETAL**	**5 días**	**lun 02/12/13**	**vie 06/12/13**
29	Forro 2da cara	5 días	lun 02/12/13	vie 06/12/13
30	Entrega de tabiquería interior en sala server para recibir pintura	0 días	vie 06/12/13	vie 06/12/13
31	**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS**	**6 días**	**mié 11/12/13**	**mié 18/12/13**
32	Instalación de Porcelanato para piso y cerámica muro	6 días	mié 11/12/13	mié 18/12/13
33	**CIELO VOLCOMETAL**	**15 días**	**lun 02/12/13**	**vie 20/12/13**
34	Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.	5 días	lun 02/12/13	vie 06/12/13
35	Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.	10 días	lun 09/12/13	vie 20/12/13
36	**ETAPA 4**	**29 días**	**mar 10/12/13**	**mar 21/01/14**
37	**PINTURA**	**18 días**	**mar 10/12/13**	**lun 06/01/14**
38	Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes	5 días	lun 23/12/13	lun 30/12/13
39	Aparejo	3 días	mar 10/12/13	jue 12/12/13
40	Primera mano de pintura	3 días	vie 27/12/13	mar 31/12/13
41	Segunda mano de pintura	3 días	jue 02/01/14	lun 06/01/14
42	Término de pintura en sala de servidores	0 días	lun 06/01/14	lun 06/01/14
43	**SANITARIO**	**3 días**	**mar 24/12/13**	**vie 27/12/13**
44	Instalación de artefactos	3 días	mar 24/12/13	vie 27/12/13
45	**CIELO MODULAR**	**21 días**	**vie 13/12/13**	**mar 14/01/14**
46	Entrega de sala de servidores con obras civiles terminadas (piso, tabiquería, pintura y cielo)	0 días	vie 13/12/13	vie 13/12/13
47	Perfilería perimetral y estructura de cielo americano	5 días	jue 02/01/14	mié 08/01/14
48	Tapado de Cielo Primera Etapa	4 días	jue 09/01/14	mar 14/01/14
49	**CRISTALES**	**7 días**	**jue 02/01/14**	**vie 10/01/14**
50	Montaje perfiles	3 días	jue 02/01/14	lun 06/01/14
51	Instalación de cristales	2 días	jue 09/01/14	vie 10/01/14
52	**CLIMA**	**4 días**	**mié 15/01/14**	**lun 20/01/14**
53	Instalación de mangas	2 días	mié 15/01/14	jue 16/01/14
54	Instalación de difusores y retornos	2 días	vie 17/01/14	lun 20/01/14
55	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO**	**25 días**	**vie 13/12/13**	**lun 20/01/14**
56	Trabajos eléctricos, canalizaciones, escalerilla y armado de rack en sala de servidores	10 días	vie 13/12/13	vie 27/12/13
57	Entrada de proveedores de fibra, enlaces y especialistas de Red Hat a sala server	0 días	vie 27/12/13	vie 27/12/13
58	Montaje de lámparas en cielo modular	4 días	mié 15/01/14	lun 20/01/14
59	Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores	2 días	jue 02/01/14	vie 03/01/14
60	**SEGURIDAD**	**9 días**	**jue 09/01/14**	**mar 21/01/14**
61	Ramales de sprinklers	4 días	jue 09/01/14	mar 14/01/14
62	Bajada de sprinklers a cielo	3 días	mié 15/01/14	vie 17/01/14
63	Montaje de detectores y parlantes	2 días	lun 20/01/14	mar 21/01/14
64	**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO**	**5 días**	**jue 19/12/13**	**jue 26/12/13**
65	Instalación de alfombra	5 días	jue 19/12/13	jue 26/12/13
66	**CARPINTERÍA**	**7 días**	**mar 07/01/14**	**mié 15/01/14**
67	Instalación de puertas madera y cristal	7 días	mar 07/01/14	mié 15/01/14
68	**ETAPA 5**	**20 días**	**mié 18/12/13**	**jue 16/01/14**
69	**MOBILIARIO ESPECIAL**	**7 días**	**vie 27/12/13**	**mar 07/01/14**
70	Instalación de muebles especiales	7 días	vie 27/12/13	mar 07/01/14
71	**MOBILIARIO DE LINEA**	**10 días**	**vie 27/12/13**	**vie 10/01/14**
72	Instalación de muebles de línea (SÓLO SUPERVISIÓN)	10 días	vie 27/12/13	vie 10/01/14
73	**ELECTRICIDAD**	**20 días**	**mié 18/12/13**	**jue 16/01/14**
74	Cableado enchufes por mobiliario	4 días	lun 13/01/14	jue 16/01/14
75	Instalación de tablero eléctrico	3 días	mié 18/12/13	vie 20/12/13
76	**ETAPA 6**	**6 días**	**vie 17/01/14**	**vie 24/01/14**
77	**TERMINACIONES**	**6 días**	**vie 17/01/14**	**vie 24/01/14**
78	Instalación de films en cristales	2 días	vie 17/01/14	lun 20/01/14
79	Aseo Fino	4 días	mar 21/01/14	vie 24/01/14

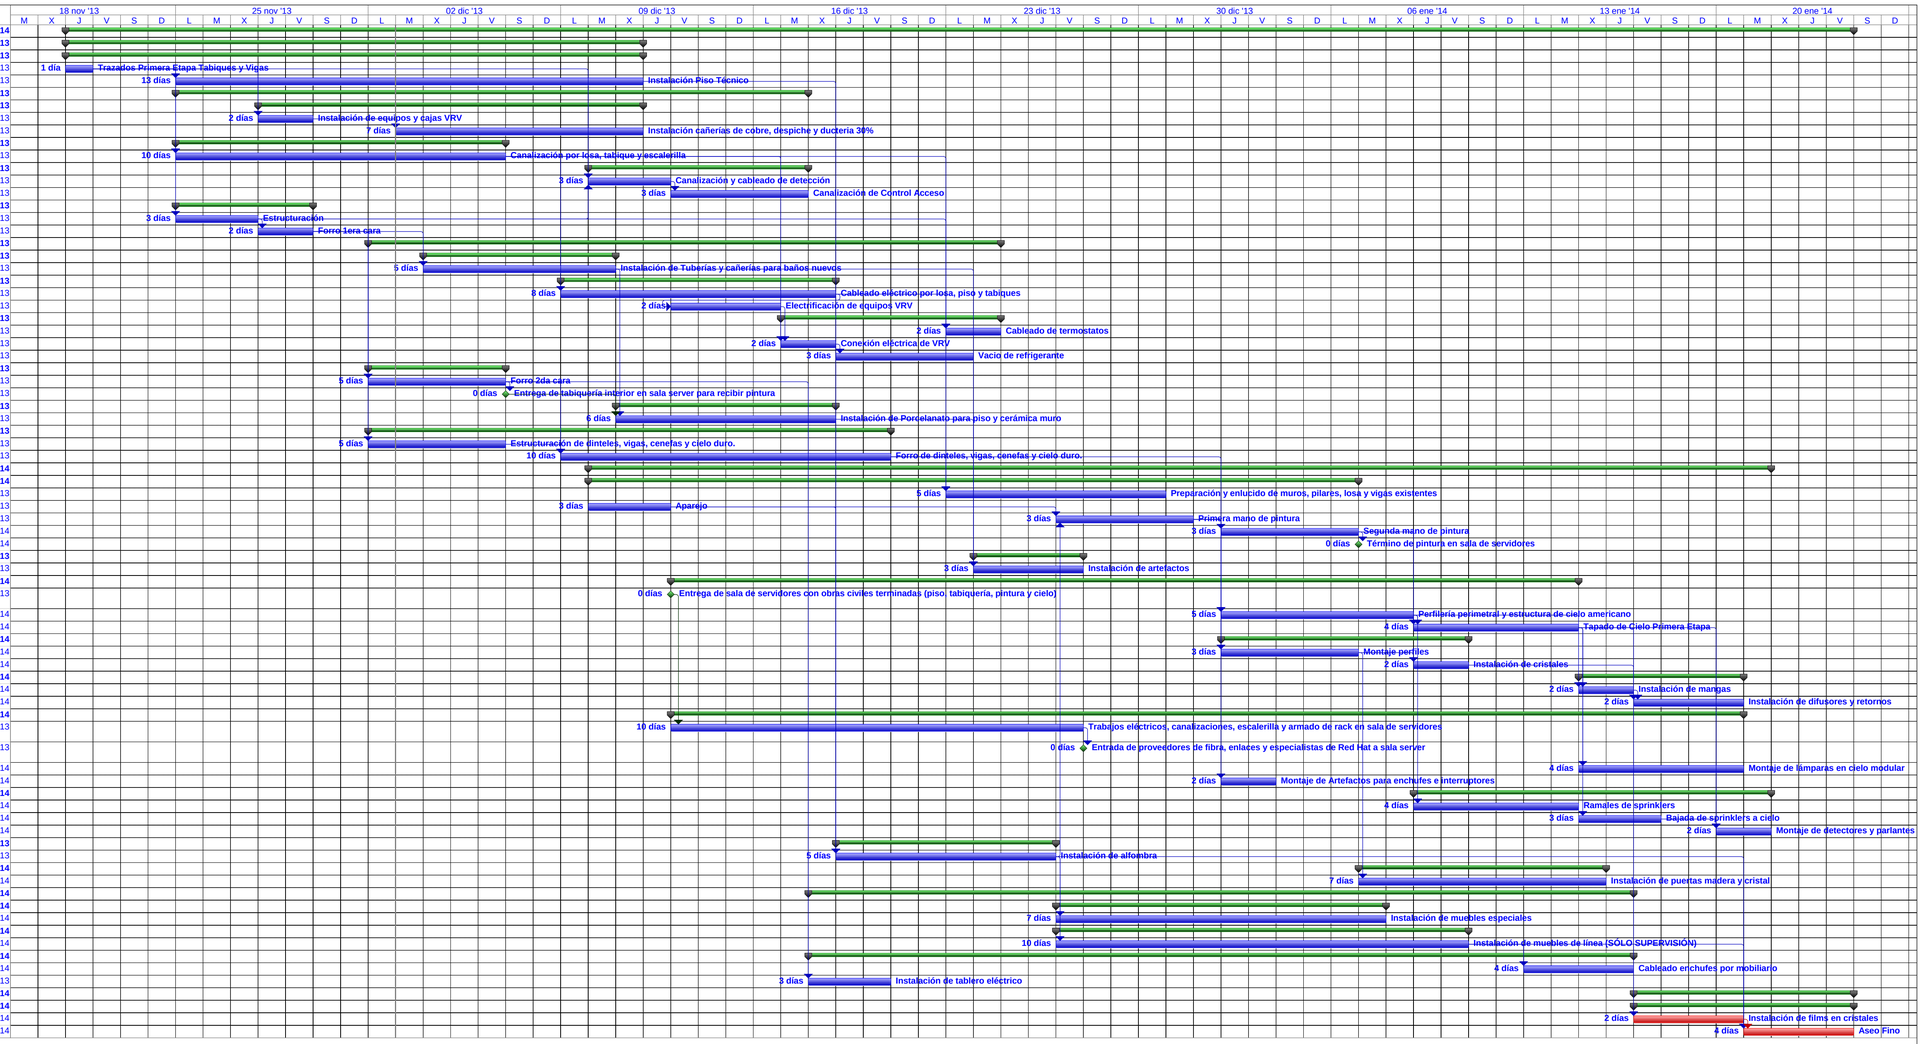

Proyecto: OFICINAS RED HAT
Fecha: mar 03/12/13

Tarea	Tarea crítica resumida	Resumen del proyecto	Tarea manual	Sólo fin	
Tarea crítica	Hito resumido	Agrupar por síntesis	Sólo duración	Progreso	
Hito	Progreso resumido	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Resumen	División	Hito inactivo	Resumen manual		
Tarea resumida	Tareas externas	Resumen inactivo	Sólo el comienzo		
