OBRA NUEVAS OFICINAS GENERAL MOTORS

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1	**OBRA GENERAL MOTORS**	**45 días**	**mié 11/06/14**	**sáb 02/08/14**	**12%**
2	INICIO DE OBRA	0 días	mié 11/06/14	mié 11/06/14	100%
3	**PISO 13**	**45 días**	**mié 11/06/14**	**sáb 02/08/14**	**12%**
4	**DEMOLICION**	**10,88 días**	**mié 11/06/14**	**lun 23/06/14**	**83%**
5	Retiro de Artefacto de iluminación existentes	2 días	mié 11/06/14	vie 13/06/14	100%
6	Retiro de difusores de AA existentes	2 días	mié 11/06/14	vie 13/06/14	100%
7	Desmonte de cielorraso desmontable existente	4 días	mié 11/06/14	lun 16/06/14	100%
8	Desmonte de cielorraso continuo	4 días	lun 16/06/14	lun 23/06/14	50%
9	**ALBAÑILERIA**	**7,13 días**	**sáb 21/06/14**	**lun 30/06/14**	**0%**
10	Ejecución de carpetas	2 días	vie 27/06/14	lun 30/06/14	0%
11	Reparaciones varias	2 días	sáb 21/06/14	lun 23/06/14	0%
12	**INSTALACION SANITARIA**	**13 días**	**sáb 21/06/14**	**lun 07/07/14**	**0%**
13	Instalación sanitaria para vendings machine	1 día	sáb 21/06/14	lun 23/06/14	0%
14	Cañerías de condesado para Equipos AA	2 días	mié 25/06/14	vie 27/06/14	0%
15	Instalación para Jardín Vertical	2 días	vie 04/07/14	lun 07/07/14	0%
16	Instalación Kichenette	1 día	lun 23/06/14	mar 24/06/14	0%
17	**TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO**	**17 días**	**vie 13/06/14**	**jue 03/07/14**	**41%**
18	Ejecución de Estructura	6 días	vie 13/06/14	sáb 21/06/14	83%
19	Emplaque 1º cara	3,93 días	mar 17/06/14	lun 23/06/14	71%
20	Emplaque 2º Cara	5 días	mar 24/06/14	lun 30/06/14	0%
21	Masilla y Terminaciones	4 días	sáb 28/06/14	jue 03/07/14	0%
22	**CIELORRASO DE JUNTA TOMADA**	**18 días**	**lun 23/06/14**	**lun 14/07/14**	**0%**
23	Ejecución de estructura	7 días	lun 23/06/14	mar 01/07/14	0%
24	Emplaque de cielorraso	6 días	sáb 28/06/14	sáb 05/07/14	0%
25	Masillado y terminaciones	7 días	sáb 05/07/14	lun 14/07/14	0%
26	**CIELORRASO DESMONTABLE**	**27 días**	**mié 18/06/14**	**sáb 19/07/14**	**50%**
27	Rearmado de estructura cielorraso desmontable	2 días	mié 18/06/14	mar 15/07/14	50%
28	Colocación de placas	1 día	vie 18/07/14	sáb 19/07/14	50%
29	**HERRERIA**	**4 días**	**mar 01/07/14**	**sáb 05/07/14**	**0%**
30	Refuerzos para puertas de cristal	2 días	mar 01/07/14	jue 03/07/14	0%
31	Refuerzos para Pantalla y Proyector en Sala de reuniones	2 días	jue 03/07/14	sáb 05/07/14	0%
32	**PINTURA**	**31 días**	**lun 23/06/14**	**mar 29/07/14**	**0%**
33	Preparación de columnas y muros existentes	8 días	lun 23/06/14	mié 02/07/14	0%
34	Preparación y pintado de tabiques y muros	20 días	jue 03/07/14	sáb 26/07/14	0%
35	Preparación y pintado de cielorraso	10 días	sáb 12/07/14	jue 24/07/14	0%
36	Terminaciones	2 días	sáb 26/07/14	mar 29/07/14	0%
37	**INSTALACION AIRE ACONDICIONADO**	**38 días**	**mié 11/06/14**	**vie 25/07/14**	**29%**
38	Modificación de conductos	8 días	mar 17/06/14	jue 26/06/14	48%
39	Colocación de Difusores	2 días	lun 21/07/14	mié 23/07/14	0%
40	Instalación de equipos splits en Data Provisorios	2 días	vie 04/07/14	lun 07/07/14	0%
41	Puesta en marcha de equipos	1 día	jue 24/07/14	vie 25/07/14	0%
42	Confirmación de IT para aprobación de alternativa Splits provisorios	0 días	mié 11/06/14	mié 11/06/14	0%
43	**DETECCION DE INCENDIO**	**31 días**	**sáb 21/06/14**	**lun 28/07/14**	**0%**
44	Canalizaciones vacias bajo piso para detectores	5 días	jue 26/06/14	mar 01/07/14	0%
45	Canalizaciones vacias sobre cielorraso para detectores	2 días	sáb 21/06/14	mar 24/06/14	0%
46	Instalación de detectores y pulsadores	3 días	jue 24/07/14	lun 28/07/14	0%
47	**EXTINCION DE INCENDIO**	**3 días**	**lun 23/06/14**	**mié 25/06/14**	**0%**
48	Corrimiento e instalación de rociadores	3 días	lun 23/06/14	mié 25/06/14	0%
49	**ZOCALOS**	**4 días**	**mié 02/07/14**	**lun 07/07/14**	**0%**
50	Provisión e Instalación de Zócalos	4 días	mié 02/07/14	lun 07/07/14	0%
51	**PISO TECNICO**	**2 días**	**lun 14/07/14**	**mié 16/07/14**	**0%**
52	Nivelación de Piso Técnico	2 días	lun 14/07/14	mié 16/07/14	0%
53	**ALFOMBRA**	**2 días**	**mié 16/07/14**	**vie 18/07/14**	**0%**
54	Colocación de Alfombra	2 días	mié 16/07/14	vie 18/07/14	0%
55	**PISO VINILICO**	**1 día**	**mié 16/07/14**	**jue 17/07/14**	**0%**
56	Instalación de piso de goma	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14	0%
57	**CRISTALES**	**37 días**	**jue 19/06/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
58	Medición de Frentes Vidriados y perfiles anodizados	0 días	jue 19/06/14	jue 19/06/14	0%
59	Colocación de Frentes Vidriados y perfiles anodizados	8 días	mié 23/07/14	vie 01/08/14	0%
60	**CARPINTERIAS**	**3 días**	**mié 30/07/14**	**sáb 02/08/14**	**0%**
61	Colocación de Puertas	3 días	mié 30/07/14	sáb 02/08/14	0%
62	**PANELES MOVILES**	**2 días**	**mar 22/07/14**	**jue 24/07/14**	**0%**
63	Instalación de Paneles Móviles	2 días	mar 22/07/14	jue 24/07/14	0%
64	**MESADAS**	**1 día**	**mié 30/07/14**	**jue 31/07/14**	**0%**
65	Provisión y colocación de mesada granito	1 día	mié 30/07/14	jue 31/07/14	0%
66	**JARDIN VERTICAL**	**7 días**	**jue 24/07/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
67	Instalación de Jardín Vertical	7 días	jue 24/07/14	vie 01/08/14	0%
68	**CORTINAS**	**4 días**	**lun 28/07/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
69	Instalación de Cortinas Screen	4 días	lun 28/07/14	vie 01/08/14	0%
70	**CONTROL DE ACCESO**	**31 días**	**lun 23/06/14**	**mar 29/07/14**	**0%**
71	Cañerías vacias para Control de Acceso	4 días	lun 23/06/14	vie 27/06/14	0%
72	Instalación de Control de Acceso	2 días	sáb 26/07/14	mar 29/07/14	0%
73	**INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	**44 días**	**jue 12/06/14**	**sáb 02/08/14**	**13%**
74	Energía e iluminación provisoria de obra	3 días	vie 13/06/14	mié 25/06/14	25%
75	Tendido de bandejas sobre cielorraso	4 días	mar 17/06/14	sáb 21/06/14	20%
76	Tendido de bandejas bajo piso técnico	7 días	jue 12/06/14	mié 25/06/14	57%
77	Canalizaciones en tabiques	4 días	jue 19/06/14	mar 24/06/14	60%
78	Cañerías complementarías de iluminación	7 días	mié 18/06/14	jue 26/06/14	29%
79	Cañerías de multimedia, CCTV, etc	2 días	mar 24/06/14	jue 26/06/14	0%
80	Cableado de Iluminación	5 días	sáb 28/06/14	vie 04/07/14	0%
81	Cableado de tensión común y estabilizada	5 días	jue 03/07/14	mié 09/07/14	0%
82	Cableado de datos	4 días	mié 09/07/14	lun 14/07/14	0%
83	Colocación de cajas de piso	2 días	jue 17/07/14	sáb 19/07/14	0%
84	Colocación de FacePlate	3 días	sáb 19/07/14	mié 23/07/14	0%
85	Colocación de artefactos de iluminación	7 días	mié 23/07/14	jue 31/07/14	0%
86	Provisión e instalación de tableros	4 días	sáb 12/07/14	jue 17/07/14	0%
87	Provisión e instalación de Rack	6 días	mar 22/07/14	mar 29/07/14	0%
88	Cableado de puestos	12 días	sáb 19/07/14	sáb 02/08/14	0%
89	Certificación y rotulación	1 día	vie 01/08/14	sáb 02/08/14	0%
90	**LIMPIEZA DE OBRA**	**3 días**	**sáb 26/07/14**	**mié 30/07/14**	**0%**
91	Limpieza final de obra	3 días	sáb 26/07/14	mié 30/07/14	0%
92	**TAREAS A CARGO DEL CLIENTE**	**15 días**	**mar 15/07/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
93	Provisión de Alfombra	0 días	mié 16/07/14	mié 16/07/14	0%
94	Provisión de artefactos de iluminación	0 días	mar 15/07/14	mar 15/07/14	0%
95	Armado de puesto operativos	10 días	vie 18/07/14	mié 30/07/14	0%
96	Armado de equipamiento especial	4 días	vie 25/07/14	mié 30/07/14	0%
97	Provisión de mobiliario	3 días	mar 29/07/14	vie 01/08/14	0%
98	FINAL DE OBRA	0 días	sáb 02/08/14	sáb 02/08/14	0%

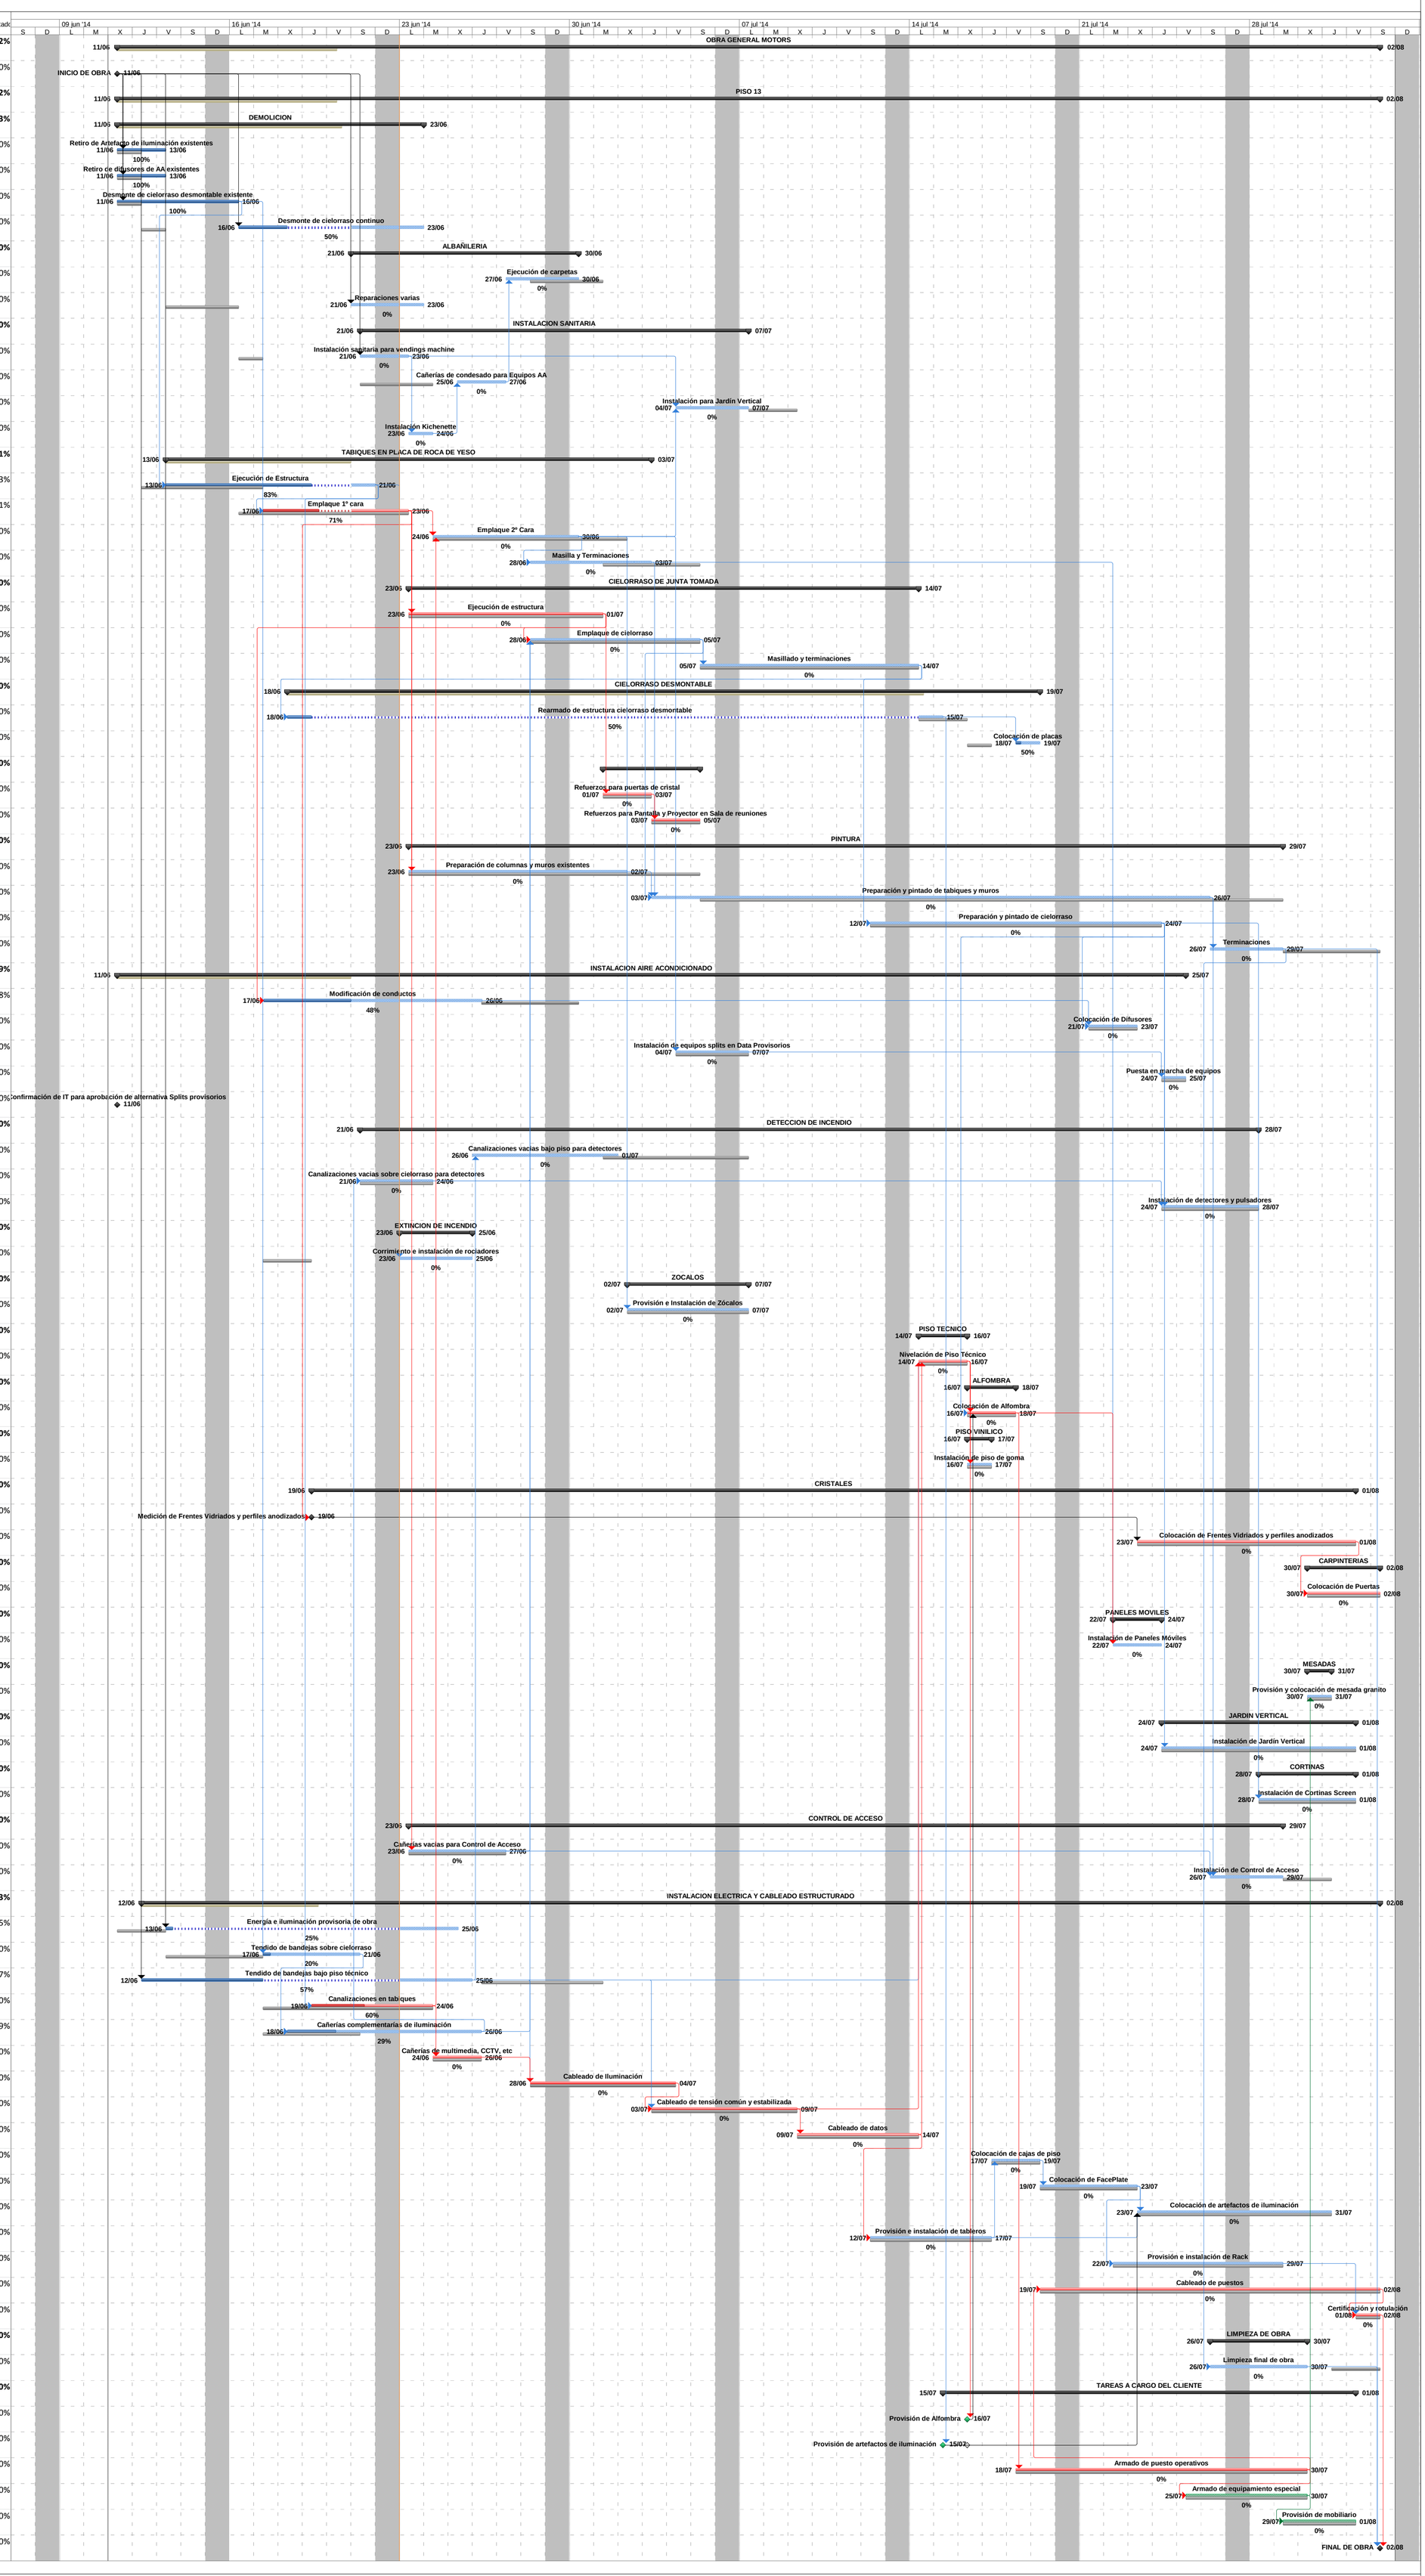

2014-06-21_GM_CRONOGRAMA_P13
lun 23/06/14

General Motors

Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Sólo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite
