OBRA NUEVAS OFICINAS GENERAL MOTORS

contract

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1	**OBRA GENERAL MOTORS**	**45 días**	**mié 11/06/14**	**sáb 02/08/14**	**16%**
2	INICIO DE OBRA	0 días	mié 11/06/14	mié 11/06/14	100%
3	**PISO 15**	**45 días**	**mié 11/06/14**	**sáb 02/08/14**	**16%**
4	**DEMOLICION**	**5 días**	**mié 11/06/14**	**mar 17/06/14**	**100%**
5	Retiro de Artefacto de iluminación existentes	2 días	mié 11/06/14	vie 13/06/14	100%
6	Retiro de difusores de AA existentes	2 días	mié 11/06/14	vie 13/06/14	100%
7	Desmonte de cielorraso desmontable existente	4 días	mié 11/06/14	lun 16/06/14	100%
8	Desmonte de cielorraso continuo	1 día	lun 16/06/14	mar 17/06/14	100%
9	**ALBAÑILERIA**	**17 días**	**lun 16/06/14**	**sáb 05/07/14**	**25%**
10	Ejecución de carpetas	2 días	jue 03/07/14	sáb 05/07/14	0%
11	Reparaciones varias	2 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14	50%
12	**INSTALACION SANITARIA**	**17 días**	**lun 23/06/14**	**sáb 12/07/14**	**0%**
13	Instalación sanitaria para vendings machine	1 día	lun 23/06/14	mar 24/06/14	0%
14	Cañerías de condesado para Equipos AA	2 días	jue 26/06/14	sáb 28/06/14	0%
15	Instalación para Jardín Vertical	2 días	jue 10/07/14	sáb 12/07/14	0%
16	**TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO**	**22 días**	**vie 13/06/14**	**mié 09/07/14**	**48%**
17	Ejecución de Estructura	5 días	vie 13/06/14	jue 19/06/14	90%
18	Emplaque 1º cara	7 días	sáb 14/06/14	lun 23/06/14	95%
19	Emplaque 2º Cara	7 días	vie 27/06/14	sáb 05/07/14	0%
20	Masilla y Terminaciones	4 días	vie 04/07/14	mié 09/07/14	0%
21	**CIELORRASO DE JUNTA TOMADA**	**18 días**	**lun 23/06/14**	**lun 14/07/14**	**7%**
22	Ejecución de estructura	7 días	lun 23/06/14	mar 01/07/14	20%
23	Emplaque de cielorraso	6 días	sáb 28/06/14	sáb 05/07/14	0%
24	Masillado y terminaciones	7 días	sáb 05/07/14	lun 14/07/14	0%
25	**CIELORRASO DESMONTABLE**	**3 días**	**lun 14/07/14**	**jue 17/07/14**	**47%**
26	Rearmado de estructura cielorraso desmontable	2 días	lun 14/07/14	mié 16/07/14	70%
27	Colocación de placas	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14	0%
28	**HERRERIA**	**4 días**	**mar 01/07/14**	**sáb 05/07/14**	**0%**
29	Refuerzos para puertas de cristal	2 días	mar 01/07/14	jue 03/07/14	0%
30	Refuerzos para Pantalla y Proyector en Sala de reuniones	2 días	jue 03/07/14	sáb 05/07/14	0%
31	**PINTURA**	**32 días**	**mié 25/06/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
32	Preparación de columnas y muros existentes	11 días	mié 25/06/14	mar 08/07/14	0%
33	Preparación y pintado de tabiques y muros	18 días	mié 09/07/14	mié 30/07/14	0%
34	Preparación y pintado de cielorraso	10 días	sáb 12/07/14	jue 24/07/14	0%
35	Terminaciones	2 días	mié 30/07/14	vie 01/08/14	0%
36	**INSTALACION AIRE ACONDICIONADO**	**43 días**	**mié 11/06/14**	**jue 31/07/14**	**20%**
37	Modificación de conductos	5 días	jue 19/06/14	mié 25/06/14	40%
38	Colocación de Difusores	2 días	lun 21/07/14	mié 23/07/14	0%
39	Instalación de equipos splits en Data Provisorios	2 días	vie 11/07/14	lun 14/07/14	0%
40	Puesta en marcha de equipos	1 día	mié 30/07/14	jue 31/07/14	0%
41	Confirmación de IT para aprobación de alternativa Splits provisorios	0 días	mié 11/06/14	mié 11/06/14	0%
42	**DETECCION DE INCENDIO**	**31 días**	**sáb 21/06/14**	**lun 28/07/14**	**0%**
43	Canalizaciones vacias bajo piso para detectores	5 días	sáb 21/06/14	vie 27/06/14	0%
44	Canalizaciones vacias sobre cielorraso para detectores	2 días	mié 25/06/14	vie 27/06/14	0%
45	Instalación de detectores y pulsadores	3 días	jue 24/07/14	lun 28/07/14	0%
46	**EXTINCION DE INCENDIO**	**3 días**	**mié 25/06/14**	**sáb 28/06/14**	**0%**
47	Corrimiento e instalación de rociadores	3 días	mié 25/06/14	sáb 28/06/14	0%
48	**ZOCALOS**	**4 días**	**sáb 05/07/14**	**jue 10/07/14**	**0%**
49	Provisión e Instalación de Zócalos	4 días	sáb 05/07/14	jue 10/07/14	0%
50	**PISO TECNICO**	**2 días**	**lun 14/07/14**	**mié 16/07/14**	**0%**
51	Nivelación de Piso Técnico	2 días	lun 14/07/14	mié 16/07/14	0%
52	**ALFOMBRA**	**2 días**	**mié 16/07/14**	**vie 18/07/14**	**0%**
53	Colocación de Alfombra	2 días	mié 16/07/14	vie 18/07/14	0%
54	**PISO VINILICO**	**1 día**	**mié 16/07/14**	**jue 17/07/14**	**0%**
55	Instalación de piso de goma	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14	0%
56	**CRISTALES**	**37 días**	**jue 19/06/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
57	Medición de Frentes Vidriados y perfiles anodizados	0 días	jue 19/06/14	jue 19/06/14	0%
58	Colocación de Frentes Vidriados y perfiles anodizados	8 días	mié 23/07/14	vie 01/08/14	0%
59	**CARPINTERIAS**	**3 días**	**mié 30/07/14**	**sáb 02/08/14**	**0%**
60	Colocación de Puertas	3 días	mié 30/07/14	sáb 02/08/14	0%
61	**MESADAS**	**1 día**	**mié 30/07/14**	**jue 31/07/14**	**0%**
62	Provisión y colocación de mesada granito	1 día	mié 30/07/14	jue 31/07/14	0%
63	**JARDIN VERTICAL**	**7 días**	**jue 24/07/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
64	Instalación de Jardín Vertical	7 días	jue 24/07/14	vie 01/08/14	0%
65	**CORTINAS**	**4 días**	**lun 28/07/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
66	Instalación de Cortinas Screen	4 días	lun 28/07/14	vie 01/08/14	0%
67	**CONTROL DE ACCESO**	**34 días**	**lun 23/06/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
68	Cañerías vacias para Control de Acceso	4 días	lun 23/06/14	vie 27/06/14	0%
69	Instalación de Control de Acceso	2 días	mié 30/07/14	vie 01/08/14	0%
70	**INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	**44 días**	**jue 12/06/14**	**sáb 02/08/14**	**21%**
71	Energía e iluminación provisoria de obra	3 días	vie 13/06/14	mar 17/06/14	15%
72	Tendido de bandejas sobre cielorraso	3 días	lun 23/06/14	jue 26/06/14	0%
73	Tendido de bandejas bajo piso técnico	8 días	jue 12/06/14	sáb 21/06/14	100%
74	Canalizaciones en tabiques	7 días	mar 17/06/14	mié 25/06/14	30%
75	Cañerías complementarías de iluminación	7 días	mar 17/06/14	mié 25/06/14	90%
76	Cañerías de multimedia, CCTV, etc	2 días	mar 24/06/14	jue 26/06/14	0%
77	Cableado de Iluminación	5 días	sáb 28/06/14	vie 04/07/14	0%
78	Cableado de tensión común y estabilizada	5 días	jue 03/07/14	mié 09/07/14	0%
79	Cableado de datos	4 días	mié 09/07/14	lun 14/07/14	0%
80	Colocación de cajas de piso	2 días	jue 17/07/14	sáb 19/07/14	0%
81	Colocación de FacePlate	3 días	sáb 19/07/14	mié 23/07/14	0%
82	Colocación de artefactos de iluminación	7 días	mié 23/07/14	jue 31/07/14	0%
83	Provisión e instalación de tableros	4 días	sáb 12/07/14	jue 17/07/14	0%
84	Provisión e instalación de Rack	6 días	mar 22/07/14	mar 29/07/14	0%
85	Cableado de puestos	12 días	sáb 19/07/14	sáb 02/08/14	0%
86	Certificación y rotulación	1 día	vie 01/08/14	sáb 02/08/14	0%
87	**LIMPIEZA DE OBRA**	**2 días**	**mié 30/07/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
88	Limpieza final de obra	2 días	mié 30/07/14	vie 01/08/14	0%
89	**TAREAS A CARGO DEL CLIENTE**	**14 días**	**mié 16/07/14**	**vie 01/08/14**	**0%**
90	Provisión de Alfombra	0 días	mié 16/07/14	mié 16/07/14	0%
91	Provisión de artefactos de iluminación	0 días	mié 16/07/14	mié 16/07/14	0%
92	Armado de puesto operativos	10 días	vie 18/07/14	mié 30/07/14	0%
93	Armado de equipamiento especial	4 días	vie 25/07/14	mié 30/07/14	0%
94	Provisión de mobiliario	3 días	mar 29/07/14	vie 01/08/14	0%
95	FINAL DE OBRA	0 días	sáb 02/08/14	sáb 02/08/14	0%

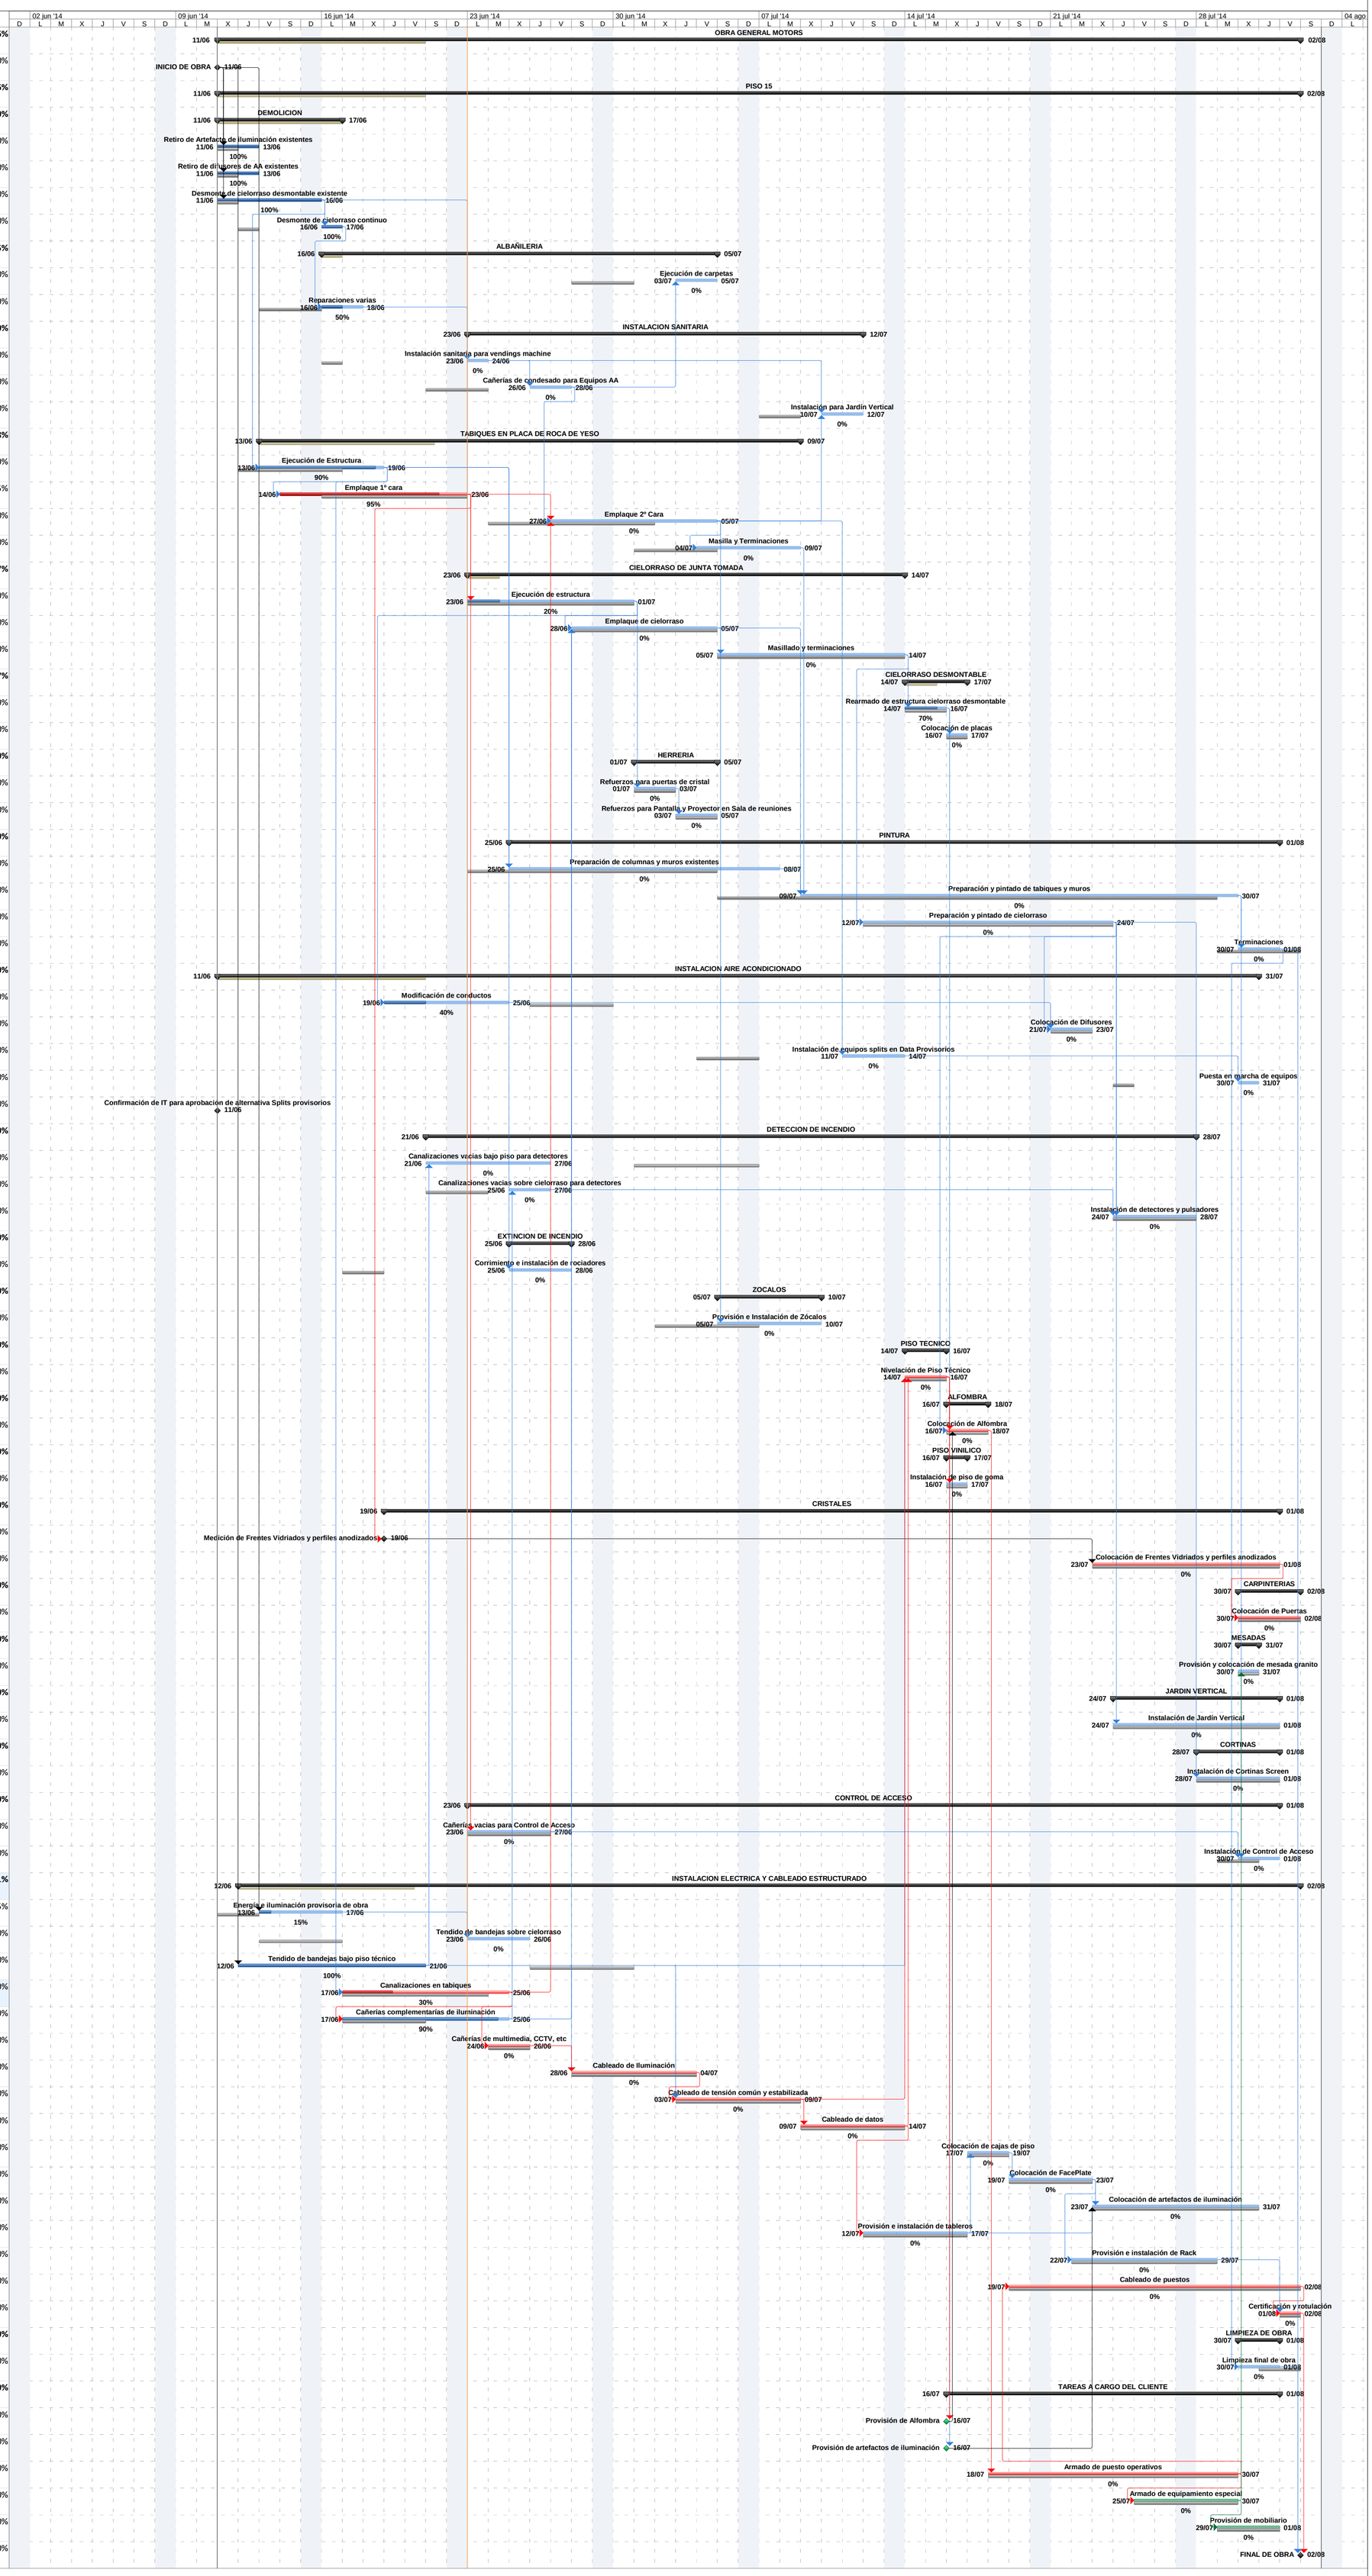

GM_CRONOGRAMA_P15_23-6
lun 23/06/14
General Motors

Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · Sólo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · Sólo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · Sólo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite
