Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1		**Obra: MERCADO LIBRE - CÓRDOBA**	**79,2 días**	**lun 24/02/14**	**mié 04/06/14**	**20%**
2		Inicio de obra	0 días	lun 24/02/14	lun 24/02/14	0%
10	✓	**INSTALCIÓN DE EXTINCIÓN**	**3 días**	**sáb 08/03/14**	**mar 11/03/14**	**100%**
11	✓	Instalación de nuevo hidrante + reubicación de hidrante existente	3 días	sáb 08/03/14	mar 11/03/14	100%
32		**TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**32 días**	**mié 05/03/14**	**sáb 12/04/14**	**80%**
33	✓	Ejecución de estructura	9 días	mié 05/03/14	vie 14/03/14	100%
34		Emplacado de 1º cara	7 días	mar 11/03/14	sáb 22/03/14	95%
35		Emplacado de 2º cara	5 días	mar 01/04/14	sáb 12/04/14	30%
36		Sobretabiques	6 días	sáb 22/03/14	mié 09/04/14	75%
7		**INSTALACIÓN SANITARIA**	**14 días**	**jue 03/04/14**	**sáb 19/04/14**	**17%**
9	✓	Tendido de cañerías de AF, AC y D para coffee	2 días	jue 03/04/14	vie 04/04/14	100%
8		Tendido de desagüe de condensado	10 días	mar 08/04/14	sáb 19/04/14	0%
64		**HERRERIA**	**17 días**	**mar 25/03/14**	**mar 15/04/14**	**55%**
66	✓	Soportes para puertas y pantallas	6 días	mar 25/03/14	mar 01/04/14	100%
65		Soportes para condensadoras	5 días	mié 09/04/14	mar 15/04/14	0%
3		**ALBAÑILERÍA**	**53,2 días**	**sáb 01/03/14**	**sáb 10/05/14**	**36%**
4		Realización de contrapiso en coffee, cocina y recepción	1 día	sáb 01/03/14	sáb 01/03/14	90%
5		Realización de carpeta en coffee, cocina y recepción	1 día	sáb 08/03/14	sáb 08/03/14	90%
6		Colcoación de porcellanato en recepción	3 días	mié 07/05/14	sáb 10/05/14	0%
70		**PINTURA**	**18 días**	**sáb 26/04/14**	**mar 20/05/14**	**0%**
72		Preparación y pintura cielorraso latex común	9 días	sáb 03/05/14	mié 14/05/14	0%
71		Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado	18 días	sáb 26/04/14	mar 20/05/14	0%
37		**INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION**	**37 días**	**mar 08/04/14**	**vie 23/05/14**	**0%**
38		Nueva propuesta de proyecto	0 días	mar 08/04/14	mar 08/04/14	0%
39		Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso continuo	16 días	mar 15/04/14	mar 06/05/14	0%
40		Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso modular	20 días	mar 15/04/14	sáb 10/05/14	0%
41		Instalación de unidades interiores y exteriores	8 días	lun 12/05/14	mar 20/05/14	0%
42		Puesta en marcha	3 días	mié 21/05/14	vie 23/05/14	0%
59		**PISOS**	**5 días**	**sáb 17/05/14**	**vie 23/05/14**	**0%**
63		Nivelacion de piso tecnico	2 días	sáb 17/05/14	mar 20/05/14	0%
60		Instalación de alfombra	2 días	mar 20/05/14	jue 22/05/14	0%
62		Instalación de piso vinílico	2 días	mar 20/05/14	jue 22/05/14	0%
61		Instalación de piso porcellanato	3 días	mar 20/05/14	vie 23/05/14	0%
67		**CORTINAS Y PERSIANAS**	**56,2 días**	**vie 14/03/14**	**lun 26/05/14**	**0%**
68		Mediciones	0 días	vie 14/03/14	vie 14/03/14	0%
69		Instalación de cortinas	5 días	mar 20/05/14	lun 26/05/14	0%
73		**MESADAS**	**2 días**	**vie 23/05/14**	**lun 26/05/14**	**0%**
74		Provision y colocacion de mesada/ alzada Granito gris mara	2 días	vie 23/05/14	lun 26/05/14	0%
53		**MUEBLES ESPECIALES**	**9 días**	**mar 20/05/14**	**vie 30/05/14**	**0%**
58		Mueble de cocina bajo	3 días	mar 20/05/14	vie 23/05/14	0%
54		Mueble de recepción	2 días	jue 22/05/14	sáb 24/05/14	0%
56		Equipamiento de diseño	3 días	jue 22/05/14	lun 26/05/14	0%
55		Mueble de guardado	4 días	jue 22/05/14	mar 27/05/14	0%
57		Armado de Equipamiento	7 días	jue 22/05/14	vie 30/05/14	0%
43		**CIELORRASOS**	**49 días**	**mar 01/04/14**	**sáb 31/05/14**	**6%**
44		Ejecución de cielorraso continuo	12 días	mar 01/04/14	mié 07/05/14	15%
45		Armado de nuevos cielorraso modular	9 días	mié 07/05/14	vie 16/05/14	0%
46		Reparación de cielorrasos, pintura - Incluye protecciones	10 días	mié 21/05/14	sáb 31/05/14	0%
47		**FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES**	**61,2 días**	**lun 17/03/14**	**mar 03/06/14**	**0%**
48		Mediciones de Cristales	0 días	lun 17/03/14	lun 17/03/14	0%
51		Puerta de acceso a piso Server F60	1 día	vie 28/03/14	vie 28/03/14	0%
50		Puerta de acceso a piso F60	2 días	lun 14/04/14	mar 15/04/14	0%
52		Puertas laminadas y laquedas	3 días	mié 14/05/14	sáb 17/05/14	0%
49		Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral + puertas	10 días	jue 22/05/14	mar 03/06/14	0%
75		**VARIOS**	**2 días**	**sáb 31/05/14**	**mar 03/06/14**	**0%**
76		Detalles terminaciones	2 días	sáb 31/05/14	mar 03/06/14	0%
12		**INSTALACION ELECTRICA**	**71,2 días**	**vie 07/03/14**	**mié 04/06/14**	**27%**
13	✓	Electricidad de obra	1 día	vie 07/03/14	vie 07/03/14	100%
14		Colocación de bandejas en piso	9 días	vie 07/03/14	lun 17/03/14	95%
15		Colocación de cañerías para piso y en tabiques	6 días	mié 12/03/14	lun 07/04/14	30%
16		Cañerías Multimedia	5 días	mié 19/03/14	mar 25/03/14	90%
19		Cañerías y alimentación de equipos de aire acondicionado	6 días	mar 08/04/14	lun 14/04/14	0%
20		Cañerías y cableado de Detección de incendio	6 días	mar 18/03/14	lun 07/04/14	80%
18		Cañerias y cableado de iluminacion	17 días	vie 07/03/14	vie 11/04/14	70%
21		Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA	5 días	sáb 05/04/14	jue 10/04/14	0%
17		Cableado tensión común y dedicada	10 días	sáb 12/04/14	jue 24/04/14	0%
22		Cableado estructurado	9 días	mié 16/04/14	sáb 26/04/14	0%
23		Adecuación de tablero seccional	9 días	jue 24/04/14	mar 06/05/14	0%
24		Armado de racks, patch panels, patch cords, UPS	6 días	mar 06/05/14	lun 12/05/14	0%
25		Colocación de cajas Atq, periscopios y face plate	4 días	mié 14/05/14	lun 19/05/14	0%
28		Instalación de artefactos de iluminación	5 días	sáb 17/05/14	jue 22/05/14	0%
29		Instalación de detectores de incendio - pruebas y puesta en marcha	8 días	sáb 17/05/14	lun 26/05/14	0%
27		Cableado de puestos	5 días	mié 28/05/14	mar 03/06/14	0%
26		Instalación de control de acceso	3 días	sáb 31/05/14	mié 04/06/14	0%
30		Instalación de CCTV	3 días	sáb 31/05/14	mié 04/06/14	0%
31		Pruebas y puesta en marcha	2 días	lun 02/06/14	mié 04/06/14	0%
77		**GRAFICA Y SEÑALIZACION**	**17 días**	**jue 15/05/14**	**mié 04/06/14**	**0%**
78		Definición de Mediciones	0 días	jue 15/05/14	jue 15/05/14	0%
79		Colocación de vinilos	3 días	sáb 31/05/14	mié 04/06/14	0%

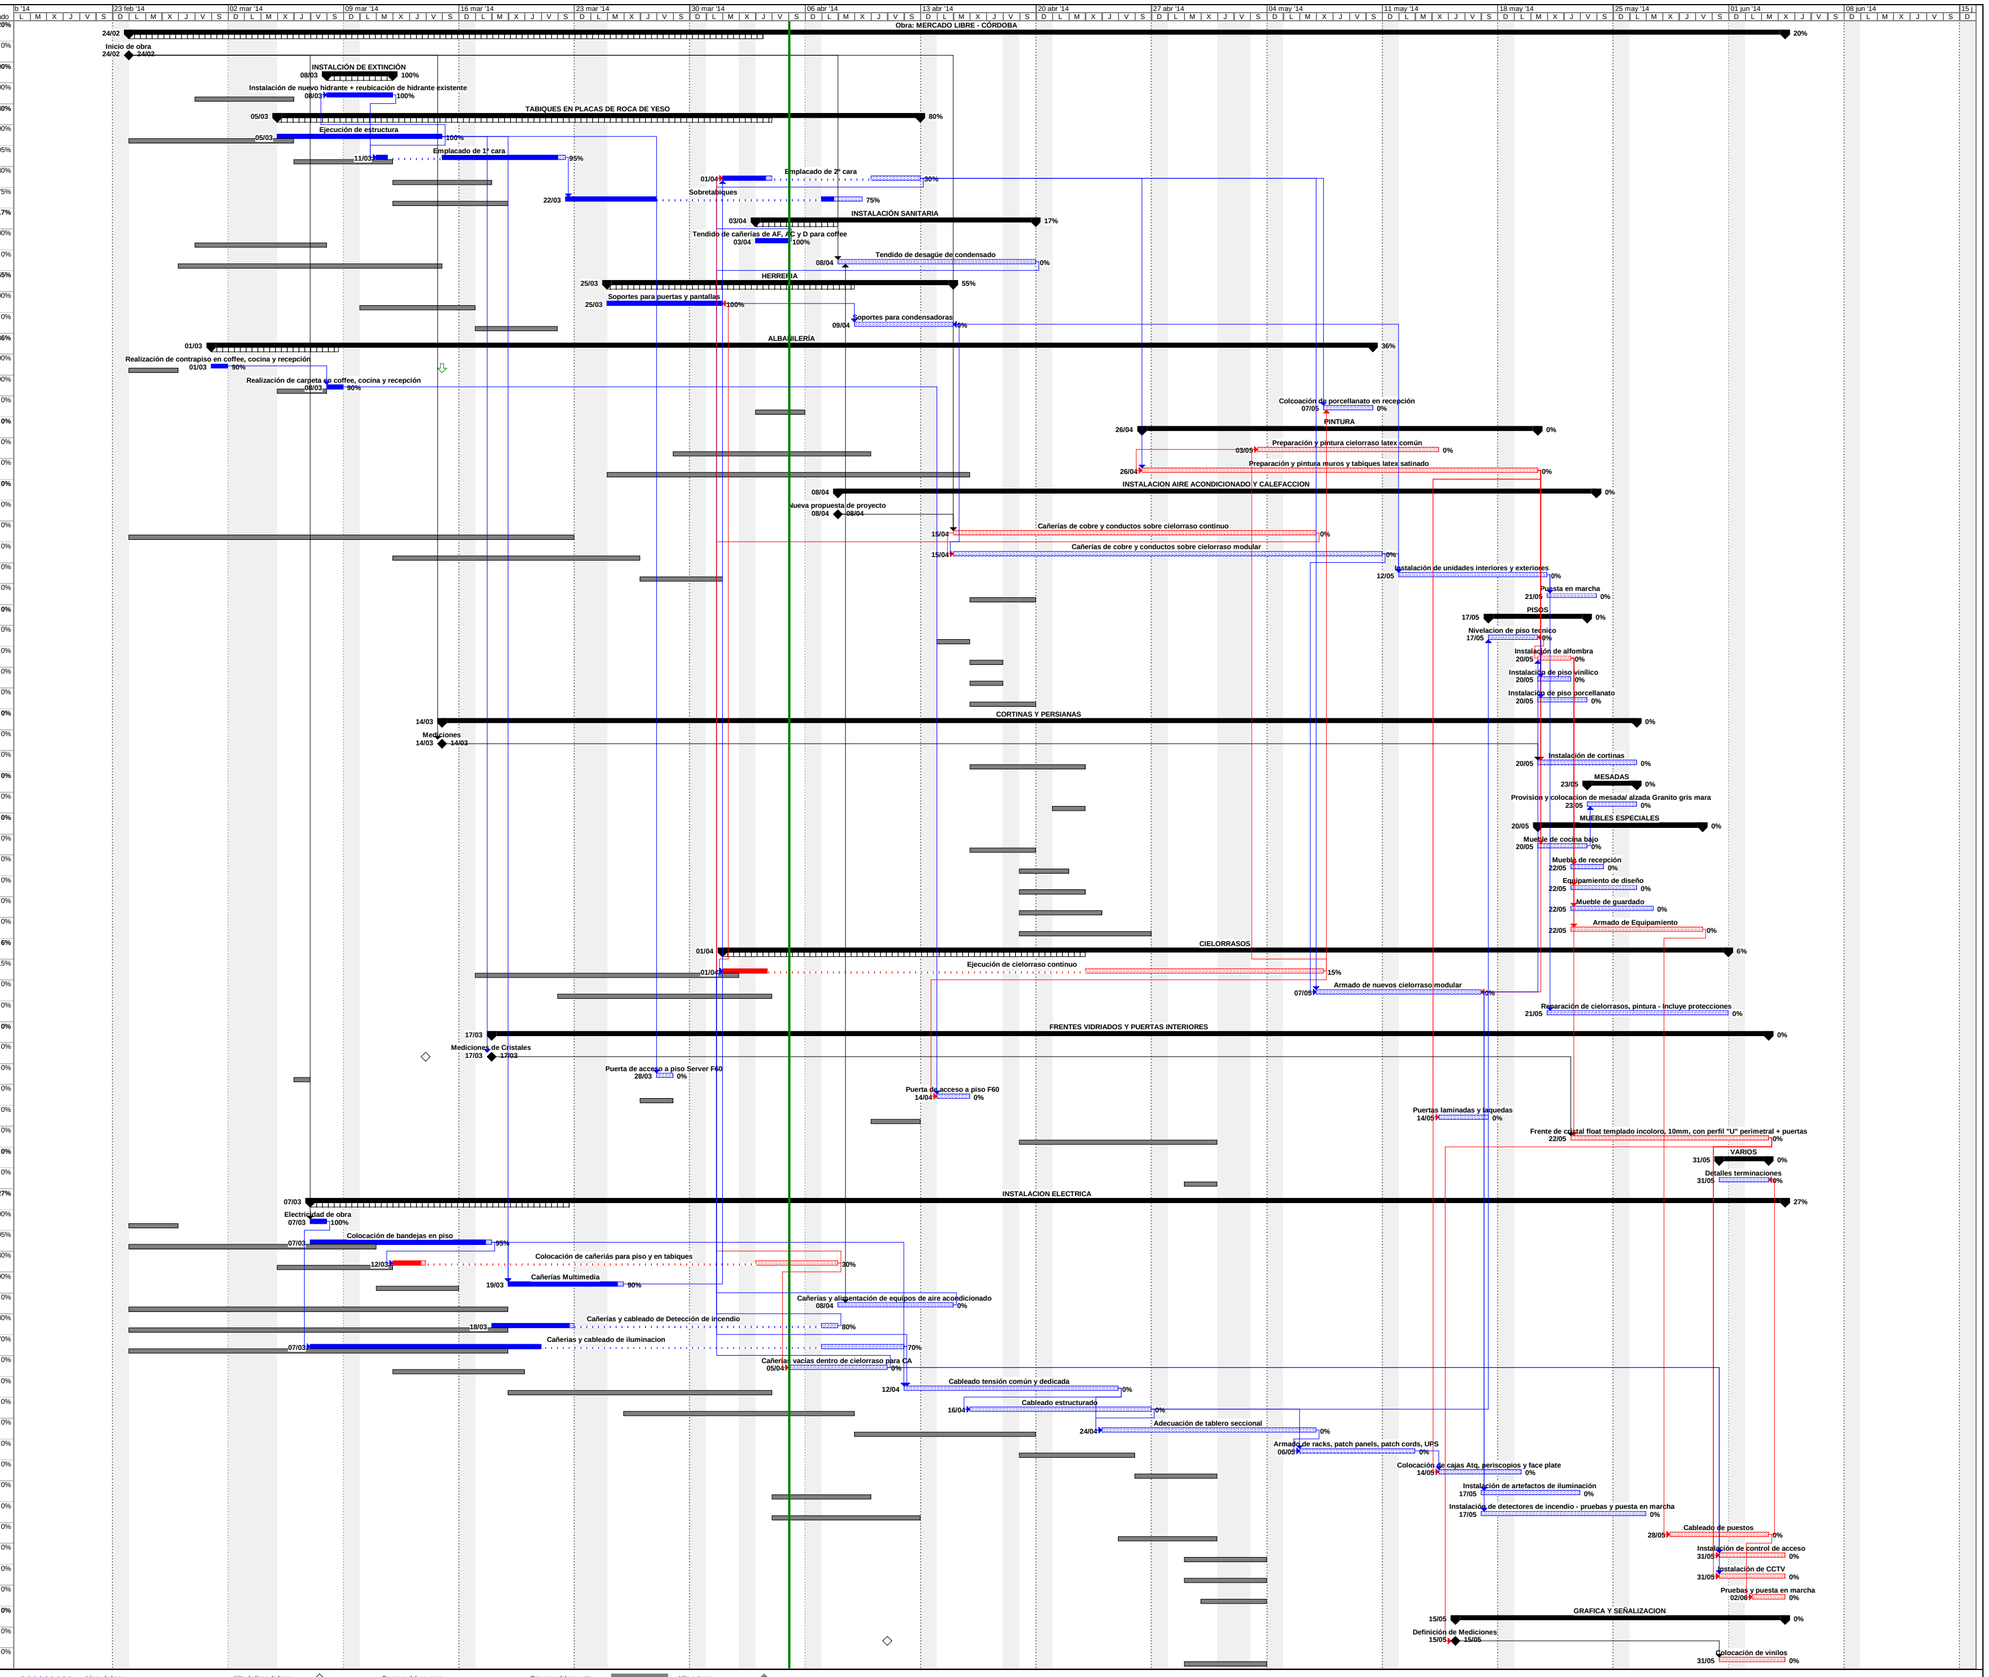

Proyecto: MELI - CRONOGRAMA
Fecha: sáb 05/04/14

Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Línea de base · División de la línea de base · Hito de línea de base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite
