Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		**FOX CHANNELS**	**100 días**	**lun 28-07-14**	**lun 24-11-14**		
2		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**21 días**	**lun 28-07-14**	**jue 21-08-14**		
3		**Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques**	**2 días**	**lun 28-07-14**	**mar 29-07-14**		**11_12_13**
4		Inst. de Luminaria Provisoria	2 días	lun 28-07-14	mar 29-07-14		58CC_5FF
5		Inst. de Faenas	1 día	mar 29-07-14	mar 29-07-14	4FF	
6		Levantamiento de niveles	3 días	sáb 02-08-14	mié 06-08-14	13	7FC-2 días
7		Nivelación de Losa Pisos	12 días	lun 04-08-14	mar 19-08-14	6FC-2 días	51_56_8FC-1 día_14
8		**Trazado (sujeto a aprobación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación genera atraso en el desarrollo de la obra**	3 días	lun 18-08-14	jue 21-08-14	7FC-1 día	9FC+1 día
9		**APROBACION DE TRAZADO**	0 días	vie 22-08-14	vie 22-08-14	8FC+1 día	21_65FC-4 días_89_102
10		**DEMOLICIÓN**	**20 días**	**mié 30-07-14**	**vie 22-08-14**		
11		Desinstalación y retiro Artefactos Sanitarios Existentes	2 días	mié 30-07-14	jue 31-07-14	3	
12		Desarme de Inst. Eléctrica actual áreas a demoler	2 días	mié 30-07-14	jue 31-07-14	3	
13		Demolición de tabiques existentes	4 días	mié 30-07-14	sáb 02-08-14	3	6
14		Corte de losa para escalera	3 días	mar 19-08-14	vie 22-08-14	7	16
15		**ESCALERA**	**45 días**	**vie 22-08-14**	**mié 15-10-14**		
16		Rectificacion de medidas	0 días	vie 22-08-14	vie 22-08-14	14	17_18FC+20 días
17		Preparacion de losa refuerzo	3 días	vie 22-08-14	mar 26-08-14	16	
18		Instalación de estructura	7 días	lun 15-09-14	mié 24-09-14	16FC+20 días	
19		Terminaciones escalera	7 días	mar 07-10-14	mié 15-10-14	41	
20		**TABIQUES**	**22 días**	**vie 22-08-14**	**mié 17-09-14**		
21		Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO).	10 días	vie 22-08-14	mié 03-09-14	9	22FC-5 días_30FF+4 días
22		Emplacado 1ª cara y aislación	7 días	jue 28-08-14	vie 05-09-14	21FC-5 días	23FF_60FC-2 días_64FC-
23		Refuerzos en tabiques	2 días	mié 03-09-14	vie 05-09-14	22FF	24
24		Emplacado 2ª cara	7 días	mar 09-09-14	mié 17-09-14	23_64FC-5 días	52FC-2 días_115
25		**CIELO, VIGA Y CENEFAS**	**40 días**	**mié 27-08-14**	**mar 14-10-14**		
26		**Cielo Duro**	**5 días**	**mié 08-10-14**	**mar 14-10-14**		
27		Estructura Cielo Duro	4 días	mié 08-10-14	lun 13-10-14	65FC-5 días_84_109_105	28FC-2 días
28		Emplacado Cielo duro	3 días	vie 10-10-14	mar 14-10-14	27FC-2 días	70
29		**Vigas Volcometal**	**22 días**	**mié 27-08-14**	**mar 23-09-14**		
30		Estructura de Vigas y dinteles	10 días	mié 27-08-14	lun 08-09-14	21FF+4 días	31FC-1 día
31		Emplacado de vigas y dinteles	7 días	sáb 13-09-14	mar 23-09-14	30FC-1 día_65FC-5 días_84_91FC-4 días_1	33_55
32		**Cielo Modular**	**16 días**	**mié 24-09-14**	**sáb 11-10-14**		
33		Instalación de Grilla de Cielo Modular	5 días	mié 24-09-14	lun 29-09-14	51_31_65_84_109_103	34_104FC-2 días_54_97
34		Instalación de palmetas	3 días	mié 08-10-14	sáb 11-10-14	33_67FC-6 días_93_94FC-5 días_95_96_10	70FC-2 días_111
35		**TABIQUERIA DE CRISTAL**	**21 días**	**mié 01-10-14**	**sáb 25-10-14**		
36		Rectificación de medidas cristales	0 días	mié 01-10-14	mié 01-10-14	52FC-4 días_55FC-3 días	37FC+5 días
37		Instalación de perfiles y cristales	8 días	mar 07-10-14	jue 16-10-14	36FC+5 días	38FC+4 días_49
38		Instalación de film	4 días	mar 21-10-14	sáb 25-10-14	37FC+4 días_41	
39		**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS**	**17 días**	**lun 22-09-14**	**vie 10-10-14**		
40		Llegada de alfombra a obra	1 día	lun 22-09-14	lun 22-09-14		41
41		Instalación de Alfombra	6 días	mar 30-09-14	mar 07-10-14	53_40	45_118_19_120_38
42		Instalación de porcelanato PISO	4 días	sáb 27-09-14	jue 02-10-14	52_60_61	45_118_43FC+3 días_49
43		Instalación de porcelanato MUROS	4 días	lun 06-10-14	vie 10-10-14	52_60_61_42FC+3 días	62
44		**GUARDAPOLVOS**	**6 días**	**mar 07-10-14**	**mar 14-10-14**		
45		Instalación de guardapolvos	6 días	mar 07-10-14	mar 14-10-14	54_41_42	123
46		**PUERTAS**	**20 días**	**sáb 04-10-14**	**mar 28-10-14**		
47		**Puertas de Madera**	**20 días**	**sáb 04-10-14**	**mar 28-10-14**		
48		Rectificación de medidas	0 días	sáb 04-10-14	sáb 04-10-14	55_52	
49		Instalación de Marcos y puertas	10 días	jue 16-10-14	mar 28-10-14	37_42	
50		**PINTURA**	**62 días**	**lun 28-07-14**	**jue 09-10-14**		
51		Prep. y enlucido pilares y muros existentes	4 días	mar 19-08-14	sáb 23-08-14	7	33
52		Preparación de tabiques	10 días	lun 15-09-14	sáb 27-09-14	24FC-2 días	42_43_48_53FC-2 días_
53		Pintura en muros y tabiques 1º mano	4 días	vie 26-09-14	mar 30-09-14	52FC-2 días	41_73FC-1 día_118_74F
54		Pintura en muros y tabiques 2º mano	4 días	lun 29-09-14	vie 03-10-14	33_53FC-2 días	45_123_75_81
55		Preparación, empastado de vigas y dinteles	10 días	mié 24-09-14	sáb 04-10-14	31	48_36FC-3 días
56		Pintura areas de losa a la vista 1era mano	3 días	mar 19-08-14	vie 22-08-14	7	70
57		Pintura areas de losa a la vista 2da mano	3 días	lun 06-10-14	jue 09-10-14	65_84_92_94_106_109	
58		Pintura en cielo	6 días	lun 28-07-14	sáb 02-08-14	4CC	123_111
59		**INSTALACION SANITARIA**	**38 días**	**mié 03-09-14**	**sáb 18-10-14**		
60		Tuberías y Ductos Alcantarillado	7 días	mié 03-09-14	jue 11-09-14	22FC-2 días	42_43_61FF+2 días_62
61		Inst. cañerías agua potable	7 días	vie 05-09-14	sáb 13-09-14	60FF+2 días	42_43_62
62		Inst. de artefactos	7 días	vie 10-10-14	sáb 18-10-14	60_61_42_43	
63		**ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	**68 días**	**mar 02-09-14**	**sáb 22-11-14**		**125FC+1 día**
64		Canalizaciones por tabiquería	10 días	mié 03-09-14	lun 15-09-14	22FC-2 días	24FC-5 días_66_80_98F
65		Canalizaciones por cielo	15 días	mar 02-09-14	sáb 20-09-14	9FC-4 días_90FC-2 días	67_80FC-3 días_31FC-5
66		Cableado por tabiquería	8 días	lun 15-09-14	jue 25-09-14	64	71_73FC-1 día_74FC-1 d
67		Cableado por cielo	10 días	lun 22-09-14	jue 02-10-14	65	71_73FC-2 días_72_34F
68		Canalización de mobiliario	12 días	mié 29-10-14	vie 14-11-14	121FC-2 días	69FF+2 días
69		Cableado por mobiliario	10 días	mié 05-11-14	lun 17-11-14	68FF+2 días	71_75
70		Instalación de luminarias	6 días	mar 14-10-14	mar 21-10-14	34FC-2 días_56_28	71
71		Trabajos en tableros	3 días	lun 17-11-14	jue 20-11-14	66_67_69_70	123FF
72		Arranques electricos para clima	8 días	jue 02-10-14	sáb 11-10-14	67_90	
73		Instalación de Interruptores	6 días	mar 30-09-14	mar 07-10-14	66FC-1 día_67FC-2 días_53FC-1 día	
74		Instalación de face plates	6 días	mar 30-09-14	mar 07-10-14	66FC-1 día_67FC-2 días_53FC-1 día	
75		Instalación y armado de Rack bastidor	4 días	lun 17-11-14	vie 21-11-14	66FC-1 día_67FC-2 días_42_54_69	76_77
76		Certificación	2 días	vie 21-11-14	sáb 22-11-14	75	
77		Rotulación	2 días	vie 21-11-14	sáb 22-11-14	75	
78		**CORRIENTES DEBILES**	**38 días**	**vie 22-08-14**	**mar 07-10-14**		
79		**Control de Acceso**	**17 días**	**mar 16-09-14**	**mar 07-10-14**		
80		Cableado	3 días	mar 16-09-14	sáb 20-09-14	64_65FC-3 días	
81		Reubicación e Ints. pulsadores.	3 días	vie 03-10-14	mar 07-10-14	22_54	82FF
82		Prueba y puesta en marcha	2 días	sáb 04-10-14	mar 07-10-14	81FF	
83		**CCTV**	**14 días**	**vie 22-08-14**	**lun 08-09-14**		
84		Canaización CCTV	6 días	vie 22-08-14	vie 29-08-14	109FF	31_33_57_85_27
85		Cableado	4 días	vie 29-08-14	mié 03-09-14	84	86
86		Instalación de camaras	4 días	mié 03-09-14	lun 08-09-14	85	87FF
87		Prueba y puesta en marcha	2 días	vie 05-09-14	lun 08-09-14	86FF	
88		**CLIMA**	**42 días**	**vie 22-08-14**	**sáb 11-10-14**		
89		Trazado y definición Ubicación de equipos	3 días	vie 22-08-14	mar 26-08-14	9	90
90		Instalación de Equipos de Clima	8 días	mar 26-08-14	jue 04-09-14	89	65FC-2 días_91_92_94_
91		Instalación de piping	10 días	jue 04-09-14	mar 16-09-14	90	93_98_31FC-4 días
92		Red de tubos de desagues	4 días	jue 04-09-14	mar 09-09-14	90	57
93		Prueba de Presión	2 días	mar 16-09-14	sáb 20-09-14	91	99_34
94		Instalación de plenos y ductos en hojalatería.	15 días	jue 04-09-14	mar 23-09-14	90	96_34FC-5 días_57
95		Conexión electrica de equipos	4 días	vie 12-09-14	mié 17-09-14	90_65FC-6 días	98_34
96		Instalación de mangas	4 días	mié 24-09-14	sáb 27-09-14	94	97FC-2 días_34
97		Instalación de difusores y retornos	8 días	lun 29-09-14	mié 08-10-14	96FC-2 días_33	99
98		Instalación de termostatos	8 días	mar 30-09-14	jue 09-10-14	90_91_95_64FF_53	99
99		Prueba y puesta en marcha	2 días	jue 09-10-14	sáb 11-10-14	93_97_98	
100		**SEGURIDAD**	**60 días**	**vie 22-08-14**	**mar 04-11-14**		
101		**Extincion**	**39 días**	**vie 22-08-14**	**mié 08-10-14**		
102		Matriz pipping	6 días	vie 22-08-14	vie 29-08-14	9	103
103		Ramales	6 días	vie 29-08-14	vie 05-09-14	102	104_31FC-3 días_33
104		Bajada de velas	4 días	sáb 27-09-14	mié 01-10-14	33FC-2 días_103	106
105		Pruebas de presión	2 días	lun 06-10-14	mié 08-10-14	106	34_27
106		Instalación de sprinklers	4 días	mié 01-10-14	lun 06-10-14	104	107_57_105
107		Puesta en marcha	2 días	lun 06-10-14	mié 08-10-14	106	
108		**Detección**	**60 días**	**vie 22-08-14**	**mar 04-11-14**		
109		Canalización de detección	6 días	vie 22-08-14	vie 29-08-14	9	110_84FF_33_57_27
110		Cableado de sensores	4 días	vie 29-08-14	mié 03-09-14	109	34
111		Instalación de detectores	4 días	sáb 11-10-14	jue 16-10-14	34_58	
112		Conexión a central	1 día	lun 03-11-14	mar 04-11-14	119	113FF
113		Puesta en marcha	2 días	jue 30-10-14	mar 04-11-14	112FF	
114		**CORTINAS**	**37 días**	**mié 17-09-14**	**lun 03-11-14**		
115		Rectificación de medidas	0 días	mié 17-09-14	mié 17-09-14	24	
116		Instalación de cortinas	4 días	lun 27-10-14	lun 03-11-14	119FF	
117		**MOBILIARIO ESPECIAL**	**10 días**	**mar 07-10-14**	**sáb 18-10-14**		
118		Instalacion mobiliario especial	10 días	mar 07-10-14	sáb 18-10-14	41_42_63	
119		**INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA**	**14 días**	**mié 15-10-14**	**lun 03-11-14**		**112_116FF**
120		Llegada de mobiliario a obra	1 día	mié 15-10-14	jue 16-10-14	41	121FC+1 día
121		Instalación y armado	12 días	vie 17-10-14	lun 03-11-14	120FC+1 día	68FC-2 días_123FC-3 día
122		**ASEO**	**7 días**	**mié 12-11-14**	**jue 20-11-14**		
123		Aseo Final	7 días	mié 12-11-14	jue 20-11-14	121FC-3 días_45_54_58_71FF	125FC+1 día
124		**ENTREGA DE OBRA**	**0 días**	**lun 24-11-14**	**lun 24-11-14**		
125		Entrega provisoria de obra.	0 días	lun 24-11-14	lun 24-11-14	123FC+1 día_63FC+1 día	

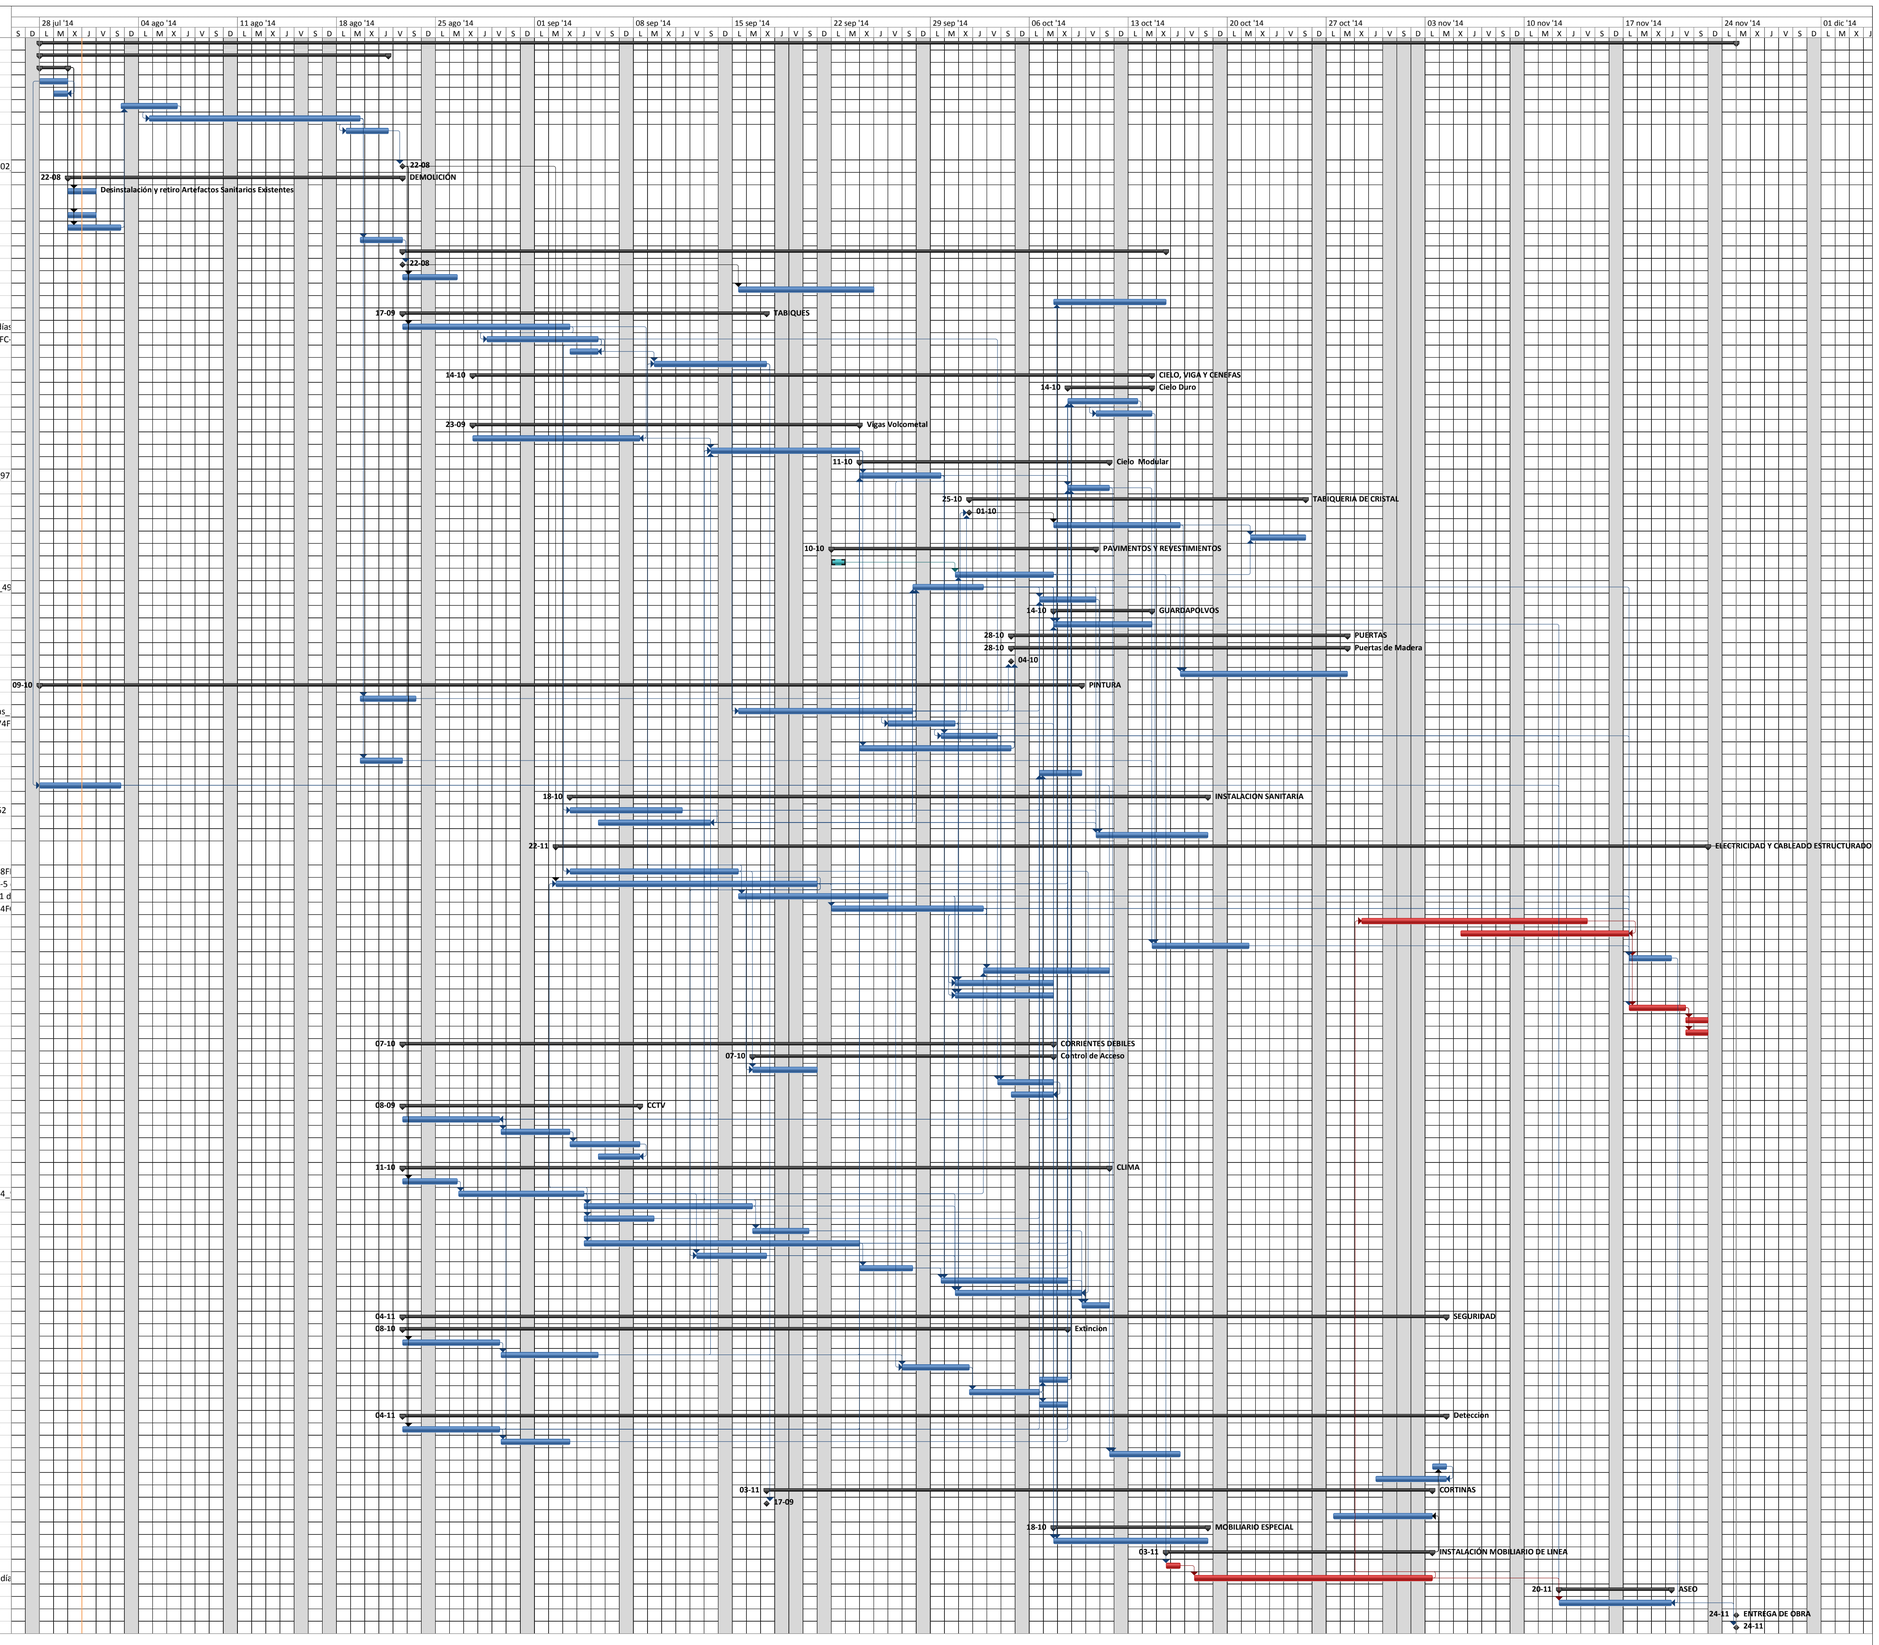

Proyecto: Carta Gantt - FOX CHAN
Fecha: jue 31-07-14

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso
