Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**PICHARA**	**57 días**	**lun 08-09-14**	**vie 28-11-14**
1		**Requisitos de ingreso**	**0 días**	**lun 08-09-14**	**lun 08-09-14**
2		Entrega de piso	0 días	lun 08-09-14	lun 08-09-14
3		Autorización de ingreso	0 días	lun 08-09-14	lun 08-09-14
4		Retiro de cielo americano	0 días	lun 08-09-14	lun 08-09-14
5		**Trabajos preliminares**	**9 días**	**lun 08-09-14**	**lun 22-09-14**
6		Instalación tablero provisorio	1 día	lun 08-09-14	lun 08-09-14
7		Instalación de faena- protección hall y ascensor	2 días	lun 08-09-14	mar 09-09-14
8		Levantamiento topográfico	1 día	jue 11-09-14	jue 11-09-14
9		Nivelación de losa	4 días	vie 12-09-14	mié 17-09-14
10		Trazado	1 día	lun 22-09-14	lun 22-09-14
11		**Demolición**	**2 días**	**mar 09-09-14**	**mié 10-09-14**
12		Demolición de tabique divisorio en baños	1 día	mié 10-09-14	mié 10-09-14
13		Retiro de puertas protex	1 día	mar 09-09-14	mar 09-09-14
14		Demolición tabiques acceso	1 día	mié 10-09-14	mié 10-09-14
15		Retiro artefactos sanitarios	1 día	mar 09-09-14	mar 09-09-14
16		**Tabiquería de volcometal**	**8 días**	**mar 23-09-14**	**jue 02-10-14**
17		Estructura de tabiques	2 días	mar 23-09-14	mié 24-09-14
18		Emplacado primera cara	2 días	jue 25-09-14	vie 26-09-14
19		Emplacado segunda cara	1 día	jue 02-10-14	jue 02-10-14
20		**Cielos, vigas y cenefas**	**12 días**	**mar 07-10-14**	**mié 22-10-14**
21		**Vigas de volcometal**	**11 días**	**mar 07-10-14**	**mar 21-10-14**
22		Estructura de vigas	5 días	mar 07-10-14	lun 13-10-14
23		Emplacado de vigas	6 días	mar 14-10-14	mar 21-10-14
24		**Cielo americano**	**2 días**	**mié 08-10-14**	**jue 09-10-14**
25		Instalación de perfilería	1 día	mié 08-10-14	mié 08-10-14
26		Instalación de palmetas	1 día	jue 09-10-14	jue 09-10-14
27		**Cielo Duro**	**11 días**	**mié 08-10-14**	**mié 22-10-14**
28		Estructura de cielo duro	8 días	mié 08-10-14	vie 17-10-14
29		Emplacado de cielo duro	8 días	lun 13-10-14	mié 22-10-14
30		**Cielos acústicos**	**6 días**	**lun 13-10-14**	**lun 20-10-14**
31		Llegada de cielos acústicos	1 día	lun 13-10-14	lun 13-10-14
32		Instalación cielos acústicos	5 días	mar 14-10-14	lun 20-10-14
33		**Pintura**	**33 días**	**mar 23-09-14**	**vie 07-11-14**
34		Preparación de tabiques y muros	4 días	vie 03-10-14	mié 08-10-14
35		Pintura en muros y tabiques primera mano	2 días	jue 09-10-14	vie 10-10-14
36		Pintura en muros y tabiques segunda mano	2 días	jue 06-11-14	vie 07-11-14
37		Preparación y empastado de vigas	9 días	mié 22-10-14	mar 04-11-14
38		Pintura de vigas	3 días	jue 30-10-14	mar 04-11-14
39		Preparación de cielos duros y vistos	1 día	jue 23-10-14	jue 23-10-14
40		Pintura cielo duro primera mano	2 días	vie 24-10-14	lun 27-10-14
41		Pintur cielo duro segunda mano	2 días	lun 03-11-14	mar 04-11-14
42		Pintura de losa	2 días	mar 23-09-14	mié 24-09-14
43		**Electricidad y cableado estructurado**	**48 días**	**mar 23-09-14**	**vie 28-11-14**
44		Canalizaciones por tabiquería	3 días	lun 29-09-14	mié 01-10-14
45		Canalizaciones por cielo	8 días	jue 25-09-14	lun 06-10-14
46		Cableado por tabiquería	2 días	jue 02-10-14	vie 03-10-14
47		Cableado por cielo	5 días	mar 07-10-14	lun 13-10-14
48		Canalizaciones por piso	4 días	mar 23-09-14	vie 26-09-14
49		Canalización de mobiliario	3 días	vie 14-11-14	mar 18-11-14
50		Cableado de mobiliario	3 días	mié 19-11-14	vie 21-11-14
51		Instalación de luminarias	3 días	mar 28-10-14	jue 30-10-14
52		Instalación de luminarias HD	3 días	jue 16-10-14	lun 20-10-14
53		Trabajos en el tablero	4 días	lun 24-11-14	jue 27-11-14
54		Arranques eléctricos para equipos de clima	2 días	lun 29-09-14	mar 30-09-14
55		Instalación de interruptores	2 días	lun 13-10-14	mar 14-10-14
56		Instalación de face plates	2 días	lun 13-10-14	mar 14-10-14
57		Instalación y armado de rack	3 días	mar 25-11-14	jue 27-11-14
58		Certificación	1 día	vie 28-11-14	vie 28-11-14
59		Rotulación	1 día	vie 28-11-14	vie 28-11-14
60		**Clima**	**18 días**	**mar 23-09-14**	**jue 16-10-14**
61		Instalación y montaje de equipos	4 días	mar 23-09-14	vie 26-09-14
62		Matriz y columpios	6 días	lun 29-09-14	lun 06-10-14
63		Ductos de aire- inyección 30%	6 días	mar 07-10-14	mar 14-10-14
64		Despiches de clima	2 días	lun 29-09-14	mar 30-09-14
65		Prueba hidráulica clima	1 día	mar 07-10-14	mar 07-10-14
66		Instalación de mangas	2 días	jue 09-10-14	vie 10-10-14
67		Instalación de termostatos	2 días	lun 13-10-14	mar 14-10-14
68		Instalación de difusores	2 días	mié 15-10-14	jue 16-10-14
69		Visación del proyecto	0 días	mié 01-10-14	mié 01-10-14
70		Programación de equipos y puesta en marcha	1 día	mié 08-10-14	mié 08-10-14
71		**Control de acceso**	**30 días**	**mar 23-09-14**	**mar 04-11-14**
72		Canalización y cableado control acceso	3 días	mar 23-09-14	jue 25-09-14
73		Instalación de dispositivos de control	3 días	lun 20-10-14	mié 22-10-14
74		Instalación de retenedores	1 día	mar 04-11-14	mar 04-11-14
75		Instalación de pulsadores	1 día	lun 13-10-14	lun 13-10-14
76		Prueba y puesta en marcha	1 día	mar 14-10-14	mar 14-10-14
77		**Detección**	**27 días**	**mar 23-09-14**	**mié 29-10-14**
78		Canalización detección	2 días	mar 23-09-14	mié 24-09-14
79		Cableado detección	1 día	jue 25-09-14	jue 25-09-14
80		Instalación de detectores	1 día	mar 28-10-14	mar 28-10-14
81		Visación proyecto detección	0 días	mar 28-10-14	mar 28-10-14
82		Conexión a central y puesta en marcha	1 día	mié 29-10-14	mié 29-10-14
83		**Extinción**	**6 días**	**mar 23-09-14**	**mar 30-09-14**
84		Red piping matriz de agua	2 días	mar 23-09-14	mié 24-09-14
85		Instalacion de ramales y velas	1 día	jue 25-09-14	jue 25-09-14
86		Prueba de presión sprinklers	1 día	vie 26-09-14	vie 26-09-14
87		Instalación de sprinklers	1 día	lun 29-09-14	lun 29-09-14
88		Visación proyecto extinción	0 días	lun 29-09-14	lun 29-09-14
89		Prueba y puesta en marcha extinción	1 día	mar 30-09-14	mar 30-09-14
90		**Instalación sanitaria**	**12 días**	**jue 25-09-14**	**vie 10-10-14**
91		Instalación alcantarillado	1 día	vie 26-09-14	vie 26-09-14
92		Instalación agua potable	2 días	jue 25-09-14	vie 26-09-14
93		Instalación de artefactos	1 día	jue 09-10-14	jue 09-10-14
94		Prueba hidráulica	1 día	vie 10-10-14	vie 10-10-14
95		**Pavimentos**	**36 días**	**lun 08-09-14**	**mié 29-10-14**
96		Llegada de alfombra a obra	0 días	jue 16-10-14	jue 16-10-14
97		Instalación de alfombra	4 días	vie 17-10-14	mié 22-10-14
98		Llegada de piso vinílico	0 días	lun 08-09-14	lun 08-09-14
99		Instalación de piso vinílico	2 días	mar 28-10-14	mié 29-10-14
100		Llegada de porcelanato	0 días	lun 08-09-14	lun 08-09-14
101		Instalación de porcelanato	2 días	vie 03-10-14	lun 06-10-14
102		**Guardapolvos**	**3 días**	**lun 27-10-14**	**mié 29-10-14**
103		Instalación de guardapolvos	3 días	lun 27-10-14	mié 29-10-14
104		**Tabiquería de cristal**	**8 días**	**jue 30-10-14**	**mar 11-11-14**
105		Rectificación de medidas tabiquería cristal	0 días	mar 04-11-14	mar 04-11-14
106		Instalación de perfiles	2 días	mié 05-11-14	jue 06-11-14
107		Instalación de cristales y sellos	3 días	vie 07-11-14	mar 11-11-14
108		Instalación de puertas protex	2 días	jue 30-10-14	lun 03-11-14
109		Instalación puertas y marcos	4 días	jue 30-10-14	mié 05-11-14
110		**Mobiliario especial**	**40 días**	**lun 08-09-14**	**mié 05-11-14**
111		Compra mobiliario especial	0 días	lun 08-09-14	lun 08-09-14
112		Instalación de muros divisores recepción	3 días	mar 28-10-14	jue 30-10-14
113		Instalación mobiliario kitchenette	2 días	mar 07-10-14	mié 08-10-14
114		Instalación mobiliario especial y general	3 días	lun 03-11-14	mié 05-11-14
115		**Cortinas**	**1 día**	**mar 04-11-14**	**mié 05-11-14**
116		Llegada cortinas a obra	0 días	mar 04-11-14	mar 04-11-14
117		Instalación cortinas	1 día	mié 05-11-14	mié 05-11-14
118		**Mobiliario de línea**	**46 días**	**lun 08-09-14**	**jue 13-11-14**
119		Compra mobiario de línea	0 días	lun 08-09-14	lun 08-09-14
120		Llegada de mobiliario línea a obra	1 día	mié 05-11-14	mié 05-11-14
121		Instalación y armado mobiliario de línea	6 días	jue 06-11-14	jue 13-11-14
122		Aseo final	4 días	mar 25-11-14	vie 28-11-14
123		Entrega de obra	0 días	vie 28-11-14	vie 28-11-14

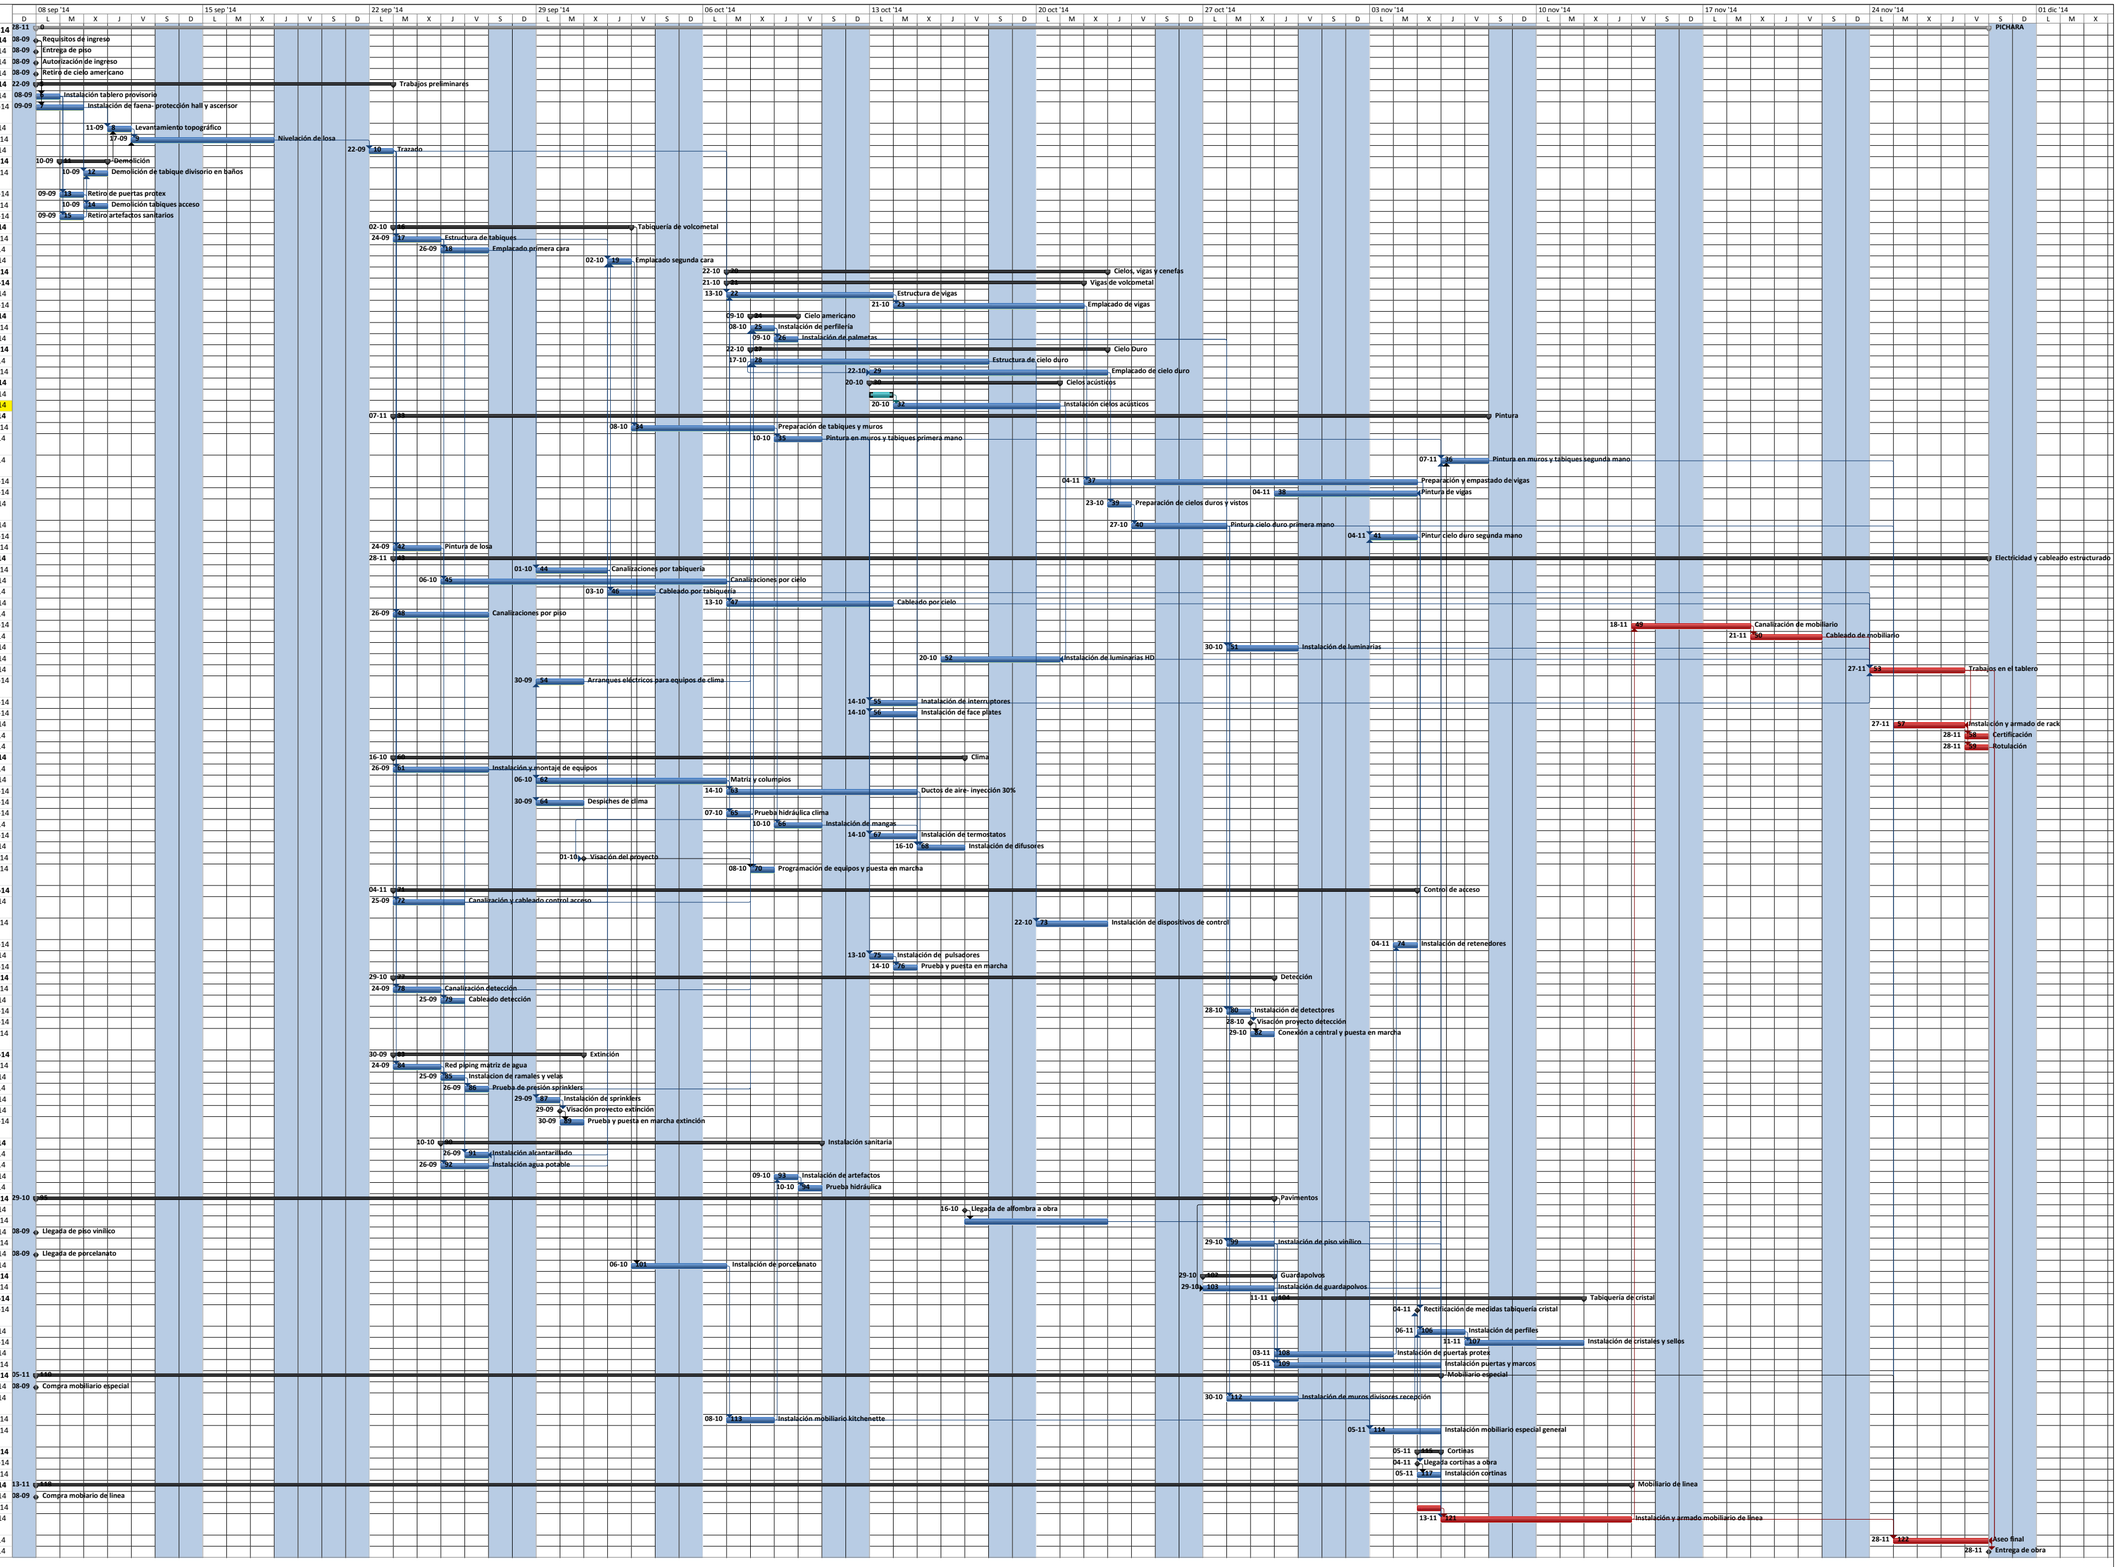

Proyecto: PICHARA
Fecha: vie 05-09-14

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base
