Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CUMMINS PA**	**50 días**	**mié 15/10/14**	**vie 12/12/14**
2	Inicio de Obra	1 día	mié 15/10/14	jue 16/10/14
3	**REMODELACION DE OFICINAS**	**50 días**	**mié 15/10/14**	**vie 12/12/14**
4	**Demoliciones**	**39 días**	**mié 15/10/14**	**sáb 29/11/14**
5	Descolocacion de alfombras	2 días	mié 15/10/14	vie 17/10/14
6	Desmonte y retiro varios	1 día	jue 16/10/14	vie 17/10/14
7	Desarme de cielorraso modular	14 días	jue 16/10/14	sáb 01/11/14
8	Retiro de cortinas	1 día	sáb 01/11/14	lun 03/11/14
9	Demolicion de tabiques de yeso	3 días	mar 04/11/14	vie 07/11/14
10	Descolocacion de puertas	1 día	vie 07/11/14	sáb 08/11/14
11	Carga de volquete	37 días	vie 17/10/14	sáb 29/11/14
12	**Albañileria**	**10 días**	**mar 11/11/14**	**sáb 22/11/14**
13	Picado de carpeta para canalizaciones	5 días	mar 11/11/14	lun 17/11/14
14	Reparacion de carpetas	5 días	lun 17/11/14	sáb 22/11/14
15	**Tabiques de Durlock**	**7 días**	**mar 11/11/14**	**mié 19/11/14**
16	Armado de estructura	2 días	mar 11/11/14	jue 13/11/14
17	Emplacado de una cara	1 día	mar 11/11/14	mié 12/11/14
18	Ejecucion de vanos	0 días	mié 12/11/14	mié 12/11/14
19	Reparaciones varias	6 días	mié 12/11/14	mié 19/11/14
20	Colocacion de puertas y paños fijos	0 días	mié 19/11/14	mié 19/11/14
21	Emplacado total y masillado	2 días	mié 12/11/14	vie 14/11/14
22	**Cielorraso Desmontable**	**9 días**	**mar 25/11/14**	**vie 05/12/14**
23	Estructura	5 días	mar 25/11/14	lun 01/12/14
24	Emplacado	4 días	lun 01/12/14	vie 05/12/14
25	**Instalacion de alfombra**	**4 días**	**lun 01/12/14**	**vie 05/12/14**
26	Colocacion	3 días	lun 01/12/14	jue 04/12/14
27	Cortes y calados	1 día	jue 04/12/14	vie 05/12/14
28	Colocacion de varillas	1 día	jue 04/12/14	vie 05/12/14
29	**Zocalos**	**2 días**	**jue 04/12/14**	**sáb 06/12/14**
30	Colocacion	2 días	jue 04/12/14	sáb 06/12/14
31	**Pintura**	**13 días**	**lun 24/11/14**	**mar 09/12/14**
32	Preparacion de tabiques, masillado y lijado	7 días	lun 24/11/14	mar 02/12/14
33	Pintura de tabiques latex mate	10 días	jue 27/11/14	mar 09/12/14
34	Pintura de tabiques latex color	4 días	mar 02/12/14	sáb 06/12/14
35	Pintura de zocalos de madera	3 días	vie 05/12/14	mar 09/12/14
36	**Instalacion Electrica**	**48 días**	**jue 16/10/14**	**jue 11/12/14**
37	Desarme de instalaciones bajo piso	6 días	jue 16/10/14	jue 23/10/14
38	Desarme de artefactos de iluminacion	6 días	lun 20/10/14	lun 27/10/14
39	Desarme de tablero seccional	2 días	jue 23/10/14	sáb 25/10/14
40	Iluminacion de obra	3 días	lun 27/10/14	jue 30/10/14
41	Canalizaciones para iluminacion, bocas	8 días	jue 30/10/14	sáb 08/11/14
42	Canalizaciones para puestos	5 días	lun 17/11/14	sáb 22/11/14
43	Canalizacion para efectos en tabiques	2 días	mié 19/11/14	vie 21/11/14
44	Canalizacion para proyectores y TV	2 días	mié 19/11/14	vie 21/11/14
45	Tomacorriente de servicios	3 días	mié 19/11/14	sáb 22/11/14
46	Colocacion de pisoductos	5 días	lun 17/11/14	sáb 22/11/14
47	Colocacion de periscopios	3 días	vie 05/12/14	mar 09/12/14
48	Colocacion de unicanal y faceplate muebles	3 días	lun 08/12/14	jue 11/12/14
49	Instalacion de carteles de evacuacion	2 días	lun 01/12/14	mié 03/12/14
50	Instalacion de artefactos iluminacion	7 días	lun 01/12/14	mar 09/12/14
51	**Instalacion Aire Acondicionado**	**28 días**	**lun 03/11/14**	**vie 05/12/14**
52	Desmonte de conductos	4 días	lun 17/11/14	vie 21/11/14
53	Aislacion de conductos existente	4 días	mié 19/11/14	lun 24/11/14
54	Montaje de conductos existente	4 días	lun 24/11/14	vie 28/11/14
55	Colocacion de conductos rigidos y flexibles	3 días	vie 28/11/14	mar 02/12/14
56	Reubicacion de split	3 días	lun 17/11/14	jue 20/11/14
57	Colocacion de rejas y difusores	3 días	lun 01/12/14	jue 04/12/14
58	**Instalacion Deteccion de Incendio**	**28 días**	**lun 03/11/14**	**vie 05/12/14**
59	Desarme existente	2 días	lun 03/11/14	mié 05/11/14
60	Canalizaciones sobre losa	4 días	vie 21/11/14	mié 26/11/14
61	Cableado	3 días	mié 26/11/14	sáb 29/11/14
62	Colocacion de detectores	2 días	mié 03/12/14	vie 05/12/14
63	**Iluminacion**	**20 días**	**sáb 08/11/14**	**mar 02/12/14**
64	Compra de artefactos	20 días	sáb 08/11/14	mar 02/12/14
65	Entrega de artefactos	0 días	lun 01/12/14	lun 01/12/14
66	**Cortinas Rollers**	**2 días**	**lun 08/12/14**	**mié 10/12/14**
67	Instalacion rollers	2 días	lun 08/12/14	mié 10/12/14
68	**Grafica**	**14 días**	**mié 26/11/14**	**vie 12/12/14**
69	Produccion en taller	10 días	mié 26/11/14	lun 08/12/14
70	Colocacion de vinilos	3 días	mar 09/12/14	vie 12/12/14
71	Colocacion de logos corporeos	3 días	mar 09/12/14	vie 12/12/14
72	**Mobiliario de Interieur Forma**	**3 días**	**jue 04/12/14**	**lun 08/12/14**
73	Entrega	0 días	jue 04/12/14	jue 04/12/14
74	Armado	2 días	vie 05/12/14	lun 08/12/14
75	**Mobiliario Tempo**	**5 días**	**jue 04/12/14**	**mié 10/12/14**
76	Entrega	0 días	jue 04/12/14	jue 04/12/14
77	Armado	4 días	vie 05/12/14	mié 10/12/14
78	**Asientos**	**2 días**	**mié 10/12/14**	**vie 12/12/14**
79	Entrega	2 días	mié 10/12/14	vie 12/12/14
80	**Limpieza de obra**	**4 días**	**lun 08/12/14**	**vie 12/12/14**
81	Limpieza final	4 días	lun 08/12/14	vie 12/12/14
82	**CONTRATISTAS CUMMINS**	**26 días**	**mar 11/11/14**	**jue 11/12/14**
83	**Instalación cableado estructurado**	**26 días**	**mar 11/11/14**	**jue 11/12/14**
84	Desmonte cableado existente	1 día	mar 11/11/14	mié 12/11/14
85	Cableado de puestos UTP	5 días	lun 24/11/14	sáb 29/11/14
86	Certificacion de puestos	1 día	mié 10/12/14	jue 11/12/14
87	Conexión Data Center	3 días	lun 01/12/14	jue 04/12/14
88	Final 1º Etapa	0 días	vie 12/12/14	vie 12/12/14

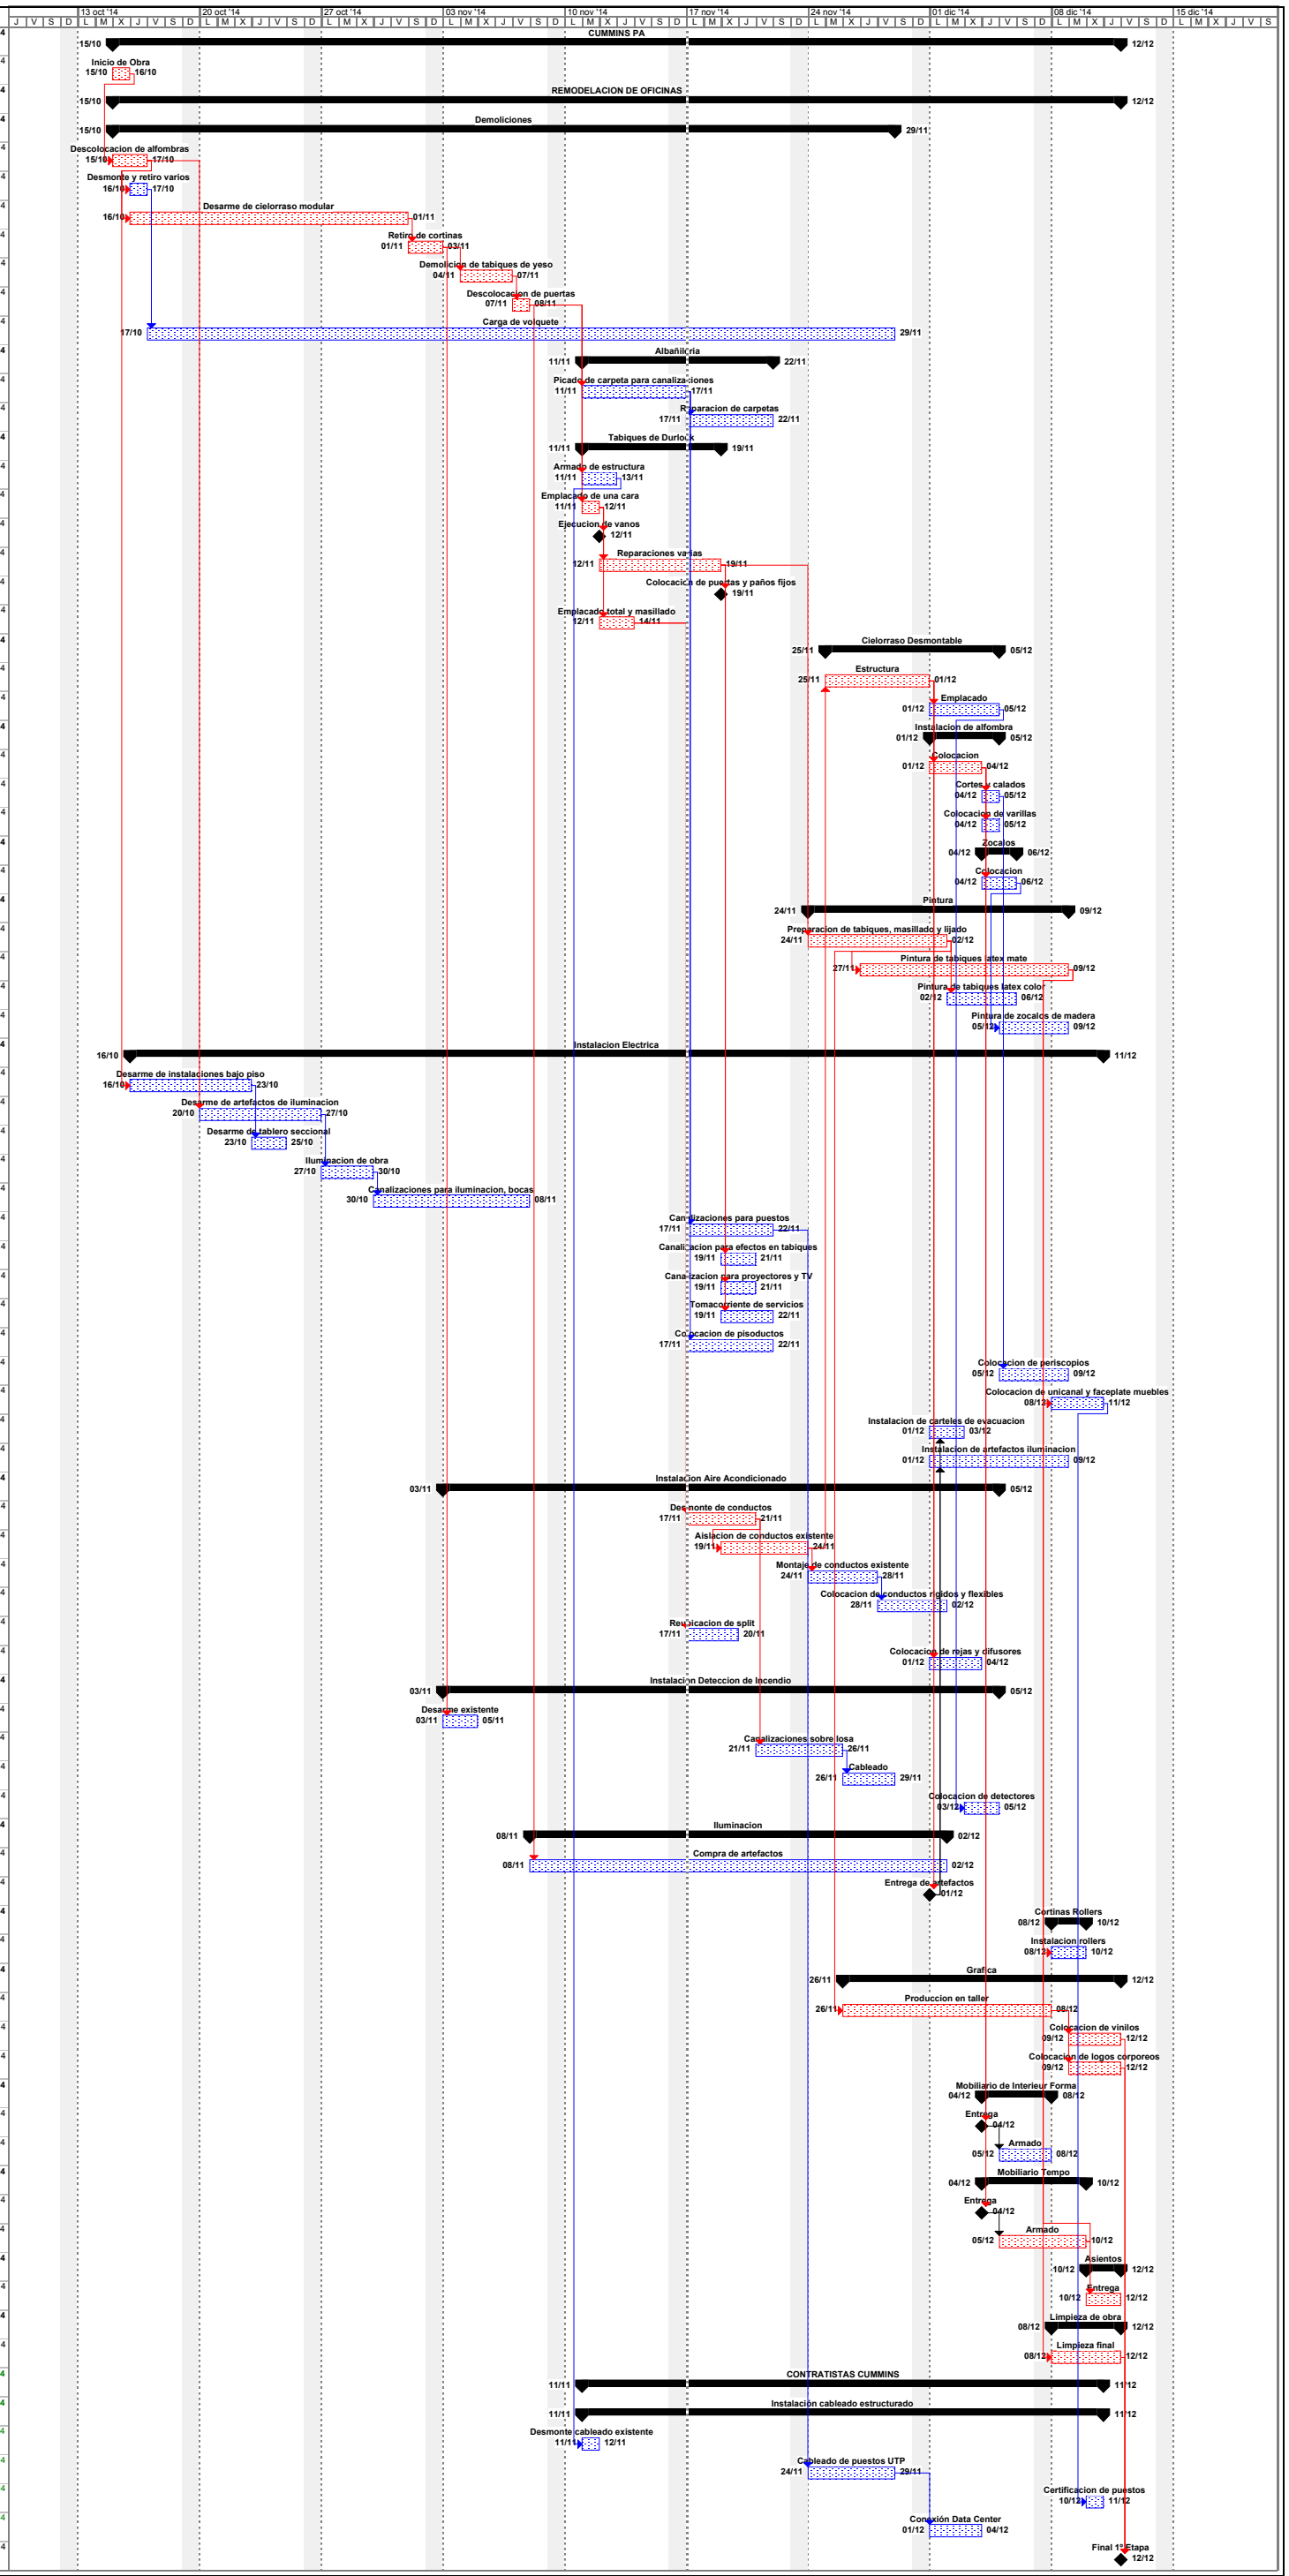

Proyecto: CUMMINS PA - AVANC
Fecha: lun 17/11/14

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite
