Id		Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Duración1
1		**Dias Corridos**	**120 días**	**lun 23/02/15**	**mar**	**128 días**
2		**OBRA ADT**	**86 días**	**lun 23/02/15**	**mar**	**128 días**
3		Inicio de obra	1 día	lun 23/02/15	lun 23/02/15	1 día
4		**Tareas Preliminares**	**5 días**	**mar 24/02/15**	**lun 02/03/15**	**7 días**
5		TP-Protecciones	2 días	mar 24/02/15	mié 25/02/15	2 días
6		TP-Armado de baño provisorio de obra	3 días	jue 26/02/15	lun 02/03/15	5 días
7		**Contrapiso**	**37 días**	**mar 24/02/15**	**mié 22/04/15**	**58 días**
8		CP-Descarga material	1 día	mar 24/02/15	mar 24/02/15	1 día
9		CP-Realización de Contrapiso	4 días	vie 06/03/15	mié 11/03/15	6 días
10		CP-Alisado A/C	7 días	mar 14/04/15	mié 22/04/15	9 días
11		**Eléctrica**	**81 días**	**mar 24/02/15**	**mié 24/06/15**	**121 días**
12		EL-Replanteo Bandejas	2 días	lun 09/03/15	mar 10/03/15	2 días
13		EL-Ingreso de materiales	2 días	mar 24/02/15	mié 25/02/15	2 días
14		EL-Armado de tableros provisorios	1 día	jue 26/02/15	jue 26/02/15	1 día
15		EL-Canalizaciones bajo piso	6 días	jue 26/02/15	jue 05/03/15	8 días
16		EL-Canalizaciones en losa	9 días	vie 06/03/15	mié 18/03/15	13 días
17		EL-Canalizaciones en tabiques	6 días	lun 23/03/15	lun 06/04/15	15 días
18		EL-Colocación de cajas	5 días	mar 07/04/15	lun 13/04/15	7 días
19		EL-Cableado por piso	8 días	vie 06/03/15	mar 17/03/15	12 días
20		EL-Cableados en losa	8 días	mié 18/03/15	vie 27/03/15	10 días
21		EL-Cableado en tabiques	7 días	mar 14/04/15	mié 22/04/15	9 días
22		EL-Replanteo de luminarias	2 días	lun 06/04/15	mar 07/04/15	2 días
23		EL-Calado luminarias	2 días	vie 24/04/15	lun 27/04/15	4 días
24		EL-Colocación de luminarias	5 días	mié 08/04/15	mar 14/04/15	7 días
25		EL-Colocación de plaquetas	2 días	jue 28/05/15	vie 29/05/15	2 días
26		EL-Replanteo de puesto de trabajo	3 días	vie 17/04/15	mar 21/04/15	5 días
27		EL-Armado de puestos de potencia	7 días	mar 16/06/15	mié 24/06/15	9 días
28		EL-Armado de tableros	12 días	mié 18/03/15	jue 09/04/15	23 días
29		**Cableado estructurado**	**50 días**	**vie 17/04/15**	**vie 26/06/15**	**71 días**
30		CE-Tendido por bandeja	5 días	vie 17/04/15	jue 23/04/15	7 días
31		CE-Armado de terminales en puestos de trabajo	7 días	mar 16/06/15	mié 24/06/15	9 días
32		CE-Instalación de RACK	2 días	mié 13/05/15	jue 14/05/15	2 días
33		CE-Trabajos en Rack	9 días	vie 15/05/15	mié 27/05/15	13 días
34		CE-Certificación y Rotulado	3 días	mié 24/06/15	vie 26/06/15	3 días
35		**Detección de Incendio**	**5 días**	**jue 19/03/15**	**mié 25/03/15**	**7 días**
36		DI-Canalizaciones SDAI sobre cielorraso	5 días	jue 19/03/15	mié 25/03/15	7 días
37		**SEGURIDAD**	**7 días**	**mar 07/04/15**	**mié 15/04/15**	**9 días**
38		SE-Canalizaciones para CCTV, Control de acceso y portero	5 días	mar 07/04/15	lun 13/04/15	7 días
39		SE-Colocación de alambre guía	2 días	mar 14/04/15	mié 15/04/15	2 días
40		**Sanitaria de Baños y Coffee**	**71 días**	**mar 03/03/15**	**mié 17/06/15**	**107 días**
41		S-Desagüe en baño del P1 y coffee Barbacoa	3 días	mar 03/03/15	jue 05/03/15	3 días
42		S-Cañería de abastecimiento baño de P1 y coffee Barbacoa	3 días	lun 23/03/15	mié 25/03/15	3 días
43		S-Prueba hidráulica	1 día	jue 26/03/15	jue 26/03/15	1 día
44		S-Inspección IMM (plazo normativa)	3 días	jue 26/03/15	lun 06/04/15	12 días
45		S-Colocación de aparatos baños	5 días	mar 14/04/15	lun 20/04/15	7 días
46		S-Colocación de griferías en baño y Coffee	3 días	lun 15/06/15	mié 17/06/15	3 días
47		**Tabiques de yeso**	**46 días**	**jue 26/02/15**	**vie 08/05/15**	**72 días**
48		TY-Replanteo	1 día	jue 26/02/15	jue 26/02/15	1 día
49		TY-Colocación de soleras en losa	5 días	vie 27/02/15	jue 05/03/15	7 días
50		TY-Estructura Tabiques	7 días	jue 12/03/15	vie 20/03/15	9 días
51		TY-Emplacado primera cara con lana	6 días	lun 23/03/15	lun 06/04/15	15 días
52		TY-Colocación de refuerzos y ménsulas	3 días	lun 06/04/15	mié 08/04/15	3 días
53		TY-Emplacado segunda cara	6 días	jue 09/04/15	jue 16/04/15	8 días
54		TY-Revestimiento placa	1 día	jue 09/04/15	jue 09/04/15	1 día
55		TY-Masillado	15 días	vie 17/04/15	vie 08/05/15	22 días
56		**Cielorraso de yeso**	**62 días**	**jue 26/02/15**	**lun 01/06/15**	**96 días**
57		CY-Replanteo	1 día	jue 26/02/15	jue 26/02/15	1 día
58		CY-Estructura Cajones y Cenefas para AA	5 días	vie 27/02/15	jue 05/03/15	7 días
59		CY-Estructura Cielorraso oficina	9 días	vie 20/03/15	mié 08/04/15	20 días
60		CY-Colocación de refuerzos para mamparas de cristal	3 días	jue 09/04/15	lun 13/04/15	5 días
61		CY-Emplacado Cajones y Cenefas	7 días	mié 15/04/15	jue 23/04/15	9 días
62		CY-Emplacado Cielorraso Oficina	7 días	mié 15/04/15	jue 23/04/15	9 días
63		CY-Colocación de buñas perimetrales	5 días	jue 16/04/15	mié 22/04/15	7 días
64		CY-Masillado y Cantoneras en Cielorraso	10 días	jue 23/04/15	jue 07/05/15	15 días
65		CY-Masillado y Cantonear en Cajones y Cenefas	5 días	vie 24/04/15	jue 30/04/15	7 días
66		CY-Colocación de registros	4 días	mié 27/05/15	lun 01/06/15	6 días
67		**Pintura**	**65 días**	**mar 17/03/15**	**mar 23/06/15**	**99 días**
68		Pi- Tabiques Enduido y sellado	10 días	mar 28/04/15	mar 12/05/15	15 días

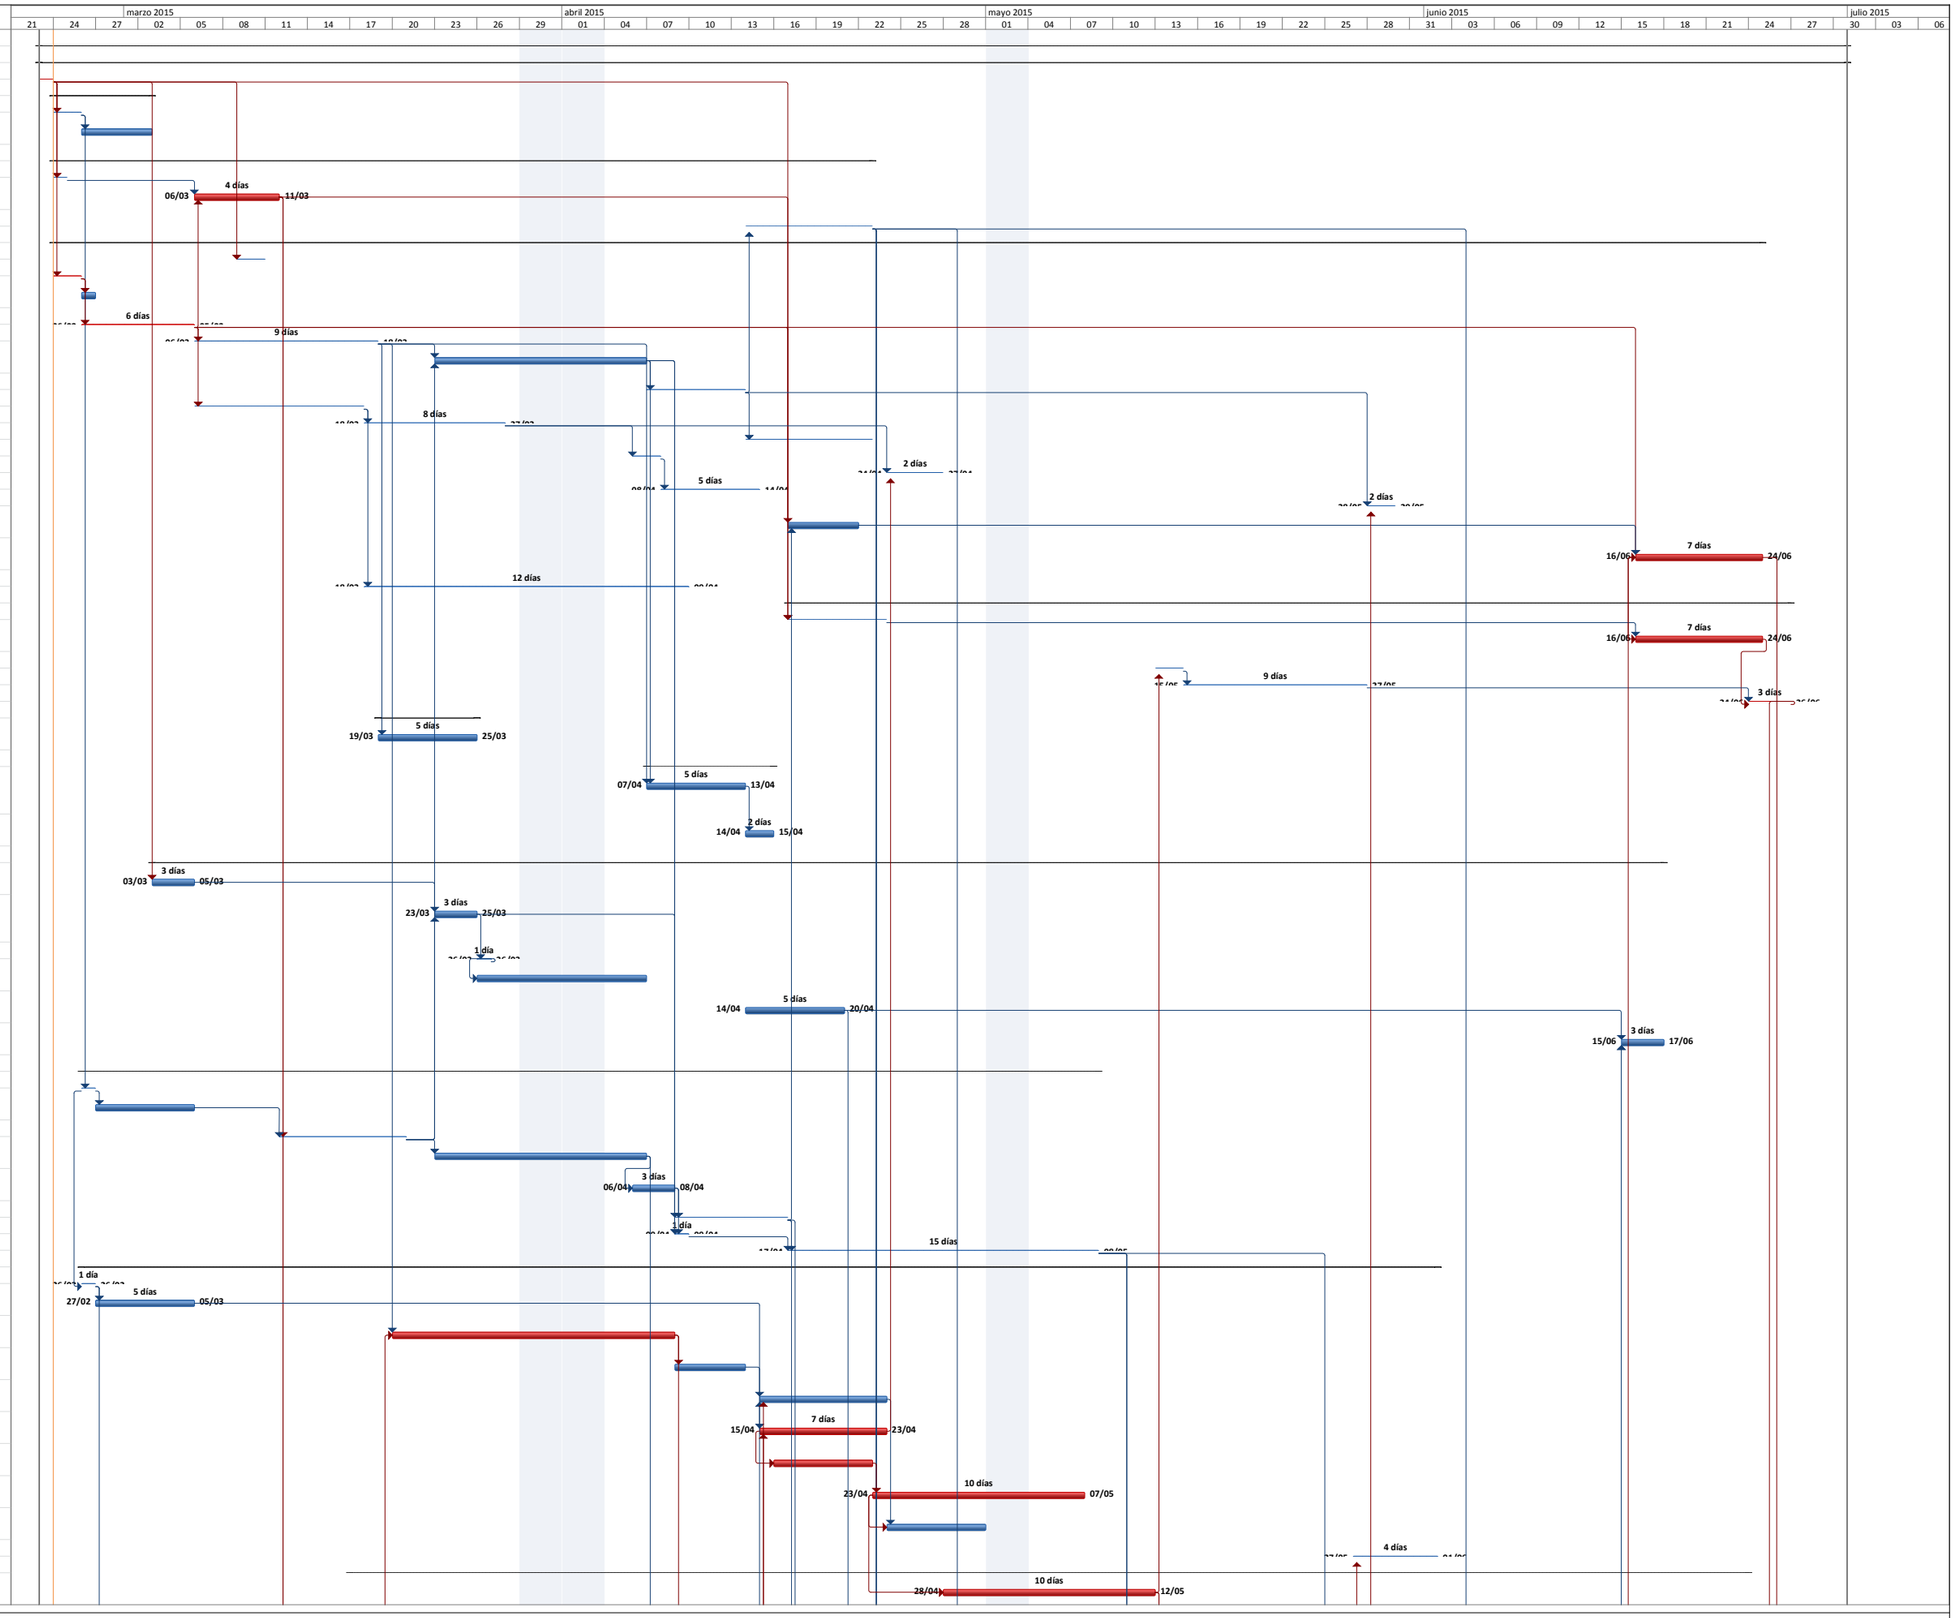

Obra: ADT
Dir: Arocena 1630

Tareas críticas		División		Resumen		División crítica resumida		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Fecha límite									
División crítica		Hito		Resumen del proyecto		Tareas externas		Hito inactivo		Sólo duración		Sólo el comienzo		Progreso									
Tarea		Atraso		Tarea crítica resumida		Hito externo		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		Sólo fin											

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Duración1
69	Pi-Suministro de Códigos Colores especiales	1 día	vie 17/04/15	vie 17/04/15	1 día
70	Pi- Tabiques Muestra de color	1 día	mié 13/05/15	mié 13/05/15	1 día
71	Pi-Aprobación de Muestra de color	2 días	jue 14/05/15	vie 15/05/15	2 días
72	Pi- Tabiques Primera y segunda mano general	8 días	lun 25/05/15	mié 03/06/15	10 días
73	Pi- Tabiques Primera y segunda mano color especial	4 días	vie 22/05/15	mié 27/05/15	6 días
74	Pi- Tabiques Primera y segunda mano baños	2 días	mar 17/03/15	mié 18/03/15	2 días
75	Pi- Tabiques Mano final hasta lograr terminación adecuada	7 días	mar 26/05/15	mié 03/06/15	9 días
76	Pi-Cielorraso Enduido y sellado	8 días	mié 13/05/15	vie 22/05/15	10 días
77	Pi-Cielorraso Primera y segunda mano general	6 días	mar 19/05/15	mar 26/05/15	8 días
78	Pi-Cielorraso Mano final hasta lograr terminación adecuada	5 días	lun 25/05/15	vie 29/05/15	5 días
79	Pi-Retoques finales	5 días	mié 17/06/15	mar 23/06/15	7 días
80	**Herrería**	**22 días**	**mar 14/04/15**	**jue 14/05/15**	**31 días**
81	He-Suministro e Instalación de Rejas en SS	3 días	mar 14/04/15	jue 16/04/15	3 días
82	He-Suministro e Instalación de Puerta Metalica en SS	2 días	lun 11/05/15	mar 12/05/15	2 días
83	He-Suministro e Instalación de Puertas Cortafuego	4 días	lun 11/05/15	jue 14/05/15	4 días
84	**Albañilería**	**9 días**	**mié 25/03/15**	**lun 13/04/15**	**20 días**
87	AL-Revestimiento de piso Hall	10 días	mié 29/04/15	mié 13/05/15	15 días
88	AL-Revestimiento de piso Oficinas	4 días	jue 23/04/15	mar 28/04/15	6 días
89	AL-Revestimiento paredes y piso baño en Barbacoa	2 días	jue 12/03/15	vie 13/03/15	2 días
90	AL-Revestimeinto paredes y piso vestuario SS	3 días	jue 12/03/15	lun 16/03/15	5 días
91	**Vidrios y espejos**	**59 días**	**jue 19/03/15**	**mié 17/06/15**	**91 días**
92	VE-Replanteo	1 día	mar 07/04/15	mar 07/04/15	1 día
93	VE-Colocación de perfiles de aluminio	3 días	lun 25/05/15	mié 27/05/15	3 días
94	VE-Colocación de Cristales laminados	7 días	jue 04/06/15	vie 12/06/15	9 días
95	VE-Sellado con Silicona	3 días	lun 15/06/15	mié 17/06/15	3 días
96	VE-Colocación de burletes	3 días	lun 15/06/15	mié 17/06/15	3 días
97	VE-Ajuste de puertas de aluminio y colocación de topes	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15	2 días
98	VE-Instalación de aberturas y puerta en Barbacoa	3 días	lun 15/06/15	mié 17/06/15	3 días
99	VE-Espejos	2 días	jue 19/03/15	vie 20/03/15	2 días
100	VE-Mamparas Me11	2 días	jue 04/06/15	vie 05/06/15	2 días
101	**Carpintería**	**59 días**	**mar 17/03/15**	**lun 15/06/15**	**91 días**
102	C-Mamparas de baño	2 días	mar 17/03/15	mié 18/03/15	2 días
103	C-Mamparas de Ducha	2 días	mar 17/03/15	mié 18/03/15	2 días
104	C-Me01	2 días	jue 04/06/15	vie 05/06/15	2 días
105	C-Me02	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15	2 días
106	C-Me03	3 días	mar 09/06/15	jue 11/06/15	3 días
107	C-Me04	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15	1 día
108	C-Me05	3 días	mar 09/06/15	jue 11/06/15	3 días
109	C-Me06	2 días	jue 04/06/15	vie 05/06/15	2 días
110	C-Me07	2 días	jue 04/06/15	vie 05/06/15	2 días
111	C-Me08	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15	2 días
112	C-Me09	3 días	jue 04/06/15	lun 08/06/15	5 días
113	C-Me10	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15	2 días
114	C-Puertas Privados	2 días	vie 12/06/15	lun 15/06/15	4 días
115	**Alfombra y zócalo**	**32 días**	**jue 23/04/15**	**lun 08/06/15**	**47 días**
116	Colocación de Zócalo	3 días	mié 27/05/15	vie 29/05/15	3 días
117	A-Suministro y traslado	2 días	jue 23/04/15	vie 24/04/15	2 días
118	A-Colocación Alfombra, incluye masa niveladora	3 días	jue 04/06/15	lun 08/06/15	5 días
119	**Piso Vinílico**	**34 días**	**jue 23/04/15**	**mié 10/06/15**	**49 días**
120	PV-Suministro	1 día	jue 23/04/15	jue 23/04/15	1 día
121	PV-Colocación piso Vinílico	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15	2 días
122	**Mesadas**	**38 días**	**mar 21/04/15**	**vie 12/06/15**	**53 días**
123	M-Mesada Baño	1 día	mar 21/04/15	mar 21/04/15	1 día
124	M-Mesadas Coffee	1 día	vie 12/06/15	vie 12/06/15	1 día
125	**Aire acondicionado**	**78 días**	**vie 27/02/15**	**mié 24/06/15**	**118 días**
126	AA-Replanteo ubicación equipos	1 día	jue 12/03/15	jue 12/03/15	1 día
127	AA-Instalación de cañería con aislación	10 días	vie 13/03/15	jue 26/03/15	14 días
128	AA-Prueba hidráulica	3 días	vie 27/03/15	mar 07/04/15	12 días
129	AA-Colocación de equipos sobre cielorraso	5 días	vie 27/02/15	jue 05/03/15	7 días
130	AA-Colocación de equipos bajo cielorraso	5 días	jue 04/06/15	mié 10/06/15	7 días
131	AA-Desagüe equipos de aire acondicionado sobre cielorraso	3 días	jue 09/04/15	lun 13/04/15	5 días
132	AA-Prueba hidráulica desagües aire acondicionado	1 día	mar 14/04/15	mar 14/04/15	1 día
133	AA-Instalación de ductos	4 días	vie 06/03/15	mié 11/03/15	6 días
134	AA-Conexión eléctrica	3 días	jue 11/06/15	lun 15/06/15	5 días

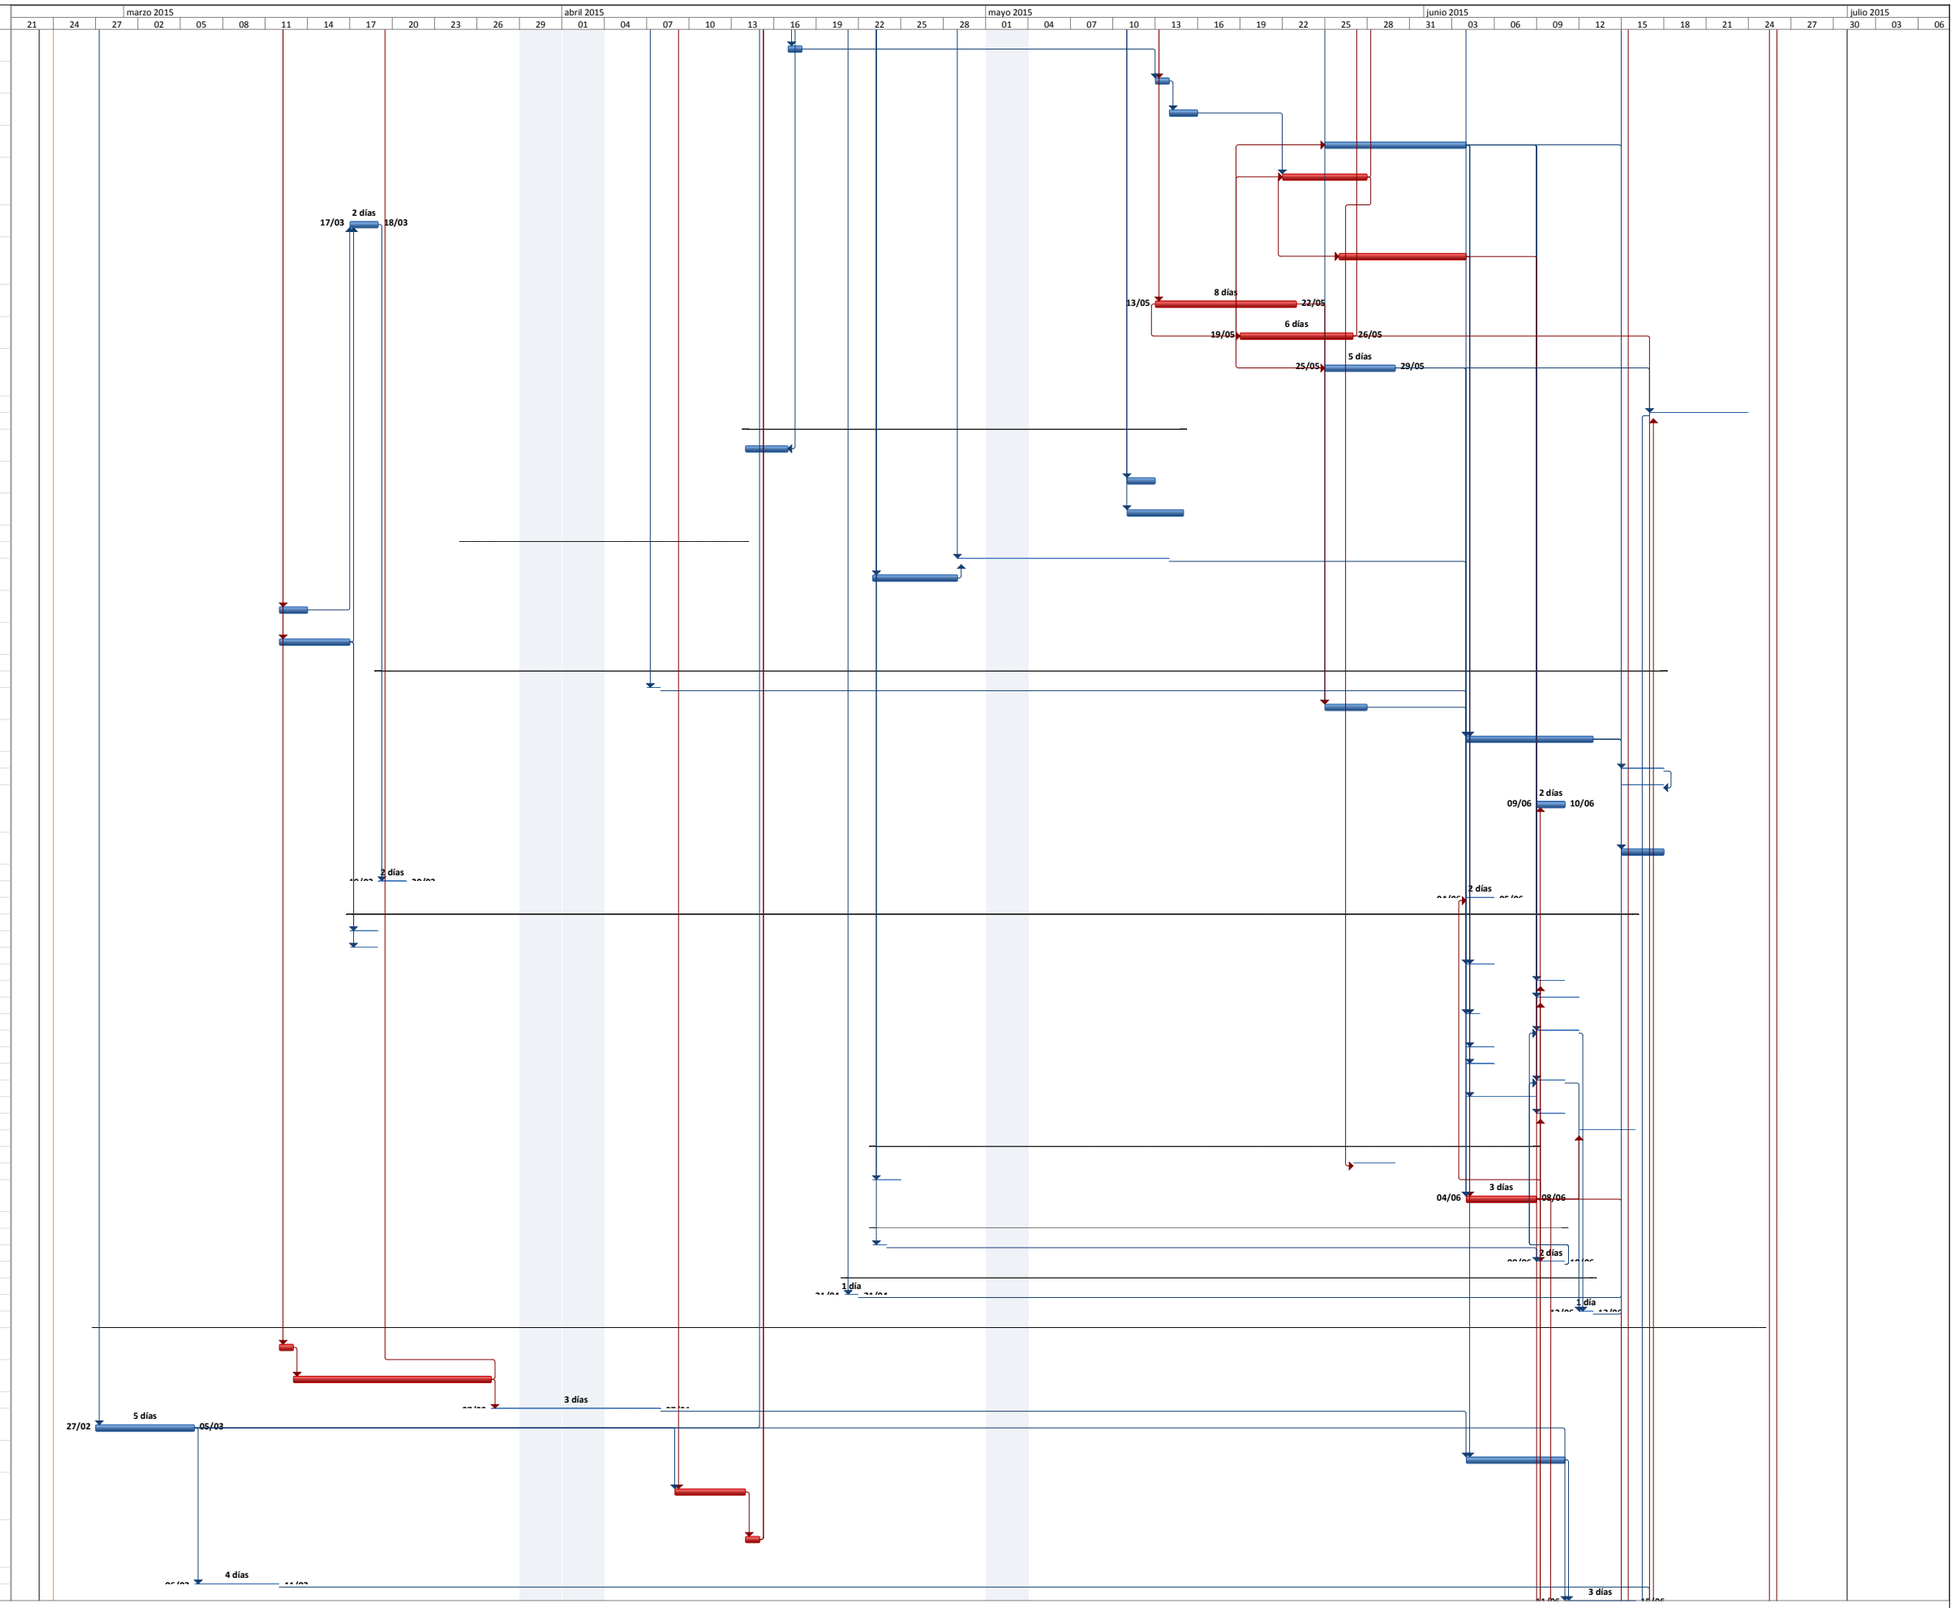

Obra: ADT
Dir: Arocena 1630

Tareas críticas	División	Resumen	División crítica resumida	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Fecha límite
División crítica	Hito	Resumen del proyecto	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Progreso
Tarea	Atraso	Tarea crítica resumida	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	

Id		Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Duración1
135		AA-Colocación de rejas y difusores	3 días	mié 17/06/15	vie 19/06/15	3 días
136		AA-Puesta en marcha	3 días	lun 22/06/15	mié 24/06/15	3 días
137		**Muebles de línea**	**6 días**	**mar 09/06/15**	**mar 16/06/15**	**8 días**
138		ML-Suministro de Muebles de línea y sillas	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15	2 días
139		ML-Armado de Muebles	5 días	mié 10/06/15	mar 16/06/15	7 días
140		**Cortinas rollers**	**3 días**	**mié 24/06/15**	**vie 26/06/15**	**3 días**
141		CR-Instalación de cortinas	3 días	mié 24/06/15	vie 26/06/15	3 días
142		**Gráfica**	**9 días**	**mar 09/06/15**	**vie 19/06/15**	**11 días**
143		G-Vinilos en cristales y puertas	3 días	mié 17/06/15	vie 19/06/15	3 días
144		G-Cartel corpóreo	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15	2 días
145		**Limpieza final de obra**	**12 días**	**lun 15/06/15**	**mar 30/06/15**	**16 días**
146		LO-Limpieza de vidrios	2 días	lun 15/06/15	mar 16/06/15	2 días
147		LO-Limpieza de obra	3 días	vie 26/06/15	mar 30/06/15	5 días

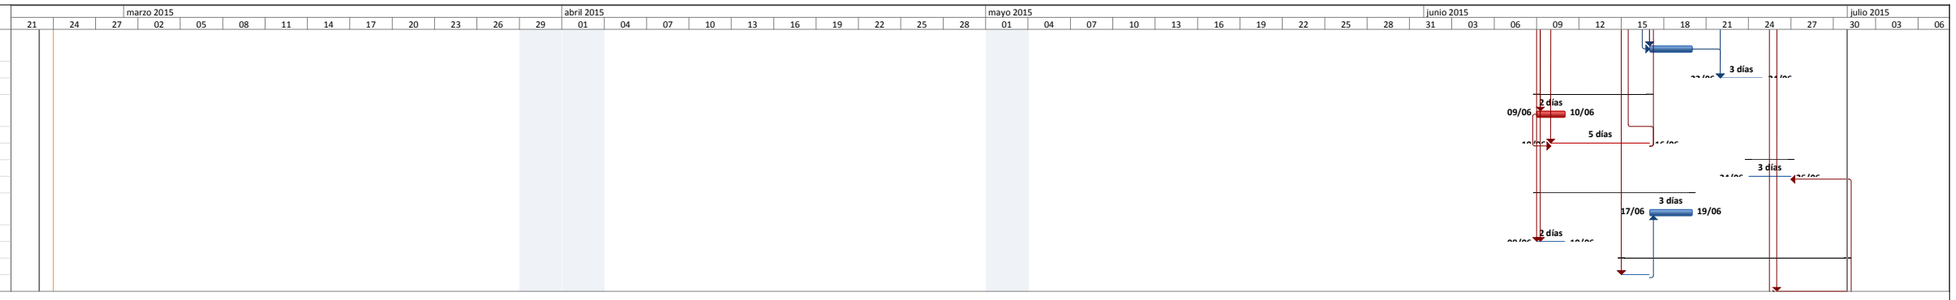

Obra: ADT
Dir: Arocena 1630

Tareas críticas · División · Resumen · División crítica resumida · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División crítica · Hito · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito inactivo · Sólo duración · Sólo el comienzo · Progreso
Tarea · Atraso · Tarea crítica resumida · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · Sólo fin
