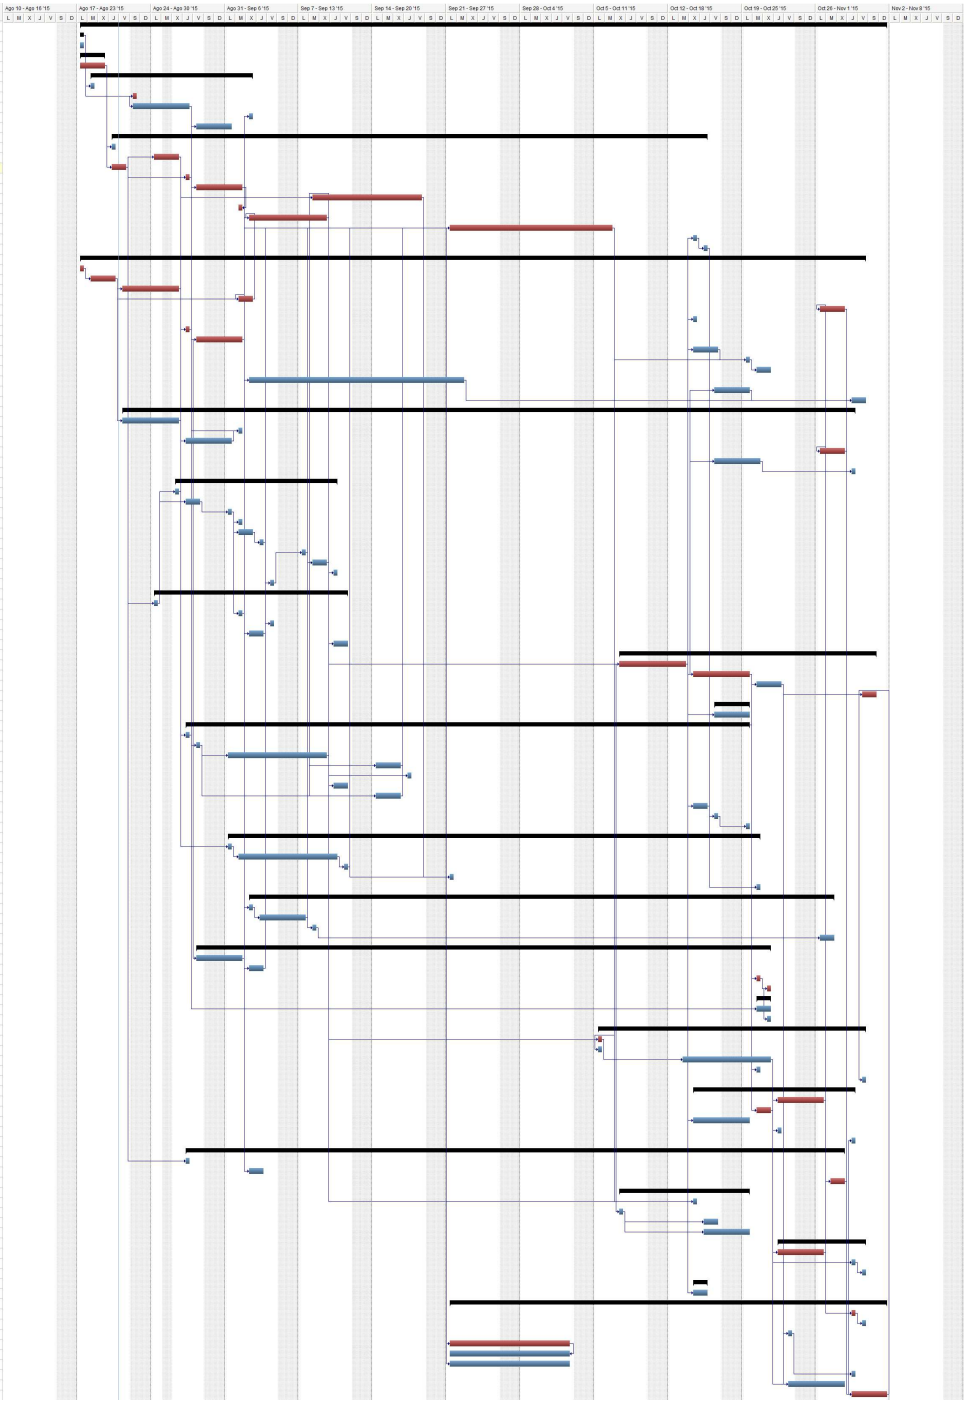		Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos
1		OBRA BAYER	58d	17/08/2015	01/11/2015		
2		**Tareas preliminares**	1d	17/08/2015	17/08/2015		
3		Protecciones: Palmeras, puertas, etc	1d	17/08/2015	17/08/2015		
4		**Tareas de tercero**	3d	17/08/2015	19/08/2015		
5		Reparación del sello contra humo	3d	17/08/2015	19/08/2015		
6		**Piso técnico**	11d	18/08/2015	02/09/2015		
7		Replanteo	1d	18/08/2015	18/08/2015	2	
8		Subida de material	1d	22/08/2015	22/08/2015	2	
9		Colocación de piso técnico	4d	22/08/2015	27/08/2015	8fi	
10		Colocación de piso HPL	1d	02/09/2015	02/09/2015	17	
11		Revestimiento perimetral en madera	2d	28/08/2015	31/08/2015	9	
12		**Yeso**	40d	20/08/2015	15/10/2015		
13		Replanteo tabiques y cajones	1d	20/08/2015	20/08/2015	5	
14		Replanteo hexagonos y cielorraso	2d	24/08/2015	25/08/2015	15	
15		Estructura y placa una cara de tabiques hasta el piso (nuc	2d	20/08/2015	21/08/2015	5	
16		Estructura de nucleo	1d	27/08/2015	27/08/2015	14,15	
17		Estructura y placa de tabiques y revestimientos sobre pis	3d	28/08/2015	31/08/2015	16	
18		Estructura cielorraso y Cajonera	3d	08/09/2015	10/09/2015	14,20FI-2d	
19		Colocación de refuerzos y mensulas	1d	01/09/2015	01/09/2015	17FF	
20		Emplacado de tabiques con terminación	8d	02/09/2015	09/09/2015	19,28FI-1d	
21		Emplacado de cielorraso y cajones con terminación	12d	21/09/2015	06/10/2015	18,32,73FI-2d,74	
22		Estructura de cielorraso desmontable	1d	14/10/2015	14/10/2015	64	
23		Emplacado de cielorraso desmontable	1d	15/10/2015	15/10/2015	22	
24		**Eléctrica**	54d	17/08/2015	30/10/2015		
25		Subida de material y Replantes de Bandejas	1d	17/08/2015	17/08/2015		
26		Tendido de bandejas y canalizaciones por piso	3d	18/08/2015	20/08/2015	25	
27		Tendido de cables por piso	3d	21/08/2015	25/08/2015	26	
28		Subida de canalizaciones a tabiques, armure de cajas y te	2d	01/09/2015	02/09/2015	17FI-1d,26	
29		Armado de puestos de electrica	3d	28/10/2015	29/10/2015	12SFI-1d	
30		Colocación de plaquetas y tomas	1d	14/10/2015	14/10/2015	64	
31		Replanteo de canalizaciones por losa	1d	27/08/2015	27/08/2015	14,27	
32		Tendido de canalizaciones, y cableados por losa	3d	28/08/2015	31/08/2015	31	
33		Replanteo y colocación de luminarias suspendida en hex	3d	14/10/2015	16/10/2015	64	
34		Replanteo de luminarias en cielorrasos y calados	1d	19/10/2015	19/10/2015	21,33	
35		Colocación y conexionado de luminarias en cielorraso	2d	20/10/2015	21/10/2015	34	
36		Armado de tableros	15d	02/09/2015	22/09/2015	17	
37		Suministro, conexionado y puesto en marcha de UPS	2d	16/10/2015	19/10/2015	65fi,2d	
38		Puesta en marcha de la instalación	2d	29/10/2015	30/10/2015	29,36,37	
39		**Datos**	49d	21/08/2015	29/10/2015		
40		Tendido de datos por bandejas	3d	21/08/2015	25/08/2015	26	
41		Replanteo de puestos sobre piso técnico y calado del mis	1d	01/09/2015	01/09/2015	9,42	
42		Acometida de datos a puesto (bajo piso técnico)	3d	27/08/2015	31/08/2015	40	
43		Armado de puestos de datos	3d	28/10/2015	29/10/2015	12SFI-1d	
44		Armado de rack y patheras	3d	16/10/2015	20/10/2015	65fi,2d	
45		Certificado	1d	29/10/2015	29/10/2015	43,44	
46		**Sanitaria**	12d	26/08/2015	10/09/2015		
47		Replanteo de sanitaria	1d	26/08/2015	26/08/2015	58	
48		Tendido de cañería de desagües bloque baños norte, Par	2d	27/08/2015	28/08/2015	47,58	
49		Tendido de cañería de abastecimiento baños norte, Parte	1d	31/08/2015	31/08/2015	49	
50		Pruebas hidráulicas	1d	01/09/2015	01/09/2015	49	
51		Tendido de cañería de desagües bloque baños sur	2d	01/09/2015	02/09/2015	49	
52		Tendido de cañería de abastecimiento baños sur	1d	03/09/2015	03/09/2015	51	
53		Desarme de baño	1d	07/09/2015	07/09/2015	55	
54		Ajustes de instalación de baño a reformar	2d	08/09/2015	09/09/2015	53	
55		Prueba hidráulica	1d	10/09/2015	10/09/2015	54	
56		Colocación de aparatos sanitarios	1d	04/09/2015	04/09/2015	51	
57		**Albañilería**	14d	24/08/2015	11/09/2015		
58		Impermeabilización de baños	1d	24/08/2015	24/08/2015	15	
59		Contrapisa baños Norte	1d	01/09/2015	01/09/2015	49	
60		Contrapisa baños Sur	1d	04/09/2015	04/09/2015	52	
61		Revestimiento de paredes y piso	2d	02/09/2015	03/09/2015	59	
62		Revestimiento de paredes y piso en baño reformado	2d	10/09/2015	11/09/2015	54	
63		**Pintura**	19d	07/10/2015	31/10/2015		
64		Aplicación de enduido y sellado de superficies	5d	07/10/2015	13/10/2015	20,21	
65		Aplicación de dos manos en tabiques y losa	4d	14/10/2015	19/10/2015	64	
66		Aplicación de mano final hasta lograr acabado deseado	3d	20/10/2015	22/10/2015	65	
67		Retoques	2d	30/10/2015	31/10/2015	66,139FI-3d	
68		**Empapelado**	2d	16/10/2015	19/10/2015		
69		Empapelado	2d	16/10/2015	19/10/2015	64FI-2d	
70		**Aire acondicionado**	38d	27/08/2015	19/10/2015		
71		Replanteo de equipos	1d	27/08/2015	27/08/2015	14	
72		Colgada de equipos	1d	28/08/2015	28/08/2015	71	
73		Tendido de cañerias con aislación y conexionado de equi	8d	31/08/2015	09/09/2015	72	
74		Tendido de desagües	3d	14/09/2015	16/09/2015	18fi 46,73	
75		Pruebas hirdáulicas	1d	17/09/2015	17/09/2015	73,74	
76		Conexionado de eléctrica y termostatos	2d	15/09/2015	16/09/2015	73	
77		Tendido de ductos de aire y extrasión	3d	14/09/2015	16/09/2015	18fi 46,72	
78		Colocación de rejas	2d	14/10/2015	15/10/2015	64	
79		Colocación de extractores	1d	18/10/2015	18/10/2015	78	
80		Puesta en marcha	1d	19/10/2015	19/10/2015	79	
81		**Extinción de incendio por agua**	37d	31/08/2015	20/10/2015		
82		Replanteo de instalación	1d	31/08/2015	31/08/2015	14	
83		Modificación de instalación existente y tendido de cañería	8d	01/09/2015	10/09/2015	82	
84		Prueba hidráulica	1d	11/09/2015	11/09/2015	83	
85		Ajustes	1d	21/09/2015	21/09/2015	16,84	
86		Colocación de emoebisadores	1d	20/10/2015	20/10/2015	23,85	
87		**Extinción de incendio por Gas**	40d	02/09/2015	27/10/2015		
88		Replanteo de instalación	1d	02/09/2015	02/09/2015	17	
89		Tendido de cañerías	3d	03/09/2015	07/09/2015	88	
90		Puesta hidráulica	1d	08/09/2015	08/09/2015	89	
91		Conexionado de Garafas	2d	26/10/2015	27/10/2015	90	
92		**Detección de incendio**	39d	28/08/2015	21/10/2015		
93		Tendido de cañerías	3d	28/08/2015	31/08/2015	32fi	
94		Cableado e instalación de detectores sobre cielorrasos y p	2d	02/09/2015	03/09/2015	93	
95		Instalación de módulos y detectores bajo cielorraso	1d	28/10/2015	29/10/2015	65	
96		Puesta en marcha	1d	21/10/2015	21/10/2015	95	
97		**Detección de derrame de Agua**	2d	20/10/2015	21/10/2015		
98		Cableado e instalación de detectores bajo piso técnico	2d	20/10/2015	21/10/2015	9,70	
99		Puesta en marcha	1d	21/10/2015	21/10/2015	98fi	
100		**Cristales**	20d	05/10/2015	30/10/2015		
101		Reparteo de lunos	1d	05/10/2015	05/10/2015	20,21FI-2d	
102		Calcetos para cajas	1d	05/10/2015	05/10/2015	101fi	
103		Instalación de aberturas	7d	13/10/2015	21/10/2015	101FI-5d	
104		Instalación de coverglass y espejos	1d	20/10/2015	20/10/2015	65	
105		Ajustes	1d	30/10/2015	30/10/2015	67fi	
106		**Alfombras y piso de madera**	12d	14/10/2015	29/10/2015		
107		Colocación de piso de madera	3d	22/10/2015	26/10/2015	108	
108		Colocación de Moquetta	2d	28/10/2015	29/10/2015	95	
109		Colocación de zócalos	4d	14/10/2015	19/10/2015	64	
110		Colocación de alfombra sinaqui	1d	22/10/2015	22/10/2015	108	
111		Colocación de cuero de vaca	1d	28/10/2015	28/10/2015	136fi	
112		**Herrería**	45d	27/08/2015	28/10/2015		
113		Suministro e instalación de H para puerta cortafuego	1d	27/08/2015	27/08/2015	15FI 2d	
114		Suministro e instalación de puerta cortafuego	2d	02/09/2015	03/09/2015	17	
115		Suministro e instalación de Reforzado Café Bistro	2d	27/10/2015	28/10/2015	107	
116		**Carpintería**	3d	07/10/2015	15/10/2015		
117		Suministro puerta sala de reuniones	1d	14/10/2015	14/10/2015	20FI 5d,21FI 5d	
118		Redifficado de medidas puertas y muebles	1d	07/10/2015	07/10/2015	64fi	
119		Suministro e instalación de puertas	2d	15/10/2015	16/10/2015	118FI 5d	
120		Suministro e instalación de muebles especiales	3d	15/10/2015	19/10/2015	118FI 5d	
121		**Muebles de línea y sillas**	7d	22/10/2015	30/10/2015		
122		Armado de muebles de línea y mesas sala de reuniones	3d	22/10/2015	26/10/2015	108	
123		Instalación de mampparas y posacadenas	1d	29/10/2015	29/10/2015	28,108	
124		Suministro de sillas, sillones, mesas complemente.	1d	30/10/2015	30/10/2015	123	
125		**Cortinas**	2d	14/10/2015	15/10/2015		
126		Instalación de rieles y cortinas	2d	14/10/2015	15/10/2015	64	
127		**Otros**	32d	21/08/2015	01/11/2015		
128		Suministro y colocación de macetas y plantas	1d	28/10/2015	29/10/2015	115,122	
129		Suministro de futbolito	1d	30/10/2015	30/10/2015	128	
130		Suministro e instalación con soportes de TV	1d	23/10/2015	23/10/2015	95	
131		Control de acesa	10d	21/09/2015	02/10/2015	21fi	
132		CCTV	10d	21/09/2015	02/10/2015	131FF	
133		Alarma de intrusión	10d	21/09/2015	02/10/2015	131fi	
134		Colgada de TV	1d	29/10/2015	29/10/2015	128fi,130	
135		Vinilos y Cartel Corporeo	4d	23/10/2015	28/10/2015	95,103	
136		Limpieza final	4d	28/10/2015	01/11/2015	29,43
