INFORME 3	REPORTE PRIMERA SEMANA DE OBRA	contract workplaces

Fecha Reporte	29/04/2016
PROYECTO	CHR Hansen
UBICACIÓN	Cecilia Grierson 422 - 4° y 5º Pisos P.Madero. CABA
Contacto Cliente:	Mariano Peisci
Superficie	700 m2

CHR HANSEN

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nuevas oficinas de CHR Hansen en Puerto Madero.

2) FOTOS Y DESCRIPCION

Sala de Reuniones

5º piso: Data Center + Laboratorio

4º piso: Privados + Open Space

4º piso: Call Center + Open Space

5º piso: Coffee

Rack de Telefónica: Conectado desde Central

3) TEMAS CRITICOS

Item	Detalle	
1	Temas a ser resueltos por la constructora y/o Administración del edificio: ya fueron desarrollados en varios informes. Es muy importante poder resolverlos para no limitar el alcance de obra.	
2	Tema Medidor definitivo: Sin el mismo va a ser imposible mudarse y tener la totalidad de la oficina en pleno funcionamiento.	
3	Presupuestos de Cableado y Mudanza del Data en Quilmes: a la espera de la confirmación para ejecutar	

4) HITOS Y DEADLINES (Open Space)

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1	Durlock			En curso según plan de trabajo	Contract
2	Instalación Eléctrica			Faltan las canalizaciones	Contract
3	Aire Acondicionado			Ya tenemos instaladas todas las condensadoras	Contract
4	Contrapiso + carpeta			En curso según plan de trabajo	Contract
5	Instalación contra incendio			el martes 3 de mayo está previsto acometer a montante en 5º p.	Contract

5) AVANCE

SEMANA	PREVISTO	REAL
0	0%	0%
1	5%	8%
2	17%	19%
3	32%	24%
4	39%	
5	45%	
6	52%	
7	67%	
8	75%	
9	82%	
10	88%	
11	92%	
12	93%	
13	95%	
14	99,7%	
15	100%	

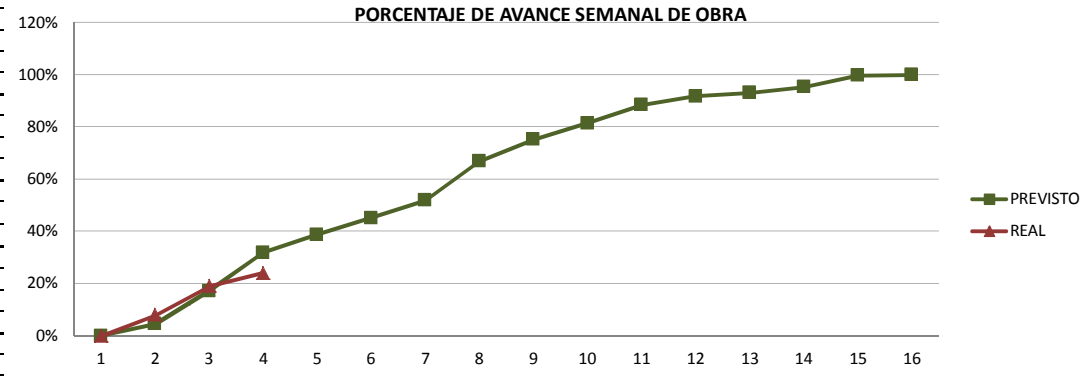

FIN DEL DOCUMENTO
