NUEVAS OFICINAS BGH

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% comple
1	**OBRA OFICINAS BGH Arias**	**104,13 días**	**sáb 14/11/15**	**vie 25/03/16**	**94%**
26	**PINTURA**	**61,1 días**	**lun 11/01/16**	**mié 23/03/16**	**93%**
30	Terminaciones de pintura	4 días	mié 16/03/16	mié 23/03/16	60%
46	**REVESTIMIENTOS**	**2 días**	**lun 21/03/16**	**mar 22/03/16**	**0%**
47	Instalación de empapelado ASCENSORES	2 días	lun 21/03/16	mar 22/03/16	0%
63	**INSTALACION ELECTRICA**	**102,18 días**	**sáb 14/11/15**	**jue 24/03/16**	**88%**
72	Colocación cajas ackerman	3 días	mar 23/02/16	lun 21/03/16	70%
73	Colocación de Faceplate	3 días	jue 17/03/16	jue 24/03/16	50%
75	Cableado de puestos	9 días	jue 10/03/16	mar 22/03/16	60%
76	Colocación de artefactos de iluminación	8 días	jue 10/03/16	mié 23/03/16	50%
80	**GRAFICA**	**40,25 días**	**jue 04/02/16**	**mié 23/03/16**	**0%**
82	Colocación de logo	1 día	mié 23/03/16	mié 23/03/16	0%
85	**VARIOS**	**6,05 días**	**jue 17/03/16**	**jue 24/03/16**	**80%**
86	Detalles finales: equipamiento, sillones, etc	3 días	jue 17/03/16	jue 24/03/16	80%
87	**TAREAS A CARGO CLIENTE**	**90 días**	**mié 02/12/15**	**vie 25/03/16**	**97%**
88	Mudanza	1 día	vie 25/03/16	vie 25/03/16	0%
89	**INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO**	**86,5 días**	**mié 02/12/15**	**mar 22/03/16**	**99%**
98	Puesta en marcha	5 días	lun 08/02/16	mar 22/03/16	90%
100	**MOBILIARIO**	**14,55 días**	**sáb 05/03/16**	**mar 22/03/16**	**95%**
101	Provisión y Armado de puestos de trabajo	11 días	sáb 05/03/16	mar 22/03/16	95%
102	Final de Obra	0 días	vie 25/03/16	vie 25/03/16	0%

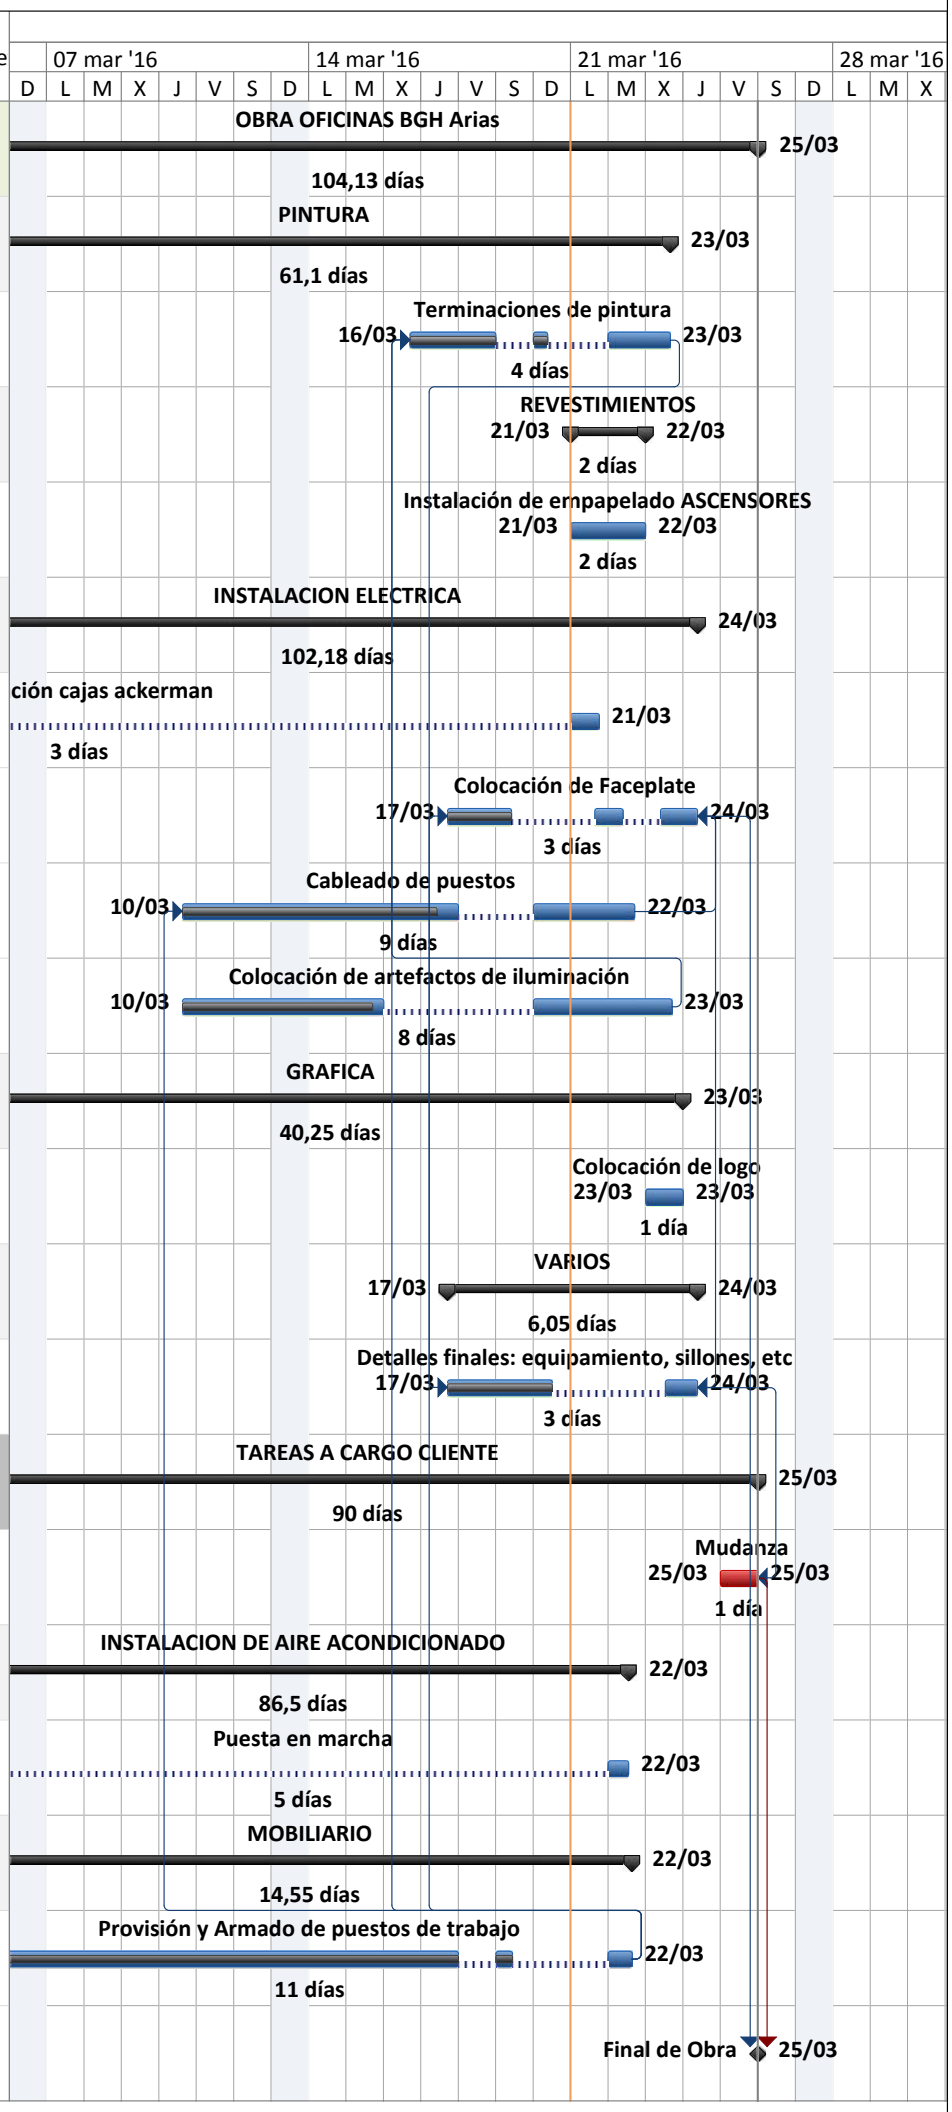

Proyecto: BGH TECNOLOGÍA
Fecha: lun 21/03/16

Tarea		Hito inactivo		Fecha límite	
División		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Hito		Tarea manual		División crítica	
Resumen		Sólo duración		Línea base	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Hito de línea base	
Tareas externas		Resumen manual		Resumen de línea base	
Hito externo		Sólo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		Sólo fin			
