PHILIPS

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% comple
1		**OBRA: Adecuación Oficinas Philips**	**45 días**	**vie 28/7**	**vie 29/9**	**27%**
2	✓	Adjudicación de obra	0 días	vie 28/7	vie 28/7	100%
3		Firma de contrato, orden de compra y doc Seg&Hig	5 días	jue 3/8	lun 4/9	95%
4		**Obra**	**41 días**	**jue 3/8**	**vie 29/9**	**25%**
5	✓	Inicio de Obra	0 días	mié 9/8	mié 9/8	100%
6	✓	**OBRA CIVIL**	**12 días**	**jue 10/8**	**lun 28/8**	**100%**
7	✓	Desmontes y demoliciones	12 días	jue 10/8	lun 28/8	100%
8	✓	Instalación Sanitaria	3 días	lun 21/8	mié 23/8	100%
9		**TABIQUES Y CIELORRASOS**	**35 días**	**jue 3/8**	**jue 21/9**	**53%**
10		Compra de Tabiques, Cielorrasos y Aislaciones	0 días	jue 3/8	jue 3/8	40%
11	✓	Tabique de placa de roca de yeso 1º Placa	7 días	mar 15/8	jue 24/8	100%
12		Tabique de placa de roca de yeso 2º Placa	8 días	jue 24/8	lun 4/9	75%
13		Estructura cielorraso junta tomada	3 días	jue 24/8	lun 4/9	40%
14		Emplacado de cielorraso junta tomada	5 días	lun 4/9	lun 11/9	0%
15		Recolocacion de cielorraso modular	4 días	lun 18/9	jue 21/9	0%
16		**CRISTALES Y CARPINTERIAS**	**24 días**	**jue 24/8**	**mar 26/9**	**0%**
17		Compra de aluminio y cristales	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
18	✓	Medicion de frentes	0 días	jue 24/8	jue 24/8	100%
19		Frentes Vidriados	7 días	lun 18/9	mar 26/9	0%
20		**PINTURA**	**13,75 días**	**lun 4/9**	**jue 21/9**	**0%**
21		Compra de pintura	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
22		Preparacion y pintura de tabiques	13 días	mar 5/9	jue 21/9	0%
23		Preparacion y pintura de cielorrasos	7 días	vie 8/9	mar 19/9	0%
24		**PISOS**	**18,75 días**	**lun 4/9**	**jue 28/9**	**0%**
25		Compra de pisos y alfombras	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
26		Colocacion de piso vinilico	4 días	vie 22/9	mié 27/9	0%
27		Colocacion de alfombra	4 días	vie 15/9	jue 21/9	0%
28		Colocacion de zocalos	3 días	mar 26/9	jue 28/9	0%
29		**MOBILIARIO Y BRANDING**	**27 días**	**jue 24/8**	**vie 29/9**	**0%**
30		Compra de mobiliarios	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
31		Compra de grafica y carteleria	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
32	✓	Medicion de muebles	0 días	jue 24/8	jue 24/8	100%
33		Muebles Especiales	5 días	jue 21/9	mié 27/9	0%
34		Aviso de envio de equipamiento de linea PHILIPS	0 días	lun 11/9	lun 11/9	0%
35		Equipamiento de linea	5 días	mar 19/9	mar 26/9	0%
36		Cortinas	3 días	mié 20/9	vie 22/9	0%
37		Envio de diseños PHILIPS	0 días	mar 5/9	mar 5/9	0%
38		Graficas y cartelerias	3 días	mié 27/9	vie 29/9	0%
39		**Instalacion Electrica**	**40,8 días**	**jue 3/8**	**vie 29/9**	**32%**
40	✓	Compra de canalizaciones	0 días	jue 3/8	jue 3/8	100%
41		Compra de cableados	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
42	✓	Verificacion de cableados y canalizaciones	5 días	mié 9/8	mar 15/8	100%
43		BPC y canalizaciones bajo piso	10 días	mié 16/8	lun 4/9	60%
44		Canalizaciones en tabiques	10 días	mar 22/8	lun 4/9	90%
45		Canalizaciones en cielorrasos	9 días	mar 29/8	vie 8/9	33%
46		Cableados bajo piso	5 días	jue 7/9	mié 13/9	0%
47		Cableados cielorrasos	5 días	lun 11/9	vie 15/9	0%
48		Cableado en tabiques y armado de face plates	7 días	jue 14/9	vie 22/9	0%
49		Envio de artefactos de iluminacion PHILIPS	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
50		Colocacion de artefactos de iluminacion	7 días	mar 19/9	mié 27/9	0%
51		Cableado de datos	8 días	lun 18/9	mié 27/9	0%
52		Cableado de puestos	5 días	jue 21/9	jue 28/9	0%
53		Pruebas y puesta en marcha	1 día	jue 28/9	vie 29/9	0%
54		**TERMOMECANICA**	**20 días**	**vie 1/9**	**jue 28/9**	**0%**
55		Compra de equipos de AA	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
56		Compra de conductos	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
57		Readeacuacion de conductos	5 días	vie 1/9	jue 7/9	0%
58		Instalacion de conductos nuevos	12 días	mié 6/9	jue 21/9	0%
59		Instalacion de equipo 3TR	5 días	mié 20/9	mar 26/9	0%
60		Pruebas y puesta en marcha	2 días	mié 27/9	jue 28/9	0%
61		**INCENDIO**	**14,75 días**	**lun 4/9**	**vie 22/9**	**0%**
62		Compra de instalacion exticion y deteccion de incendio	0 días	lun 4/9	lun 4/9	0%
63		Reubicacion y cableado de detectores	5 días	lun 11/9	vie 15/9	0%
64		Colocacion de detectores	5 días	lun 18/9	vie 22/9	0%
65		Puesta en valor red Sprinklers	5 días	lun 18/9	vie 22/9	0%
66		Final de Obra	0 días	vie 29/9	vie 29/9	0%

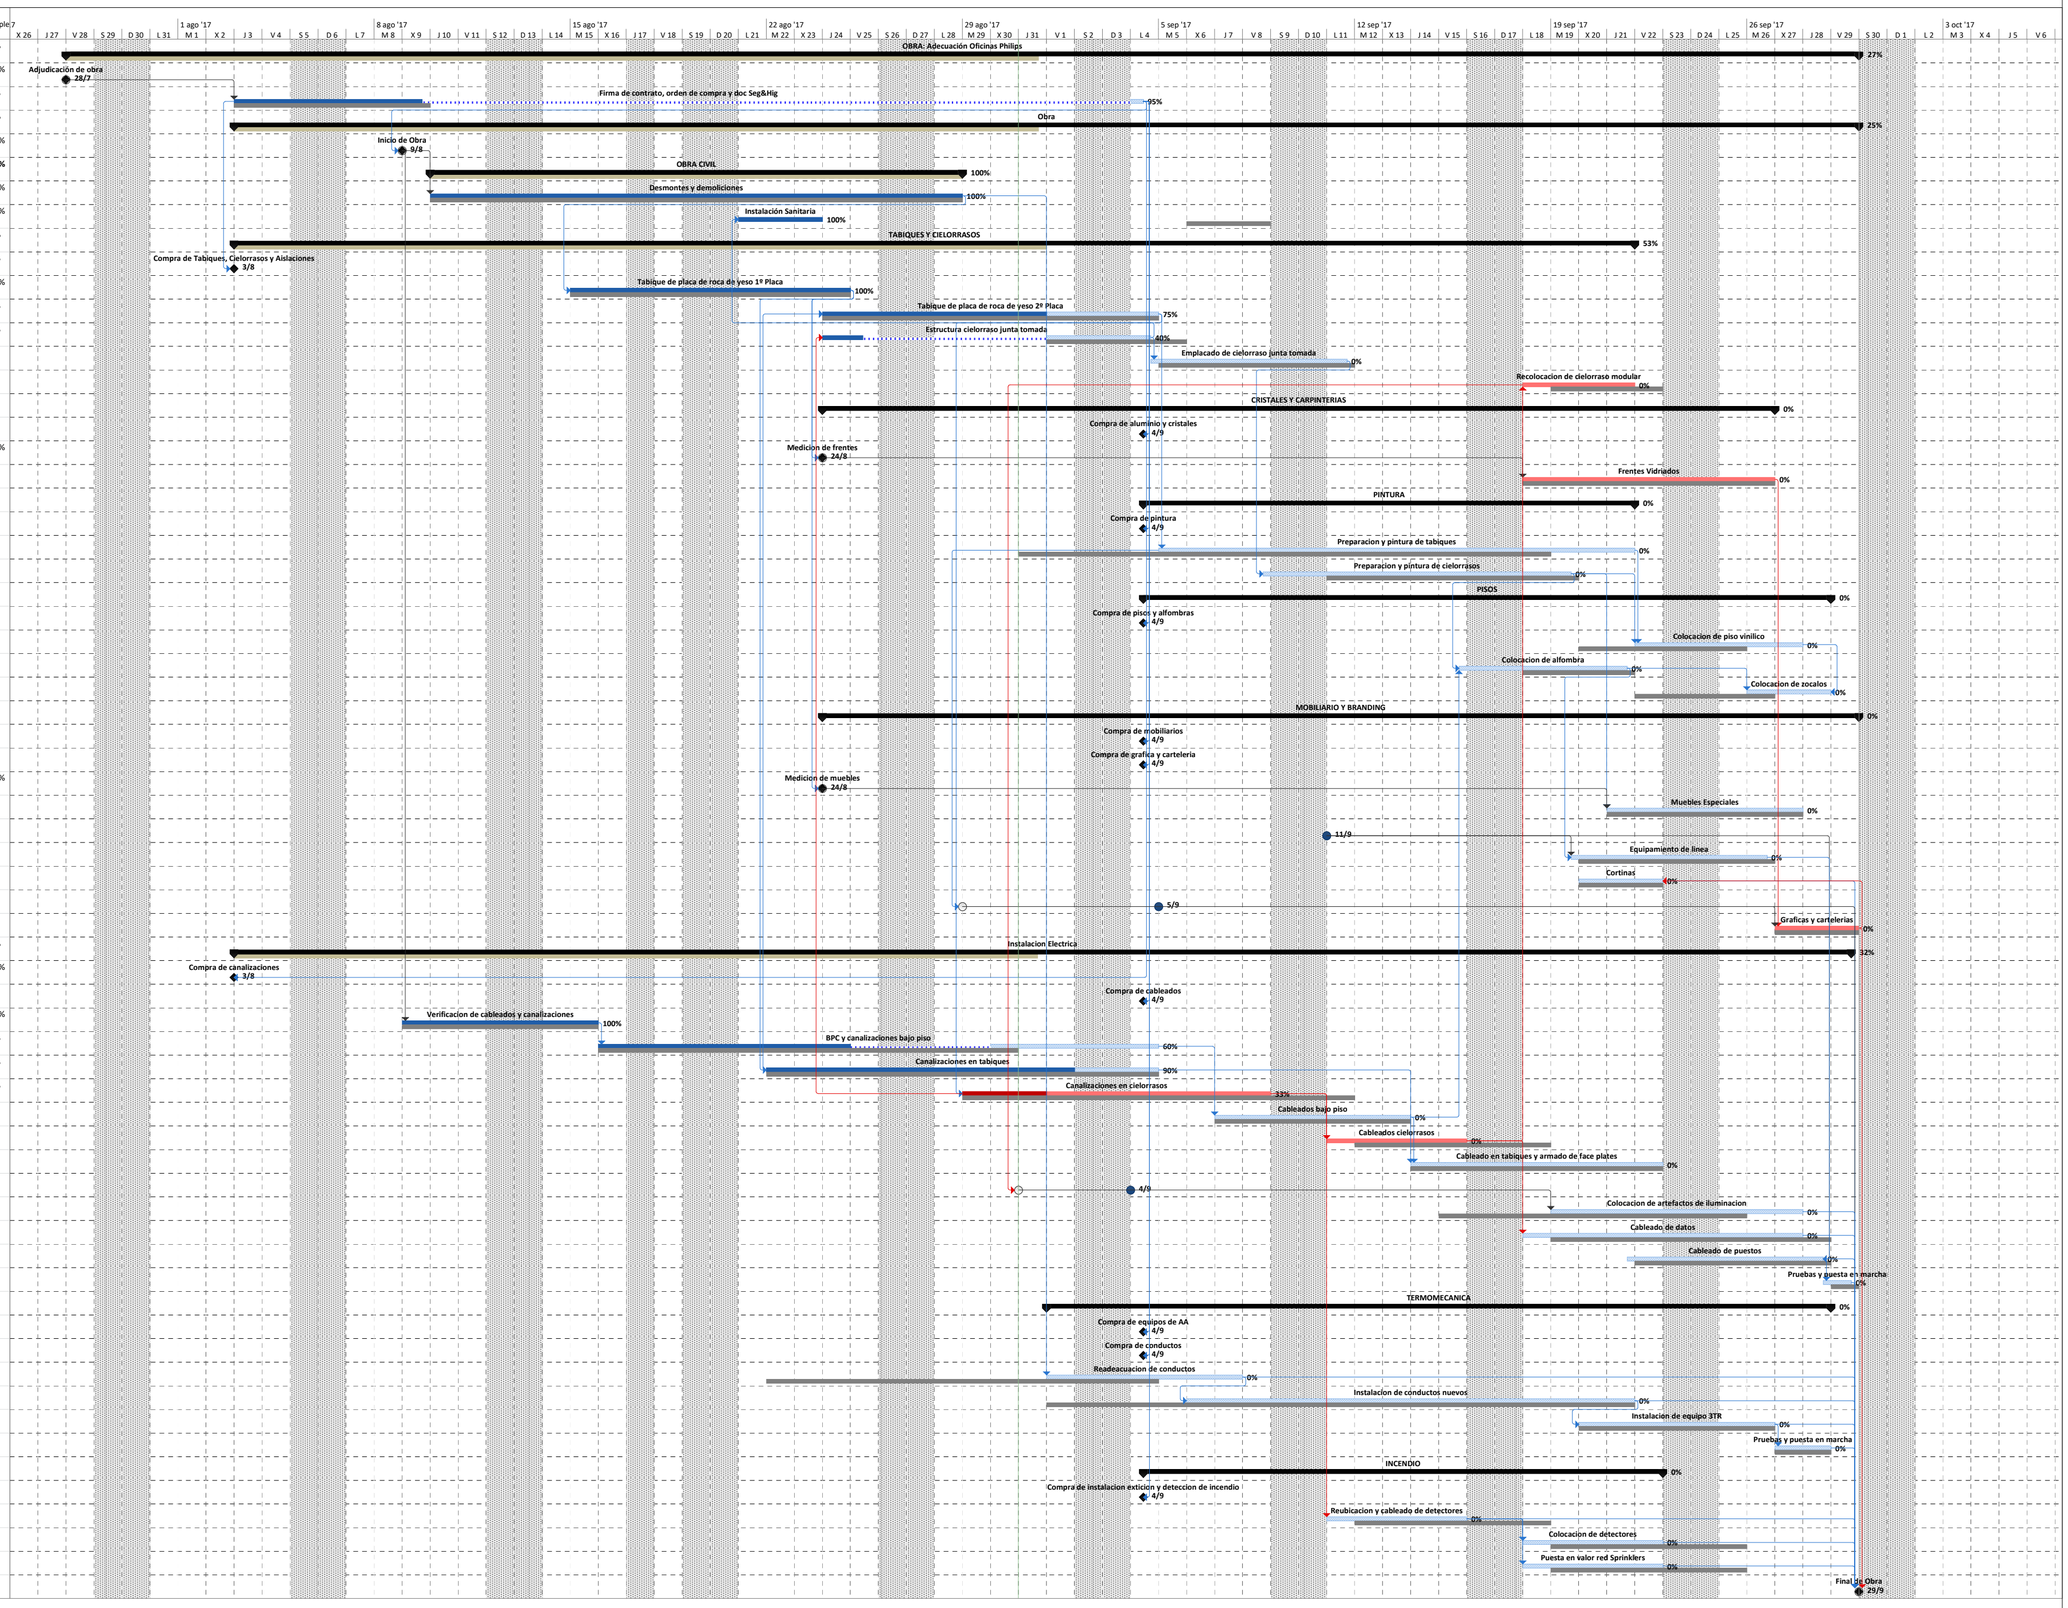

Hito de línea base · Tareas críticas · Progreso de tarea crítica · División · Tarea manual · Sólo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen manual · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Línea base
Resumen de línea base · División crítica · Tarea · Progreso de tarea · Sólo el comienzo · Sólo duración · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Fecha límite
