**PRISMA CALL CENTER_cronograma obra_v01 obra.mpp**
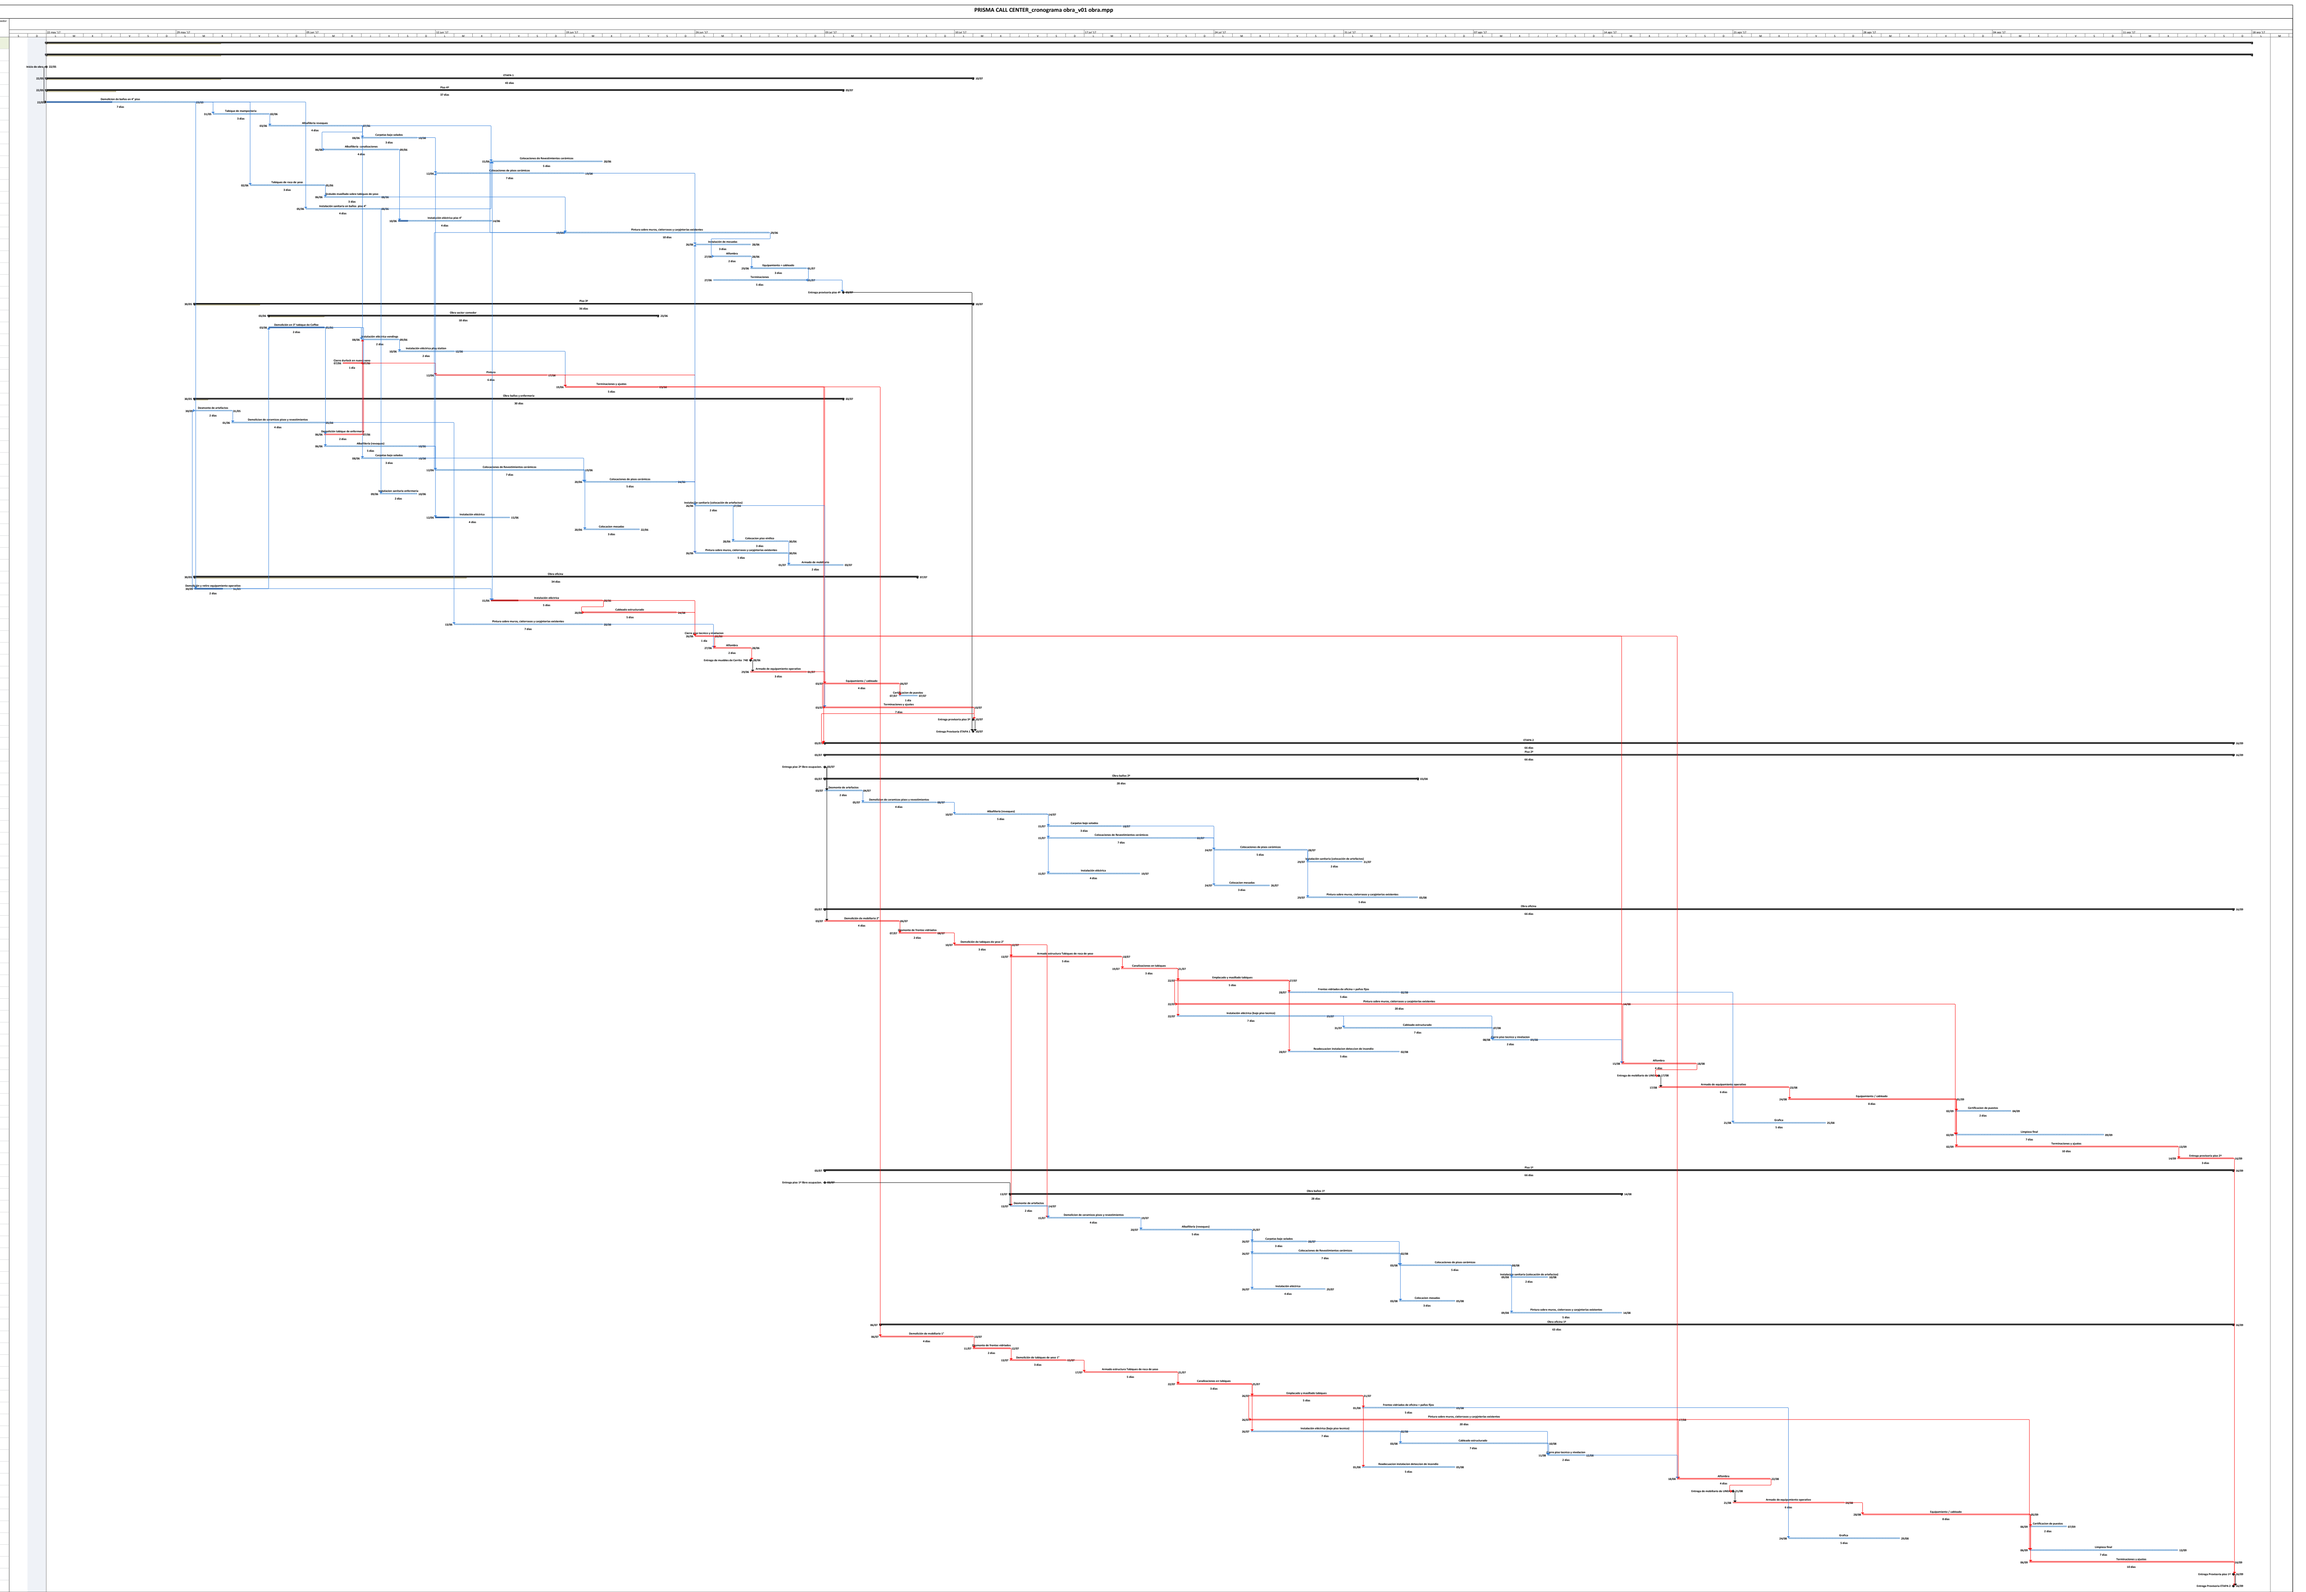
| ID | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Porcentaje completado | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **OBRA PRISMA CALL CENTER** | **222 días** | **lun 22/04/17** | **lun 18/06/17** | **2%** | |
| 2 | **OBRA** | **222 días** | **lun 22/04/17** | **lun 18/06/17** | **2%** | |
| 3 | **Inicio de obra** | **0 días** | **lun 22/04/17** | **lun 22/04/17** | **0%** | |
| 4 | **ETAPA 1** | **41 días** | **lun 22/04/17** | **lun 16/07/17** | **0%** | |
| 5 | **Piso 4º** | **37 días** | **lun 22/04/17** | **lun 06/07/17** | **0%** | |
| 6 | Demolición de tabiques en 4º piso | 7 días | lun 22/05/17 | lun 29/05/17 | 36,C | 12% |
| 7 | Tabique de mampostería | 3 días | mié 31/05/17 | vie 02/06/17 | 34*2+1 d.de | 2% |
| 8 | Albañilería revoques | 4 días | sáb 03/06/17 | mié 07/06/17 | 7 | 2% |
| 9 | Carpintería bajo solados | 3 días | jue 08/06/17 | sáb 10/06/17 | 8 | 2% |
| 10 | Albañilería condicionamiento | 4 días | mié 06/06/17 | vie 09/06/17 | 8*2+1 d.ma | 2% |
| 11 | Colocaciones de Revestimientos cerámicos | 5 días | jue 15/06/17 | mié 20/06/17 | 15,16,18 | 2% |
| 12 | Colocaciones de pisos cerámicos | 7 días | lun 12/06/17 | lun 19/06/17 | 9,,16 | 2% |
| 13 | Tabique de roca de yeso | 3 días | vie 02/06/17 | lun 05/06/17 | 34*2+1 d.ma | 2% |
| 14 | Entubado modificado sobre tabiques de yeso | 3 días | mié 06/06/17 | jue 08/06/17 | 13 | 2% |
| 15 | Instalación sanitaria en baños piso 4º | 4 días | lun 19/06/17 | jue 08/06/17 | 34*2+1 d.ma | 2% |
| 16 | Instalación eléctrica piso 4º | 3 días | sáb 10/06/17 | mié 14/06/17 | 10 | 10% |
| 17 | Pintura sobre muros, cielorrasos y carpinterías existentes | 10 días | lun 19/06/17 | jue 29/06/17 | 16,14,12+2 d.ma | 2%,CFC+2 d.ma |
| 18 | Instalación de revestidos | 3 días | lun 26/06/17 | mié 28/06/17 | 17,18 | 2% |
| 19 | Alfombra | 2 días | mar 27/06/17 | mié 28/06/17 | 17*2 | 2 días 2% |
| 20 | Equipamiento + cableado | 3 días | jue 29/06/17 | sáb 01/07/17 | 19 | 2% |
| 21 | Terminaciones | 5 días | mar 27/06/17 | sáb 01/07/17 | 20*3 | 2% |
| 22 | **Entrega provisoria piso 4º** | **0 días** | **lun 03/07/17** | **lun 03/07/17** | **2*CFC+1 d.ma** | **2%** |
| 23 | **Piso 3º** | **36 días** | **mié 30/06/17** | **lun 14/07/17** | **2%** | |
| 24 | **Obra autor comedor** | **10 días** | **sáb 01/04/17** | **vie 21/04/17** | **11%** | |
| 25 | Demolición en 2º tabique de Coffee | 2 días | sáb 15/04/17 | lun 17/04/17 | 47*2+2 d.ma | 100% |
| 26 | Instalación eléctrica sanitaria | 2 días | jue 06/06/17 | vie 09/06/17 | 26,,34 | 2% |
| 27 | Instalación eléctrica play station | 2 días | sáb 10/06/17 | lun 12/06/17 | 26 | 2% |
| 28 | Cierre ductual en nuevo vano | 1 día | mié 07/06/17 | mié 07/06/17 | 25*F,34*F | 2% |
| 29 | Pintura | 5 días | lun 12/06/17 | sáb 17/06/17 | 28*F+1 d.ma | 2% |
| 30 | Terminaciones y ajustes | 5 días | lun 19/06/17 | vie 23/06/17 | 29,27 | 2% |
| 31 | **Obra baños y enfermería** | **30 días** | **mar 09/06/17** | **lun 03/07/17** | **2%** | |
| 32 | Desmonte de artefactos | 2 días | mar 30/05/17 | mié 31/05/17 | 4*F2 | 2% |
| 33 | Demolición de cerámicos pisos y revestimientos | 4 días | jue 01/06/17 | lun 05/06/17 | 32 | 2% |
| 34 | Demolición tabique de enfermería | 2 días | mar 06/06/17 | mié 07/06/17 | 35 | 2% |
| 35 | Albañilería (revoques) | 5 días | mar 08/06/17 | sáb 10/06/17 | 34 | 2% |
| 36 | Carpintía bajo solados | 3 días | jue 15/06/17 | sáb 17/06/17 | 8 | 2% |
| 37 | Colocaciones de Revestimientos cerámicos | 7 días | lun 12/06/17 | lun 19/06/17 | 36 | 2% |
| 38 | Colocaciones de pisos cerámicos | 5 días | mar 20/06/17 | sáb 24/06/17 | 36,37 | 2% |
| 39 | Instalación sanitaria enfermería | 2 días | vie 09/06/17 | sáb 10/06/17 | 11 | 2% |
| 40 | Instalación sanitaria (colocación de artefactos) | 2 días | lun 19/06/17 | mar 27/06/17 | 38 | 2% |
| 41 | Instalación eléctrica | 4 días | lun 12/06/17 | jue 15/06/17 | 36 | 20% |
| 42 | Colocación mesadas | 3 días | mar 20/06/17 | jue 22/06/17 | 37 | 2% |
| 43 | Colocación piso vinílico | 3 días | mié 28/06/17 | vie 30/06/17 | 40 | 2% |
| 44 | Pintura sobre muros, cielorrasos y carpinterías existentes | 5 días | lun 26/06/17 | vie 30/06/17 | 28,39 | 2% |
| 45 | Armado de mobiliario | 2 días | sáb 01/07/17 | lun 03/07/17 | 44,43 | 2% |
| 46 | **Obra eléctrica** | **24 días** | **mar 09/06/17** | **vie 07/07/17** | **0%** | |
| 47 | Demolición y retiro equipamiento operativo | 2 días | mar 30/05/17 | mié 31/05/17 | 6 | 70% |
| 48 | Instalación eléctrica | 3 días | jue 15/06/17 | mar 20/06/17 | 47,26 | 25% |
| 49 | Cableado estructurado | 5 días | mar 20/06/17 | sáb 24/06/17 | 48*2 días | 2% |
| 50 | Pintura sobre muros, cielorrasos y carpinterías existentes | 7 días | mar 13/06/17 | mar 20/06/17 | 19*C+3 días | 2% |
| 51 | Cierre ptua tecnica y mediacion | 1 día | lun 26/06/17 | lun 26/06/17 | 49,48 | 2% |
| 52 | Alfombra | 2 días | mar 27/06/17 | mié 28/06/17 | 50,51 | 2% |
| 53 | **Entrega de muebles de Centro 748** | **2 días** | **mié 28/06/17** | **mié 28/06/17** | **2%** | |
| 54 | Armado de equipamiento operativo | 3 días | jue 29/06/17 | sáb 01/07/17 | 53 | 2% |
| 55 | Equipamiento + cableado | 4 días | lun 03/07/17 | jue 06/07/17 | 54 | 2% |
| 56 | Certificación de puestos | 1 día | vie 07/07/17 | vie 07/07/17 | 55 | 2% |
| 57 | Terminaciones y ajustes | 7 días | lun 03/07/17 | lun 10/07/17 | 55,C,46,,50 | 2% |
| 58 | **Entrega provisoria piso 3º** | **0 días** | **lun 10/07/17** | **lun 10/07/17** | **2%** | |
| 59 | **Entrega Provisoria ETAPA 1** | 3 días | lun 10/07/17 | lun 10/07/17 | 22,58 | 2% |
| 60 | **ETAPA 2** | **90 días** | **lun 03/07/17** | **sáb 18/08/17** | **2*CFC+1 d.ma** | **2%** |
| 61 | **Piso 3º** | **90 días** | **lun 03/07/17** | **sáb 18/08/17** | **2%** | |
| 62 | Entrega piso 3º libre ocupación | 0 días | lun 06/07/17 | lun 06/07/17 | 2% | |
| 63 | **Obra baños 3º** | **20 días** | **lun 06/07/17** | **lun 31/07/17** | **2%** | |
| 64 | Desmonte de artefactos | 2 días | lun 06/07/17 | mar 04/07/17 | 62 | 2% |
| 65 | Demolición de cerámicos pisos y revestimientos | 4 días | mié 05/07/17 | vie 08/07/17 | 64 | 2% |
| 66 | Albañilería (revoques) | 5 días | lun 10/07/17 | vie 14/07/17 | 65 | 2% |
| 67 | Carpintía bajo solados | 3 días | sáb 15/07/17 | mar 18/07/17 | 66 | 2% |
| 68 | Colocaciones de Revestimientos cerámicos | 5 días | jue 20/07/17 | mié 26/07/17 | 67 | 2% |
| 69 | Colocaciones de pisos cerámicos | 5 días | lun 24/07/17 | sáb 29/07/17 | 68,67 | 2% |
| 70 | Instalación sanitaria (colocación de artefactos) | 2 días | sáb 29/07/17 | lun 31/07/17 | 69 | 2% |
| 71 | Instalación eléctrica | 4 días | sáb 15/07/17 | mié 19/07/17 | 66 | 2% |
| 72 | Colocación mesadas | 3 días | lun 24/07/17 | mié 26/07/17 | 68 | 2% |
| 73 | Pintura sobre muros, cielorrasos y carpinterías existentes | 3 días | sáb 29/07/17 | jue 31/08/17 | 69 | 2% |
| 74 | **Obra eléctrica** | **44 días** | **lun 06/07/17** | **sáb 26/08/17** | **2%** | |
| 75 | Demolición de mobiliario 2º | 3 días | lun 06/07/17 | jue 06/07/17 | 62 | 2% |
| 76 | Desmonte de frentes estirados | 2 días | vie 07/07/17 | sáb 08/07/17 | 75 | 2% |
| 77 | Demolición de tabiques de yeso 2º | 3 días | lun 10/07/17 | mié 12/07/17 | 76 | 2% |
| 78 | Armado estructura Tabiques de roca de yeso | 3 días | jue 13/07/17 | mar 18/07/17 | 77 | 2% |
| 79 | Canalizaciones en tabiques | 3 días | mié 19/07/17 | vie 21/07/17 | 78 | 2% |
| 80 | Emplacado y resaltado tabiques | 3 días | sáb 22/07/17 | jue 27/07/17 | 79 | 2% |
| 81 | Frentes estirados de oficina + pañol + baños | 5 días | vie 28/07/17 | mié 02/08/17 | 80 | 2% |
| 82 | Pintura sobre muros, cielorrasos y carpinterías existentes | 20 días | sáb 22/07/17 | lun 14/08/17 | 80,81 | 2% |
| 83 | Instalación eléctrica (bajo piso tecnico) | 7 días | sáb 22/07/17 | sáb 29/07/17 | 79 | 2% |
| 84 | Cableado estructurado | 7 días | lun 31/07/17 | lun 07/08/17 | 83 | 2% |
| 85 | Cierre ptua tecnica y mediacion | 2 días | mar 08/08/17 | mié 09/08/17 | 84,84 | 2% |
| 86 | Reubicacion instalacion detectores de humedad | 3 días | vie 28/07/17 | mié 02/08/17 | 80 | 2% |
| 87 | Alfombra | 4 días | mar 15/08/17 | vie 18/08/17 | 82,85,16 | 2% |
| 88 | **Entrega de mobiliario de OBRA** | **3 días** | **jue 17/08/17** | **jue 17/08/17** | **2%** | **2 días 2%** |
| 89 | Armado de equipamiento operativo | 3 días | jue 17/08/17 | mié 23/08/17 | 88 | 2% |
| 90 | Equipamiento + cableado | 8 días | jue 24/08/17 | vie 01/09/17 | 89 | 2% |
| 91 | Certificación de puestos | 2 días | sáb 02/09/17 | lun 04/09/17 | 90 | 2% |
| 92 | Gráfica | 5 días | lun 21/08/17 | vie 25/08/17 | 86*C+15 días | 2% |
| 93 | Limpieza final | 7 días | sáb 02/09/17 | sáb 09/09/17 | 90,92 | 2% |
| 94 | Terminaciones y ajustes | 10 días | sáb 02/09/17 | mié 13/09/17 | 90 | 2% |
| 95 | **Entrega provisoria piso 2º** | **0 días** | **jue 14/09/17** | **sáb 16/09/17** | **2%** | |
| 96 | **Piso 2º** | **90 días** | **lun 06/07/17** | **sáb 16/09/17** | **2%** | |
| 97 | Entrega piso 2º libre ocupación | 0 días | lun 06/07/17 | lun 06/07/17 | 2% | |
| 98 | **Obra baños 2º** | **20 días** | **jue 13/07/17** | **lun 14/08/17** | **2%** | |
| 99 | Desmonte de artefactos | 2 días | jue 13/07/17 | vie 14/07/17 | 97,77 | 2% |
| 100 | Demolición de cerámicos pisos y revestimientos | 4 días | sáb 15/07/17 | mié 19/07/17 | 99,77 | 2% |
| 101 | Albañilería (revoques) | 5 días | jue 20/07/17 | mar 25/07/17 | 100 | 2% |
| 102 | Carpintía bajo solados | 3 días | mié 26/07/17 | sáb 29/07/17 | 101 | 2% |
| 103 | Colocaciones de Revestimientos cerámicos | 7 días | mié 26/07/17 | mié 02/08/17 | 101 | 2% |
| 104 | Colocaciones de pisos cerámicos | 5 días | jue 03/08/17 | mié 09/08/17 | 102,103 | 2% |
| 105 | Instalación sanitaria (colocación de artefactos) | 2 días | mié 09/08/17 | jue 10/08/17 | 104 | 2% |
| 106 | Instalación eléctrica | 4 días | mié 26/07/17 | sáb 29/07/17 | 101 | 2% |
| 107 | Colocación mesadas | 3 días | jue 03/08/17 | sáb 05/08/17 | 103 | 2% |
| 108 | Pintura sobre muros, cielorrasos y carpinterías existentes | 3 días | mié 09/08/17 | lun 14/08/17 | 104 | 2% |
| 109 | **Obra eléctrica 2º** | **15 días** | **jue 06/07/17** | **sáb 21/07/17** | **2%** | |
| 110 | Demolición de mobiliario 2º | 3 días | jue 06/07/17 | lun 10/07/17 | 62FC+10 días | 2% |
| 111 | Desmonte de frentes estirados | 2 días | mar 11/07/17 | mié 12/07/17 | 110 | 2% |
| 112 | Demolición de tabiques de yeso 2º | 3 días | jue 13/07/17 | sáb 15/07/17 | 111 | 2% |
| 113 | Armado estructura Tabiques de roca de yeso | 3 días | lun 17/07/17 | mié 21/07/17 | 112 | 2% |
| 114 | Canalizaciones en tabiques | 3 días | sáb 22/07/17 | mar 25/07/17 | 113 | 2% |
| 115 | Emplacado y resaltado tabiques | 3 días | mié 26/07/17 | lun 31/07/17 | 114 | 2% |
| 116 | Frentes estirados de oficina + pañol + baños | 5 días | mié 01/08/17 | mar 07/08/17 | 115 | 2% |
| 117 | Pintura sobre muros, cielorrasos y carpinterías existentes | 20 días | mié 26/07/17 | jue 17/08/17 | 115,C | 2% |
| 118 | Instalación eléctrica (bajo piso tecnico) | 7 días | mié 26/07/17 | mié 02/08/17 | 114 | 2% |
| 119 | Cableado estructurado | 7 días | jue 03/08/17 | lun 10/08/17 | 118 | 2% |
| 120 | Cierre ptua tecnica y mediacion | 2 días | vie 11/08/17 | sáb 12/08/17 | 118,119 | 2% |
| 121 | Reubicacion instalacion detectores de humedad | 3 días | mar 01/08/17 | sáb 05/08/17 | 115 | 2% |
| 122 | Alfombra | 5 días | vie 18/08/17 | mar 22/08/17 | 117,120,121 | 2% |
| 123 | **Entrega de mobiliario de OBRA** | **3 días** | **lun 21/08/17** | **lun 21/08/17** | **2%** | **2 días 2%** |
| 124 | Armado de equipamiento operativo | 3 días | lun 21/08/17 | sáb 26/08/17 | 123 | 2% |
| 125 | Equipamiento + cableado | 8 días | lun 28/08/17 | mar 05/09/17 | 124 | 2% |
| 126 | Certificación de puestos | 2 días | mié 06/09/17 | jue 07/09/17 | 125 | 2% |
| 127 | Gráfica | 5 días | jue 24/08/17 | mar 29/08/17 | 122FC+15 días | 2% |
| 128 | Limpieza final | 7 días | mié 06/09/17 | mié 13/09/17 | 127,126 | 2% |
| 129 | Terminaciones y ajustes | 10 días | mié 06/09/17 | sáb 16/09/17 | 126 | 2% |
| 130 | **Entrega Provisoria piso 1º** | **0 días** | **sáb 16/09/17** | **sáb 16/09/17** | **2%** | |
| 131 | **Entrega Provisoria ETAPA 2** | 0 días | sáb 16/09/17 | sáb 16/09/17 | 130,95 | 2% |
