Veolia - Cronograma base

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% comple
1	**OBRA VEOLIA - OFICINAS PISO 6 - PANAMERICANA PLAZA**	**65 días**	**mié 12/07/17**	**vie 06/10/17**	**0%**
2	**Etapa Construcción**	**46 días**	**vie 11/08/17**	**mié 11/10/17**	**0%**
3	**DESMONTES**	**23 días**	**vie 11/08/17**	**vie 08/09/17**	**0%**
4	Definición Alcance AA e Incendio	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	0%
5	Desmonte de cielorraso	2 días	sáb 19/08/17	lun 21/08/17	0%
6	Desmonte de cocladores	2 días	vie 11/08/17	lun 14/08/17	0%
7	Desmonte de artefactos de iluminación	3 días	mié 16/08/17	vie 18/08/17	0%
8	**TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO**	**19 días**	**vie 11/08/17**	**lun 04/09/17**	**0%**
9	Replanteo	0 días	sáb 19/08/17	sáb 19/08/17	100%
10	Ejecución de estructura	3 días	sáb 19/08/17	mar 22/08/17	0%
11	Emplaque 1º cara	2 días	mié 23/08/17	jue 24/08/17	0%
12	Pase instalaciones - Cierre Tabique	1 día	vie 25/08/17	vie 25/08/17	0%
13	Sobre tabiques y refuerzos para frentes vidriados	3 días	vie 25/08/17	lun 28/08/17	0%
14	Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones	2 días	jue 31/08/17	vie 01/09/17	0%
15	Masillado	2 días	lun 04/09/17	mar 05/09/17	0%
16	Traspaso de Durlock a Pintura (RECEPCION de TABIQUES)	0 días	mar 05/09/17	mar 05/09/17	0%
17	**REFUERZO PARA PUERTA PIVOT**	**2 días**	**mar 29/08/17**	**mié 30/08/17**	**0%**
18	Colocación de refuerzos	2 días	mar 29/08/17	mié 30/08/17	0%
19	**CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**8 días**	**sáb 26/08/17**	**mar 05/09/17**	**0%**
20	Cielorrasos	3 días	lun 25/09/17	mié 27/09/17	0%
21	Reparaciones varias en cielorrasos por paso de instalaciones	2 días	vie 15/09/17	lun 18/09/17	0%
22	Perforaciones para artefactos de iluminacion	1 día	mié 27/09/17	mié 27/09/17	0%
23	**CIELORRASO MODULAR**	**6 días**	**mar 22/08/17**	**lun 28/08/17**	**0%**
24	Readecuación grillas SR y Directores	6 días	lun 04/09/17	lun 11/09/17	0%
25	Cierre Cielorraso Desmontable	3 días	lun 25/09/17	lun 25/09/17	0%
26	Reemplacado de cielorrasos	2 días	lun 25/09/17	mar 26/09/17	0%
27	**PINTURA**	**17 días**	**lun 04/09/17**	**mar 26/09/17**	**0%**
28	Preparación y pintado de cielorraso	5 días	mar 19/09/17	lun 25/09/17	0%
29	Preparación y pintado de tabiques	6 días	lun 04/09/17	lun 11/09/17	0%
30	Terminaciones de pintura	3 días	vie 27/10/17	mar 31/10/17	0%
31	**PISO TECNICO**	**3 días**	**vie 15/09/17**	**mar 19/09/17**	**0%**
32	Cierre de Pisos	2 días	vie 15/09/17	lun 18/09/17	0%
33	Renivelación Final de Piso	1 día	mar 19/09/17	mar 19/09/17	0%
34	**ZOCALOS**	**2 días**	**mié 13/09/17**	**jue 14/09/17**	**0%**
35	Instalación de Zócalos	2 días	mié 13/09/17	jue 14/09/17	0%
36	**ALFOMBRA**	**36 días**	**vie 11/08/17**	**mié 27/09/17**	**0%**
37	Compra de Alfombra	0 días	vie 11/08/17	vie 11/08/17	0%
38	Instalación de alfombra	2 días	mar 26/09/17	mié 27/09/17	0%
39	**CRISTALES**	**20 días**	**mié 23/08/17**	**lun 18/09/17**	**0%**
40	Medición de Frentes Vidriados	3 días	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%
41	Colocación de frentes vidriados y revestimientos de vidrio	2 días	lun 25/09/17	mar 26/09/17	0%
42	**CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES**	**15 días**	**lun 11/09/17**	**vie 29/09/17**	**0%**
43	Medición de puertas	0 días	lun 11/09/17	lun 11/09/17	0%
44	Provisión y colocación de puertas	3 días	mié 27/09/17	vie 29/09/17	0%
45	**MUEBLES ESPECIALES**	**26,88 días**	**lun 28/08/17**	**mar 03/10/17**	**0%**
46	Medición de muebles especiales	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	0%
47	Instalación de mueble	2 días	lun 02/10/17	mar 03/10/17	0%
48	**DETECCION DE INCENDIO**	**35 días**	**vie 11/08/17**	**mar 26/09/17**	**0%**
49	Cableado para detección de incendio	3 días	vie 11/08/17	mar 15/08/17	0%
50	Recolocación de detectores	2 días	lun 25/09/17	mar 26/09/17	0%
51	**ARTEFACTOS DE ILUMINACION**	**3 días**	**vie 08/09/17**	**vie 08/09/17**	**0%**

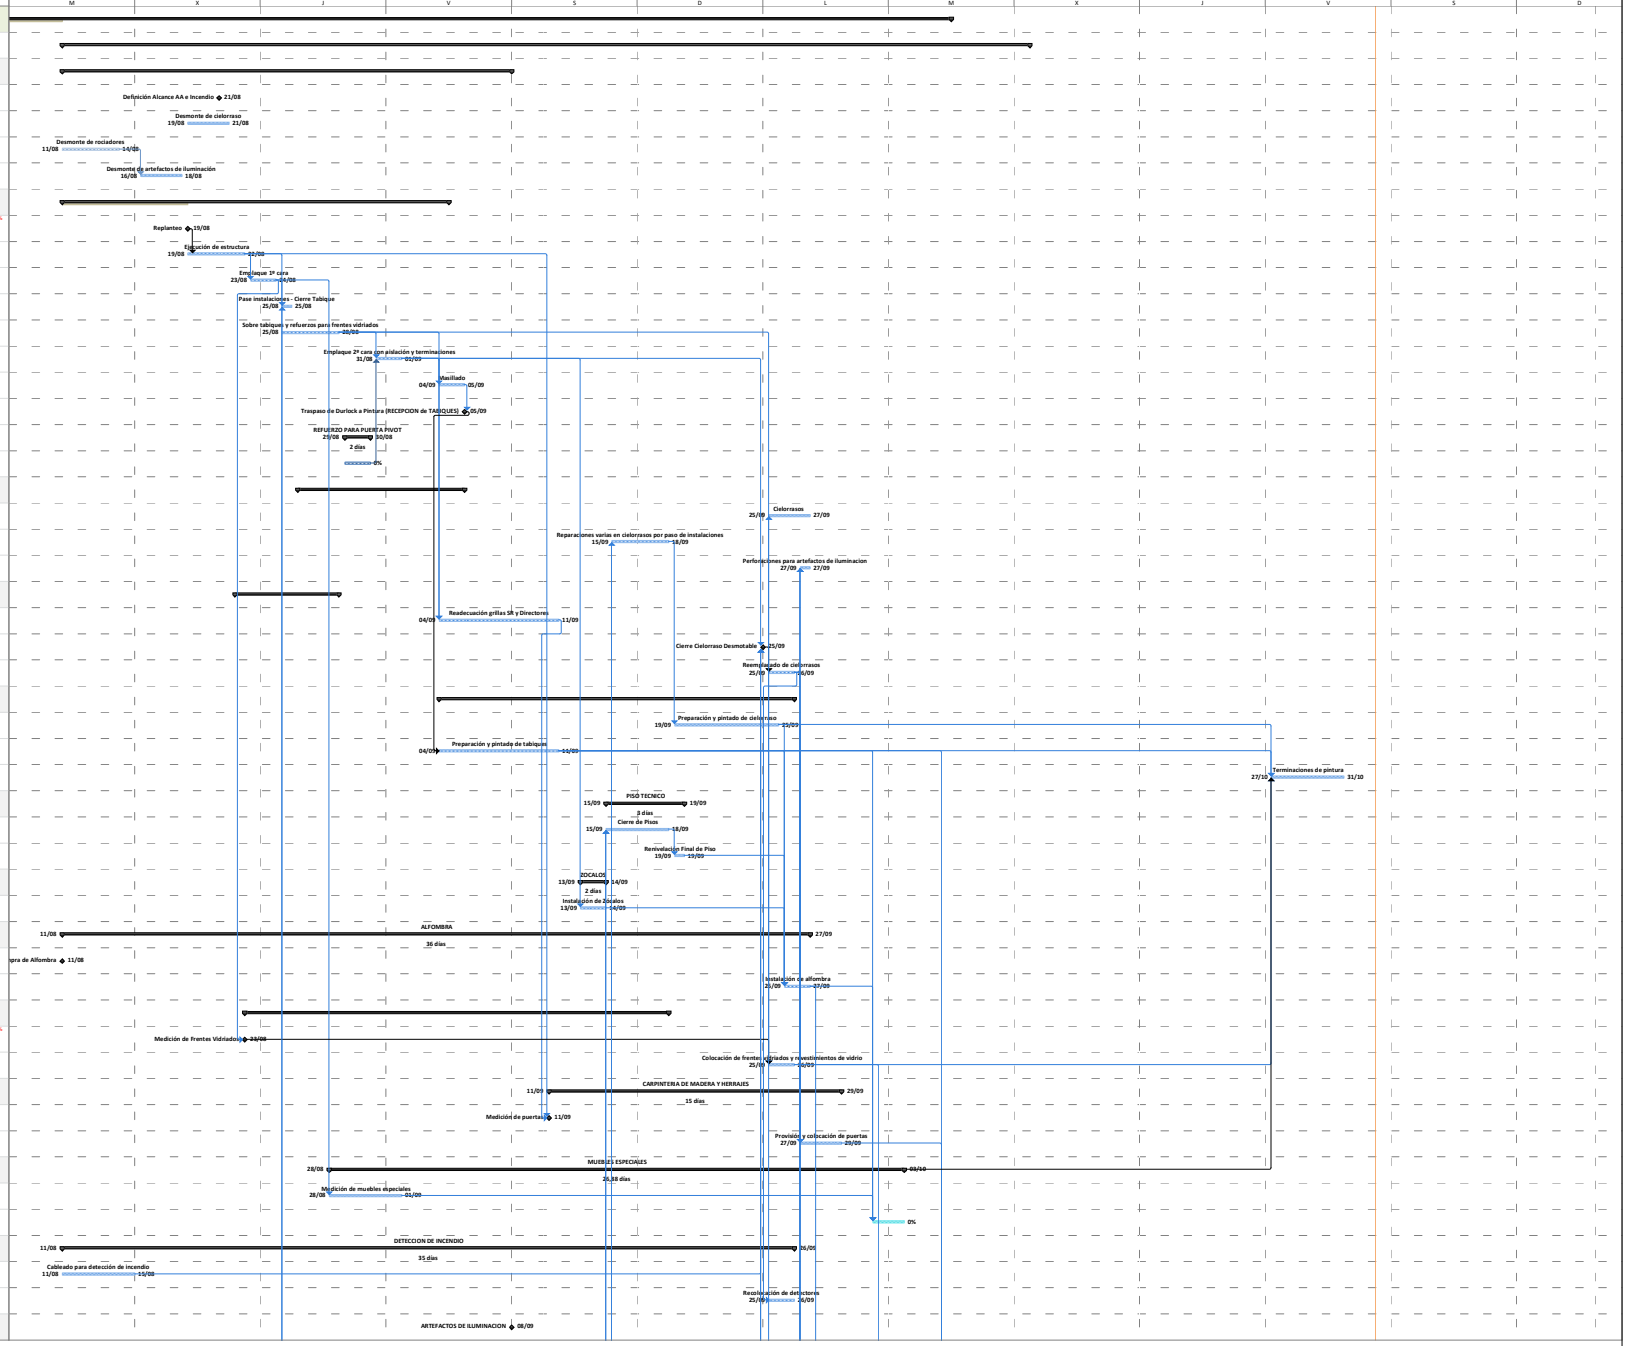

Tareas críticas · División crítica · Tarea · Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · División · Tarea manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Sólo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Veolia - Cronograma base

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% comple
52	Provisión de Artefactos de iluminación	0 días	vie 08/08/17	vie 08/08/17	0%
53	**INSTALACION ELECTRICA**	**45 días**	**vie 11/08/17**	**mar 10/10/17**	**0%**
54	Iluminacion de obra	2 días	vie 11/08/17	lun 14/08/17	0%
55	Canalizaciones bajo piso	5 días	mar 15/08/17	sáb 19/08/17	0%
56	Canalización en tabiques	3 días	mar 22/08/17	jue 24/08/17	0%
57	Cañerías Multimedia	2 días	vie 25/08/17	sáb 26/08/17	0%
58	Canalizaciones de iluminación y baja tensión	7 días	vie 25/08/17	vie 01/09/17	0%
59	Cableado de iluminación	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	0%
60	Cableado tensión común y dedicada	5 días	sáb 26/08/17	jue 31/08/17	0%
61	Cableado de Utps	5 días	vie 01/09/17	jue 07/09/17	0%
62	Armado de tableros y readecuación de tableros	4 días	lun 11/09/17	jue 14/09/17	0%
63	Vínculos entre pisos	4 días	lun 11/09/17	jue 14/09/17	0%
64	Colocación de Faceplate	2 días	mié 15/11/17	jue 16/11/17	0%
65	Recepción de Tableros	1 día	vie 15/09/17	vie 15/09/17	0%
66	Colocación de artefactos de iluminación	7 días	mié 27/09/17	jue 05/10/17	0%
67	Cableado de puestos	3 días	jue 05/10/17	lun 09/10/17	0%
68	Armado de Data center	2 días	vie 06/10/17	lun 09/10/17	0%
69	Recepción del Data Center y energía de obra	0 días	lun 09/10/17	lun 09/10/17	0%
70	**AIRE ACONDICIONADO**	**7 días**	**lun 21/08/17**	**lun 28/08/17**	**0%**
71	Replanteo	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	0%
72	Modificacion de conductos y agregado de equipo.	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	0%
73	**GRAFICA**	**7 días**	**lun 25/09/17**	**mar 03/10/17**	**0%**
74	Definición de vinilos	1 día	lun 25/09/17	lun 25/09/17	0%
75	Colocación de vinilos esmerilados	2 días	lun 02/10/17	mar 03/10/17	0%
76	**EQUIPAMIENTO**	**3 días**	**jue 28/09/17**	**lun 02/10/17**	**0%**
77	Entrega muebles de diseño sillas operativas	1 día	lun 02/10/17	lun 02/10/17	0%
78	Armado de muebles de línea	2 días	jue 28/09/17	vie 29/09/17	0%
79	**ENTREGA DE OBRA**	**17 días**	**vie 22/09/17**	**lun 16/10/17**	**0%**
80	Detalles finales	4 días	mié 27/09/17	lun 02/10/17	0%
81	Recepción Provisoria de Obra	0 días	mié 11/10/17	mié 11/10/17	0%
82	Pre entrega FMAX	0 días	mié 11/10/17	mié 11/10/17	0%
83	Post Ocupación	13 días	mié 11/10/17	vie 27/10/17	0%
84	Recepción definitiva	0 días	vie 27/10/17	vie 27/10/17	0%
85	TAREAS A CARGO CLIENTE	3 días	mié 11/10/17	vie 13/10/17	0%

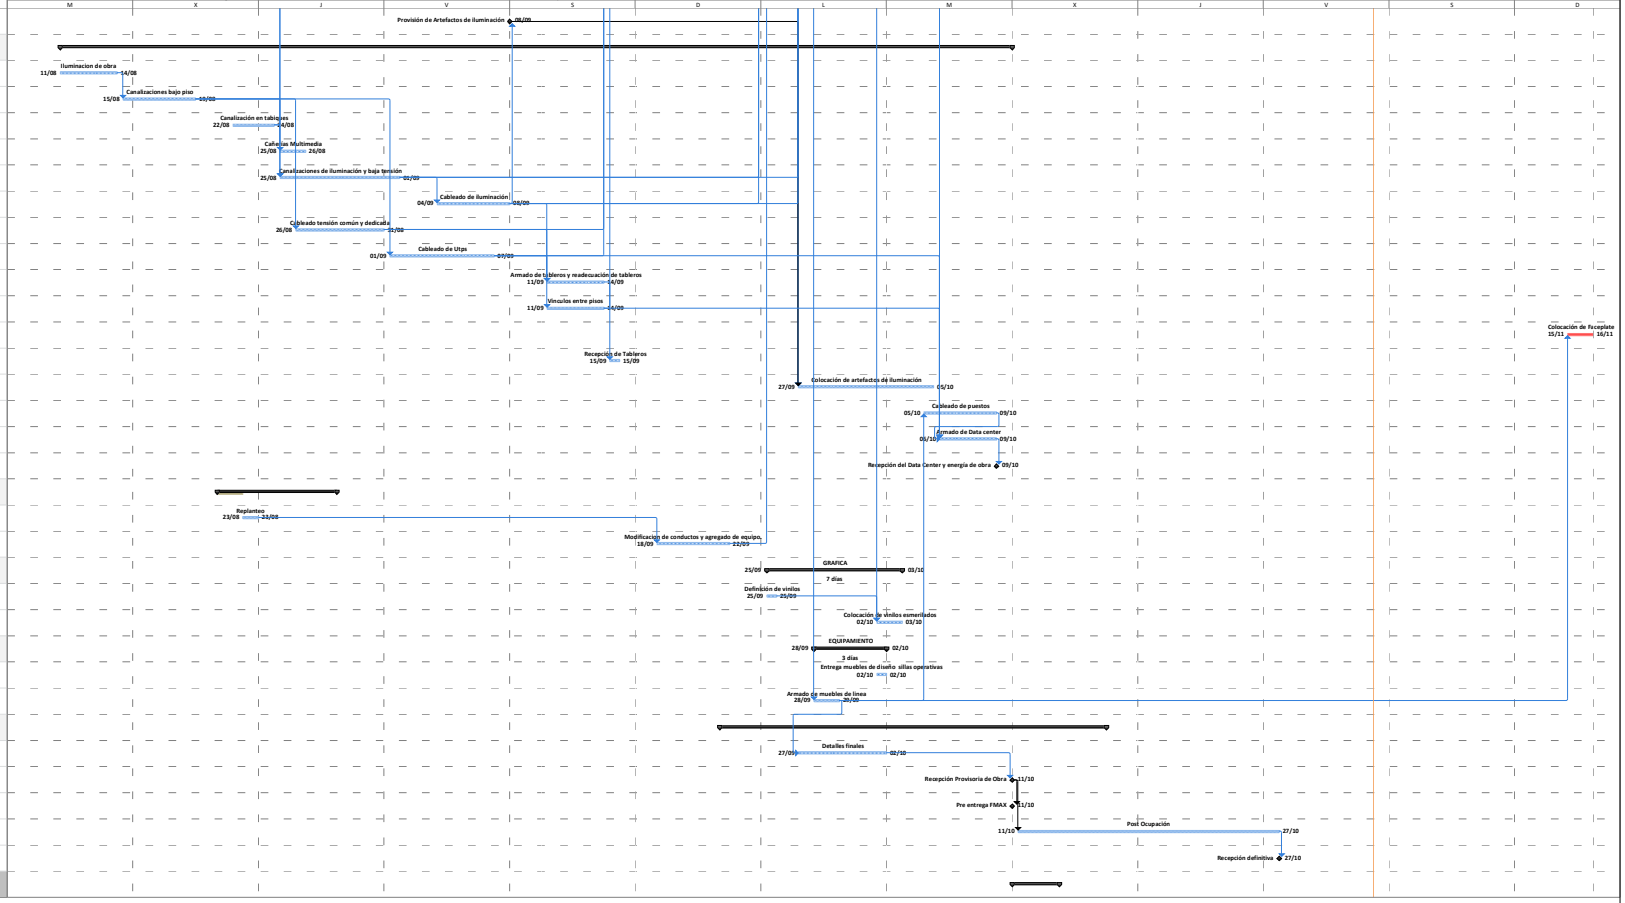

Tareas críticas · Progreso de tarea crítica · División · Tarea manual · Sólo fin · Línea base · Hito de línea base · Progreso del resumen · Resumen manual · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo
División crítica · Tarea · Progreso de tarea · Sólo el comienzo · Sólo duración · División de la línea base · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Fecha límite
