CRONOGRAMA TAREAS OBRA GIVAUDAN ETAPA N° 1
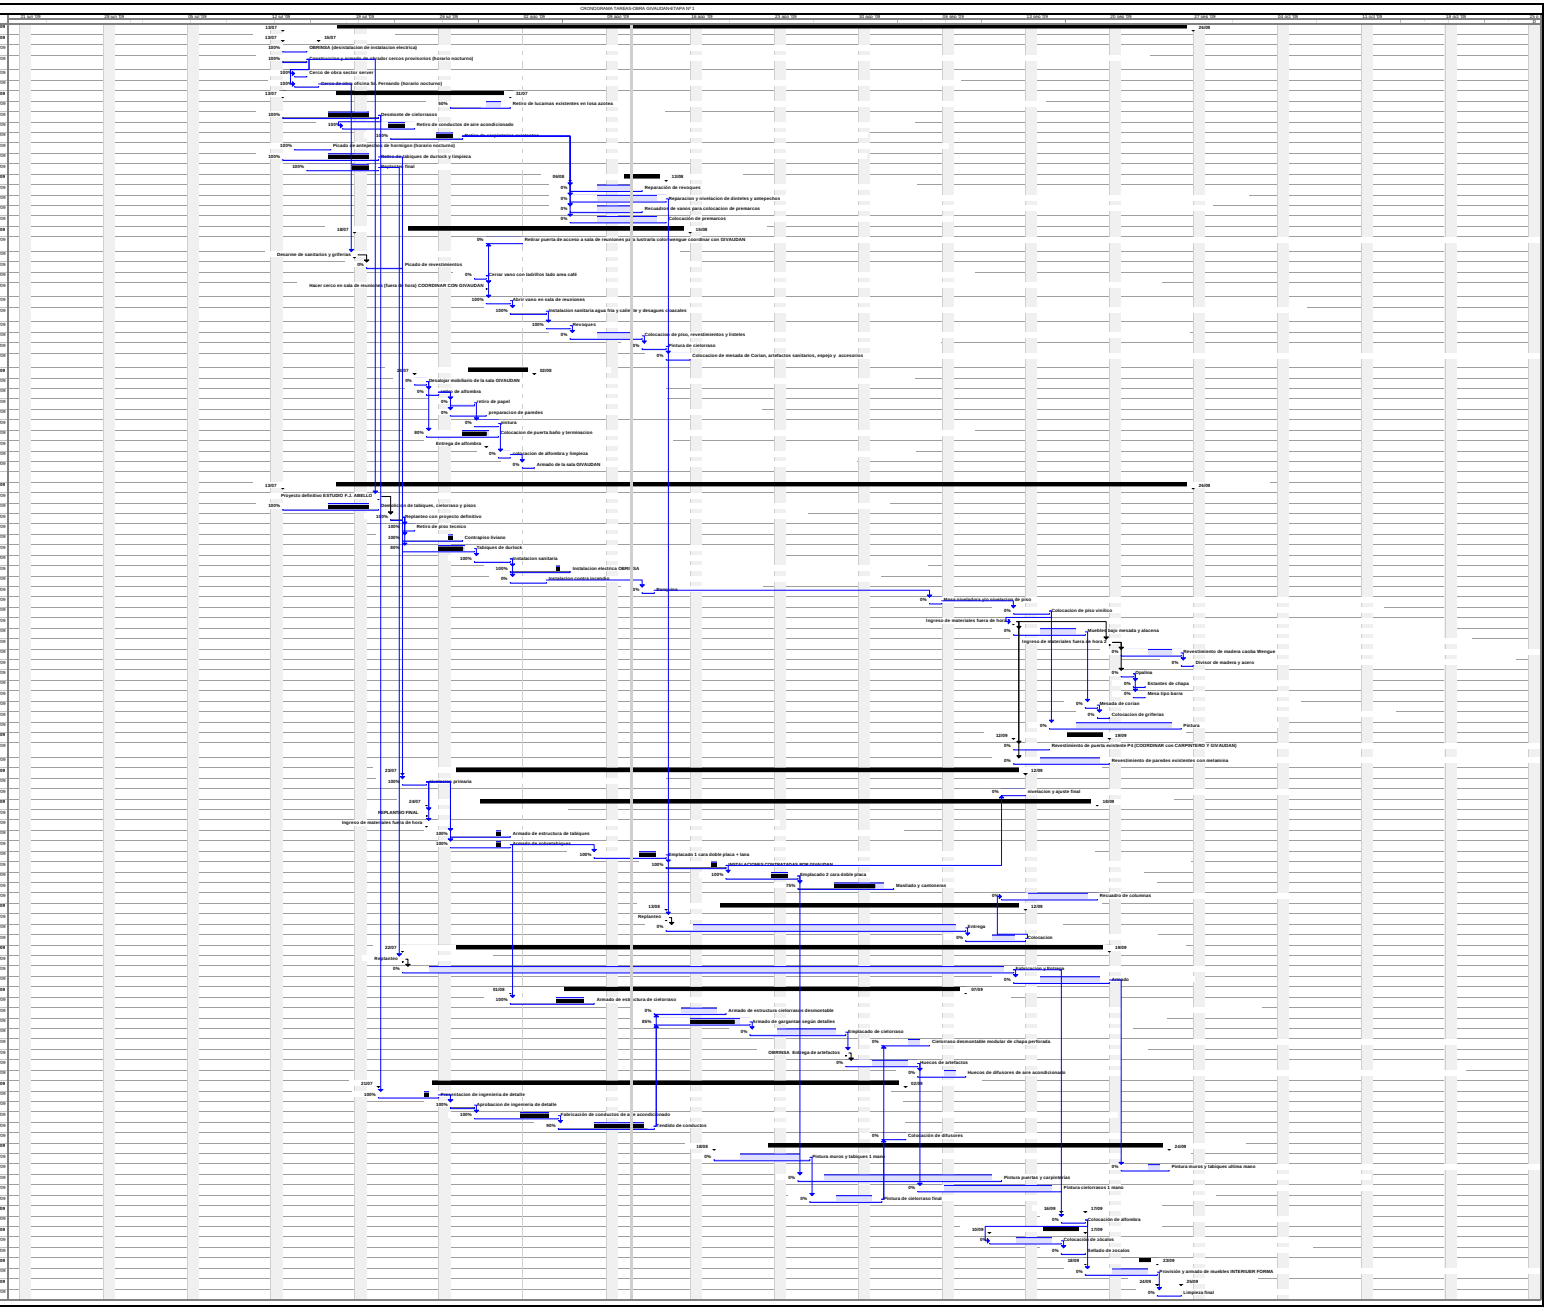
ID	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	1	OBRA GIVAUDAN CRONOGRAMA 1° ETAPA	67 días	lun 13/07/09
2	2	PRELIMINARES	3 días	lun 13/07/09
3	3	OBRINSA (desinstalacion de instalacion electrica)	2 días	lun 13/07/09
4	4	Construccion y armado de alrededor cercos provisorios (horario nocturno)	2 días	lun 13/07/09
5	5	Cerco de obra sector server	1 día	mar 14/07/09
6	6	Cerco de obra oficina Sr. Fernando (horario nocturno)	2 días	mar 14/07/09
7	7	DEMOLICION	17 días	lun 13/07/09
8	8	Retiro de lucarnas existentes en losa azotea	5 días	lun 27/07/09
9	9	Desmonte de cielorrasos	7 días	lun 13/07/09
10	10	Retiro de conductos de aire acondicionado	5 días	sáb 18/07/09
11	11	Retiro de carpinterias existentes	5 días	mié 22/07/09
12	12	Picado de antepechos de hormigon (horario nocturno)	3 días	mar 14/07/09
13	13	Retiro de tabiques de durlock y limpieza	3 días	lun 13/07/09
14	14	Replanteo final	5 días	mié 15/07/09
15	15	ALBAÑILERIA	7 días	jue 09/08/09
16	16	Reparacion de revoques	5 días	jue 09/08/09
17	17	Reparacion y nivelacion de dinteles y antepechos	2 días	jue 09/08/09
18	18	Recuadros de vanos para colocacion de premarcos	5 días	jue 09/08/09
19	19	Colocación de premarcos	7 días	jue 09/08/09
20	20	BAÑO SALA DE REUNIONES LOCAL 4.20	25 días	sáb 18/07/09
21	21	Retirar puerta de acceso a sala de reuniones por la bateria cocina coordinar con GIVAUDAN	5 días	jue 30/07/09
22	22	Desarme de sanitarios y griferias	5 días	sáb 18/07/09
23	23	Picado de revestimientos	3 días	lun 20/07/09
24	24	Cerrar vano con ladrillos lado area café	1 día	mié 29/07/09
25	25	Hacer cerco en sala de reuniones (fuera de hora) COORDINAR CON GIVAUDAN	5 días	mié 29/07/09
26	26	Abrir vano en sala de reuniones	3 días	jue 30/07/09
27	27	Instalacion sanitaria agua fria y caliente y desagues cloacales	3 días	sáb 11/08/09
28	28	Revoques	2 días	mar 04/08/09
29	29	Colocacion de piso, revestimientos y listeles	5 días	jue 06/08/09
30	30	Pintura de cielorraso	2 días	mié 12/08/09
31	31	y accesorios	2 días	vie 14/08/09
32	32	SALA SAN TELMO	9 días	vie 24/07/09
33	33	Desalojar mobiliario de la sala GIVAUDAN	1 día	vie 24/07/09
34	34	retiro de alfombra	1 día	sáb 25/07/09
35	35	retiro de papel	2 días	lun 27/07/09
36	36	preparacion de paredes	3 días	lun 27/07/09
37	37	pintura	2 días	mié 29/07/09
38	38	Colocacion de puerta baño y terminacion	5 días	sáb 25/07/09
39	39	Entrega de alfombra	0 días	jue 30/07/09
40	40	colocacion de alfombra y limpieza	1 día	vie 31/07/09
41	41	Armado de la sala GIVAUDAN	1 día	jueves 23/08/09
42	42			
43	43	AREA CAFE LOCAL 4.15	57 días	lun 13/07/09
44	44	Proyecto definitivo ESTUDIO F.J. ABELLO	0 días	mar 21/07/09
45	45	Demolicion de tabiques, cielorraso y pisos	7 días	lun 13/07/09
46	46	Replanteo con proyecto definitivo	1 día	mié 22/07/09
47	47	Retiro de piso tecnico	1 día	jue 23/07/09
48	48	Contrapiso liviano	2 días	jue 23/07/09
49	49	Tabiques de durlock	5 días	jue 23/07/09
50	50	Instalacion sanitaria	3 días	mié 29/07/09
51	51	Instalacion electrica OBRINSA	5 días	sáb 01/08/09
52	52	Instalacion cocina incalera	3 días	sáb 01/08/09
53	53	Banquina	1 día	mié 12/08/09
54	54	Mesa revestidos p/o revitacion de piso	1 día	sáb 05/09/09
55	55	Colocacion de piso vinilico	2 días	sáb 12/09/09
56	56	Ingreso de materiales fuera de hora 1	0 días	sáb 12/09/09
57	57	Muebles bajo mesada y alacena	5 días	sáb 12/09/09
58	58	Ingreso de materiales fuera de hora 2	0 días	sáb 19/09/09
59	59	Revestimiento de madera cadia Wengue	5 días	lun 21/09/09
60	60	Divisor de madera y acero	1 día	sáb 26/09/09
61	61	Opalina	1 día	lun 21/09/09
62	62	Estantes de chapa	1 día	mar 22/09/09
63	63	Mesa tipo barra	1 día	mar 22/09/09
64	64	Mesada de cartas	1 día	vie 18/09/09
65	65	Colocacion de griferias	1 día	sáb 19/09/09
66	66	Pintura	10 días	mar 15/09/09
67	67	AREA SERVER LOCAL 4.3	7 días	sáb 12/09/09
68	68	CARPINTERO Y GIVAUDAN)	2 días	sáb 12/09/09
69	69	Revestimiento de paredes existentes con melamina	7 días	sáb 12/09/09
70	70	PISO TECNICO	46 días	jue 23/07/09
71	71	nivelacion primaria	2 días	jue 23/07/09
72	72	nivelacion y ajuste final	2 días	vie 11/09/09
73	73	TABIQUES SUMLOCK	39 días	vie 24/07/09
74	74	REPLANTEO FINAL	0 días	vie 24/07/09
75	75	Ingreso de materiales fuera de hora	0 días	vie 24/07/09
76	76	Armado de estructura de tabiques	5 días	lun 27/07/09
77	77	Armado de sobrestaques	5 días	lun 27/07/09
78	78	Emplacado 1 cara doble placa + lana	5 días	sáb 08/08/09
79	79	INSTALACIONES CONTRATADAS POR GIVAUDAN	6 días	vie 14/08/09
80	80	Emplacado 2 cara doble placa	5 días	mar 18/08/09
81	81	Masillado y cantoneras	7 días	mar 25/08/09
82	82	Recuadro de columnas	7 días	vie 11/09/09
83	83	VENTANAS DE ALUMINIO	26 días	jue 13/08/09
84	84	Replanteo	0 días	jue 13/08/09
85	85	entrega	21 días	vie 21/08/09
86	86	Colocacion	5 días	mar 08/09/09
87	87	PRENTES VIDRIADOS INTERIOR FORMA	52 días	mié 22/07/09
88	88	Replanteo	0 días	mié 22/07/09
89	89	Fabricacion y Entrega	45 días	jue 23/07/09
90	90	Armado	7 días	sáb 12/09/09
91	91	CIELORRASOS	33 días	sáb 01/08/09
92	92	Armado de estructura de cielorraso	7 días	sáb 01/08/09
93	93	Armado de estructura cielorraso desmontable	5 días	jue 13/08/09
94	94	Armado de gargantas segun detalles	7 días	jue 13/08/09
95	95	Emplacado de cielorraso	7 días	vie 21/08/09
96	96	Cielorraso desmontable modular de chapa perforada	4 días	mar 01/09/09
97	97	OBRINSA Entrega de artefactos	0 días	vie 28/08/09
98	98	Huecos de artefactos	5 días	sáb 29/08/09
99	99	Huecos de difusores de aire acondicionado	3 días	vie 04/09/09
100	100	AIRE ACONDICIONADO	35 días	mar 21/07/09
101	101	Presentacion de ingeniería de detalle	5 días	mar 21/07/09
102	102	Aprobacion de ingeniería de detalle	2 días	lun 27/07/09
103	103	Fabricación de conductos de aire acondicionado	7 días	mié 29/07/09
104	104	Tendido de conductos	7 días	mié 05/08/09
105	105	Colocación de difusores	2 días	mar 01/09/09
106	106	PINTURA	37 días	mar 18/08/09
107	107	Pintura muros y tabiques 1 mano	7 días	mar 18/08/09
108	108	Pintura muros y tabiques última mano	4 días	lun 21/09/09
109	109	Pintura puertas y carpinterias	15 días	mar 25/08/09
110	110	Pintura cielorrasos 1 mano	10 días	vie 04/09/09
111	111	Pintura de cielorraso final	5 días	mié 26/08/09
112	112	ALFOMBRA	7 días	mié 16/09/09
113	113	Colocación de alfombra	7 días	mié 16/09/09
114	114	ZOCALOS	7 días	jue 10/09/09
115	115	Colocación de zócalos	5 días	jue 10/09/09
116	116	Sellado de zocalos	2 días	mié 16/09/09
117	117	EQUIPAMIENTO	5 días	vie 18/09/09
118	118	Provision y armado de muebles INTERIOR FORMA	5 días	vie 18/09/09
119	119	LIMPIEZA	2 días	jue 24/09/09
120	120	Limpieza final	2 días	jue 24/09/09
