Id		Nombre de tarea	Duración
1			
2		**Obra Vale 4 piso**	**35 días**
3		Aprobación del presupuesto	0 días
4		Inicio de obra	0 días
5		**Demoliciones**	**5 días**
7		Desmonte de instalaciones detección de humo, electricidad y aire acondicionado	2 días
6		Demolición de tabiques y cielorrasos	4 días
8		**Albañilería y Tabiques**	**24 días**
9		Tabiques de durlock	7 días
10		Tabiques de U Glass	3 días
12		Colocación de puertas de cristal	1 día
11		Colocación de revestimientos	3 días
25		**Instalación eléctrica**	**23 días**
26		Tendido de cañerías para detección de humo	5 días
28		Tendido de iluminación	8 días
27		Cableado y reubicación de detectores - TELLEX -	5 días
29		Tendido de cableado bajo piso	10 días
30		Tableros	5 días
31		**Instalación termomecánica**	**16 días**

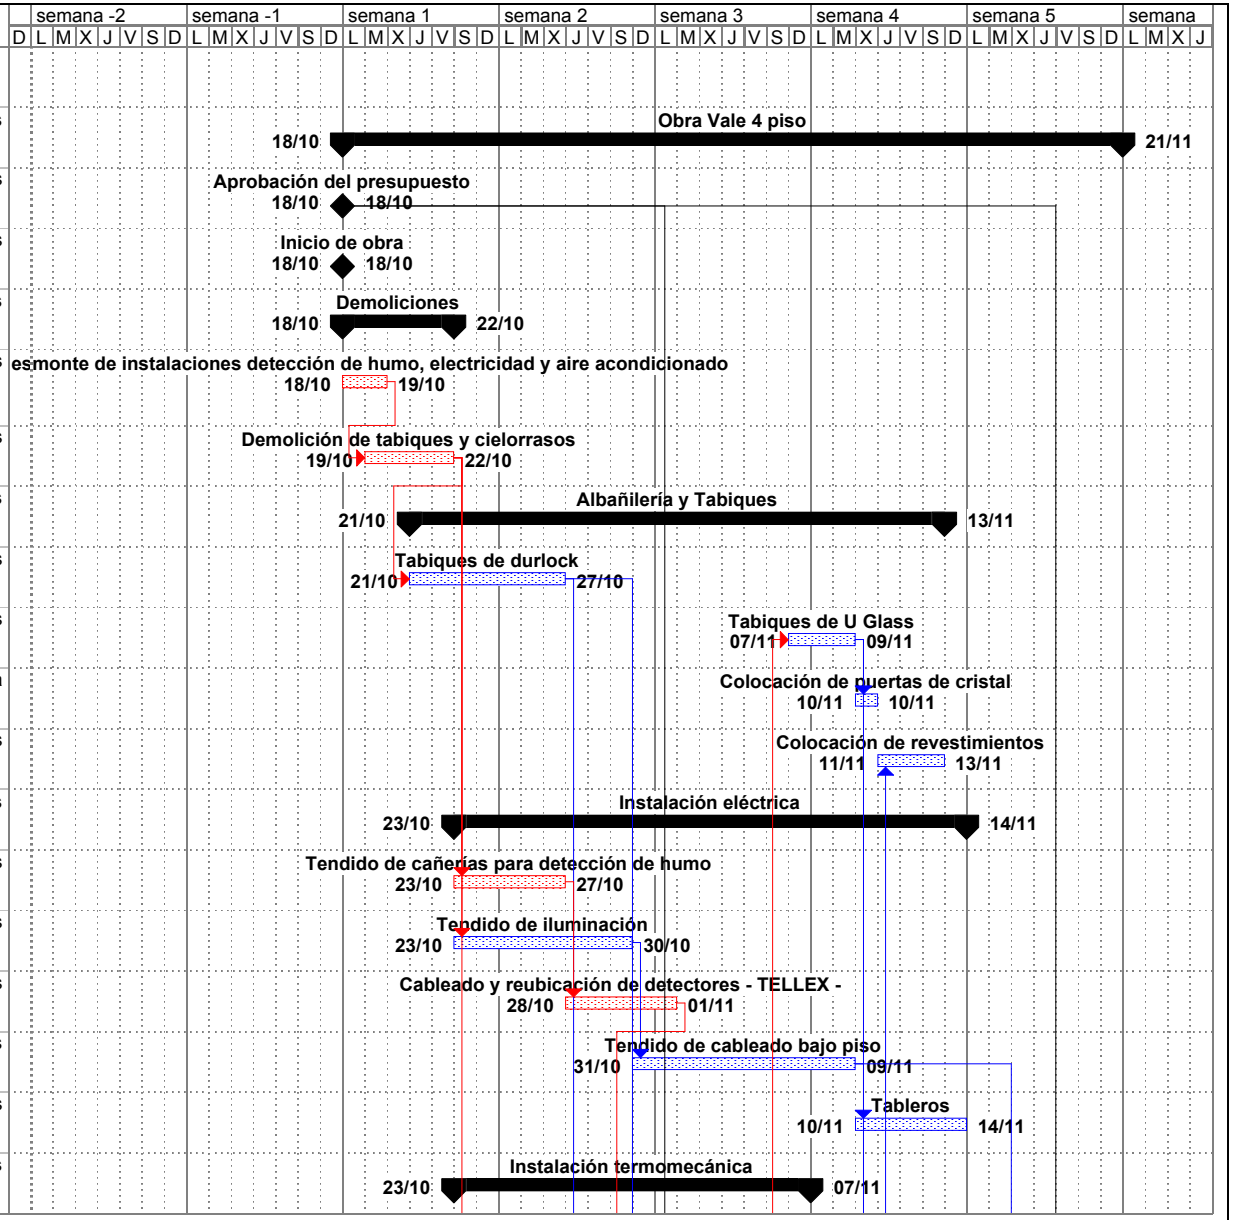

Proyecto: Obra: Vale 4 piso
Fecha: lun 04/10/10

Tareas críticas		División		Hito de línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Línea de base		Progreso del resumen		Hito externo	
Tarea		División de la línea de base		Resumen		Fecha límite	

Id		Nombre de tarea	Duración
32		Tendido de conductos	11 días
34		Provisión de equipos nuevos	0 días
33		Conexión de equipos	5 días
22		**Pintura**	**20 días**
23		Pintura en tabiques	12 días
24		Pintura en cielorrasos	11 días
15		**Cielorraso**	**12 días**
16		Cielorraso continuo	9 días
17		Cielorraso desmontable	3 días
13		**Instalación sanitaria**	**3 días**
14		Tendido de condensado	3 días
18		**Pisos**	**9 días**
21		Colocación de zócalos	3 días
19		Colocación de alfombra modular	2 días
20		Colocación de piso flotante	2 días
35		**Equipamiento**	**3 días**
36		Armado de equipamiento	3 días
37		Mesada baño	1 día
38		Mueble bajo mesada en coffee	1 día

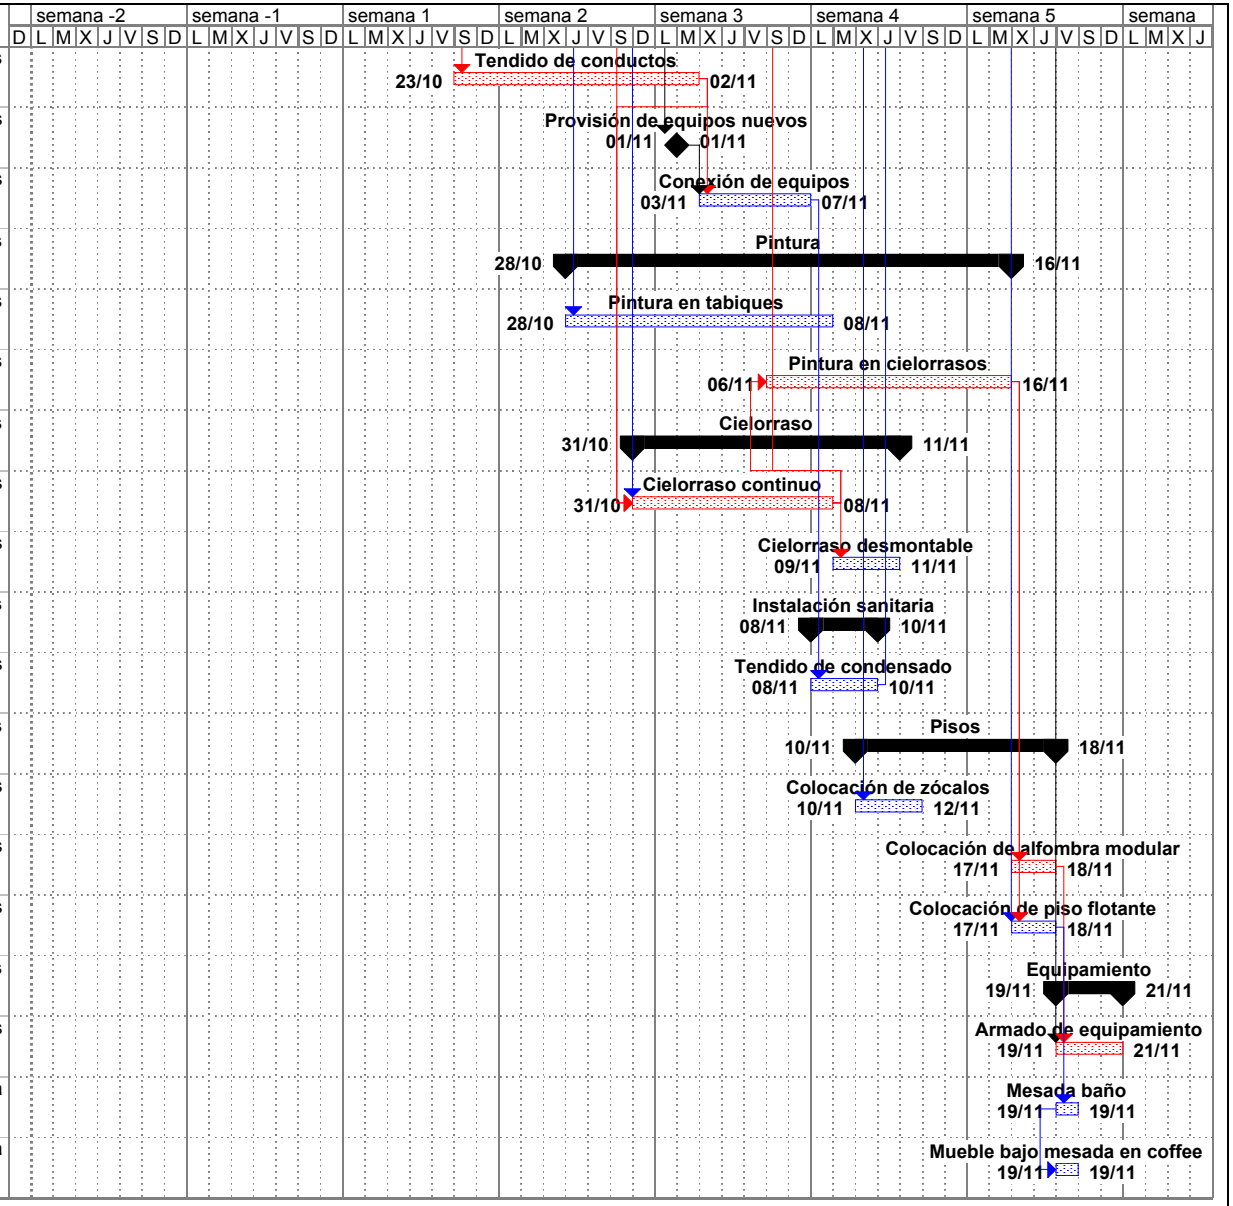

Proyecto: Obra: Vale 4 piso
Fecha: lun 04/10/10

Tareas críticas		División		Hito de línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Línea de base		Progreso del resumen		Hito externo	
Tarea		División de la línea de base		Resumen		Fecha límite	
