PROYECTO CEVA ABERTIS

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	**PROYECTO CEVA-ENEA**	**53 días**	**jue 23/06/11**
2	**Trabajos Preliminares**	**9 días**	**jue 23/06/11**
3	Nivelación de pisos	6 días	jue 23/06/11
4	Trazado de tabiques, antepechos y vigas	2 días	jue 30/06/11
5	Trazado cielos	2 días	sáb 02/07/11
6	**Instalaciones sobre cielo**	**18 días**	**mar 05/07/11**
7	Intalacion de ductos	8 días	mar 05/07/11
8	Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes del	8 días	mar 05/07/11
9	Canalización para alumbrado	5 días	jue 14/07/11
10	Cableado para alumbrado	5 días	mié 20/07/11
11	**Tabiques Volcometal e Instalaciones Interiores**	**22 días**	**jue 30/06/11**
12	Estructuración tabiques. Of y sector comedor	11 días	jue 30/06/11
13	Estructura tabiques baños y of primer piso	8 días	mié 13/07/11
14	Tabique primera cara	6 días	sáb 09/07/11
16	Canalización para interruptores,termostatos,enchufes	3 días	jue 14/07/11
63	Tablero TDA	4 días	sáb 16/07/11
18	Instalaciones sanitarias al interior de tabiquería	3 días	sáb 16/07/11
15		1 día?	mar 21/06/11
20	Tabique segunda cara.	3 días	lun 18/07/11
21	Cableado de electricidad y corrientes débiles	3 días	jue 21/07/11
22	Cableado de termostatos	2 días	sáb 23/07/11
23	Henhuinchado,empastado y aparejo	5 días	lun 18/07/11
42	Instalación de soporte módulos de enchufes e interru	2 días	sáb 23/07/11
24	**Vigas, dinteles y zocalos Volcometal**	**8 días**	**mar 19/07/11**
26	Estructuración y forrado de vigas, sobre tabiques vidr	4 días	mar 19/07/11
61	Estructuración y forrado de vigas, sobre tabiques vidr	3 días	vie 22/07/11
27	Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y vig	3 días	lun 25/07/11
28	Zocalo descraga wc perimetral baños	2 días	jue 21/07/11
29	**Cielos Modulares**	**10 días**	**jue 28/07/11**
30	Estructuración Cielo Modular	3 días	jue 28/07/11
31	Instalación de luminarias Embutida Alta Eficiencia	4 días	lun 01/08/11
32	Instalación de luminarias Foco PL	3 días	jue 04/08/11
44		1 día?	mar 21/06/11
34	Instalación Palmetas	4 días	jue 04/08/11
35	**Puertas y Ventanas**	**16 días**	**jue 21/07/11**
36	Rectificación de medidas	1 día	jue 28/07/11
37	Instalación de perfilería de aluminio	4 días	vie 29/07/11
39	Instalación de cristales	4 días	mar 02/08/11
62	Instalación de Junquillos de aluminio	3 días	vie 05/08/11
40	Instalación de marcos y puertas	3 días	jue 21/07/11
41	Instalación quincalleria puertas	2 días	lun 25/07/11
73	**Recintos Húmedos**	**16 días**	**lun 25/07/11**
43	Instalacion de Porcelanato y fragues (pisos)	5 días	lun 25/07/11
45	Instalación Porcelanato (muros)	4 días	sáb 30/07/11
46	Instalacion de Lavamanos	2 días	jue 04/08/11
72	Instalacion de Wc	2 días	sáb 06/08/11
47	Instalación mueble comedor	2 días	mar 09/08/11
48	Instalacion lavaplatos	1 día	jue 11/08/11
49	**Terminaciones en zonas de trabajo**	**10 días**	**lun 01/08/11**
50	Instalación de alfombras	5 días	lun 01/08/11
51	Instalación de cubrejuntas	2 días	vie 05/08/11
52	Instalación de perfil aluminio remate alfombra borde e	2 días	lun 08/08/11
53	Cubierta de alfombra con cartón	1 día	mié 10/08/11
54	Instalación topes puertas	1 día	jue 11/08/11
55	Instalación de guardapolvos	2 días	vie 05/08/11
56	**Pinturas**	**11 días**	**jue 28/07/11**
57	Primera mano de pintura en tabiques, muros existent	3 días	jue 28/07/11
58	Pintura de puertas	2 días	lun 08/08/11
59	Pintura Guardapolvos	2 días	lun 08/08/11
60	Segunda mano de pintura en tabiques, muros exister	3 días	sáb 06/08/11
74	**Otros**	**13 días**	**mié 10/08/11**
69	Instalacion de Films tabiqueria cristal	2 días	mié 10/08/11
68	Instalacion de Kit de emergencia	2 días	vie 12/08/11
64	Instalacion de muebles	6 días	vie 12/08/11
65	Canalizacion de puestos operativos	3 días	jue 18/08/11
66	Cableado por mobiliario	2 días	mar 23/08/11
67	Certificacion, prueba y rotulado	1 día	mié 24/08/11
70	**Observaciones**	**1 día**	**mié 24/08/11**
71	Limpieza general	1 día	mié 24/08/11

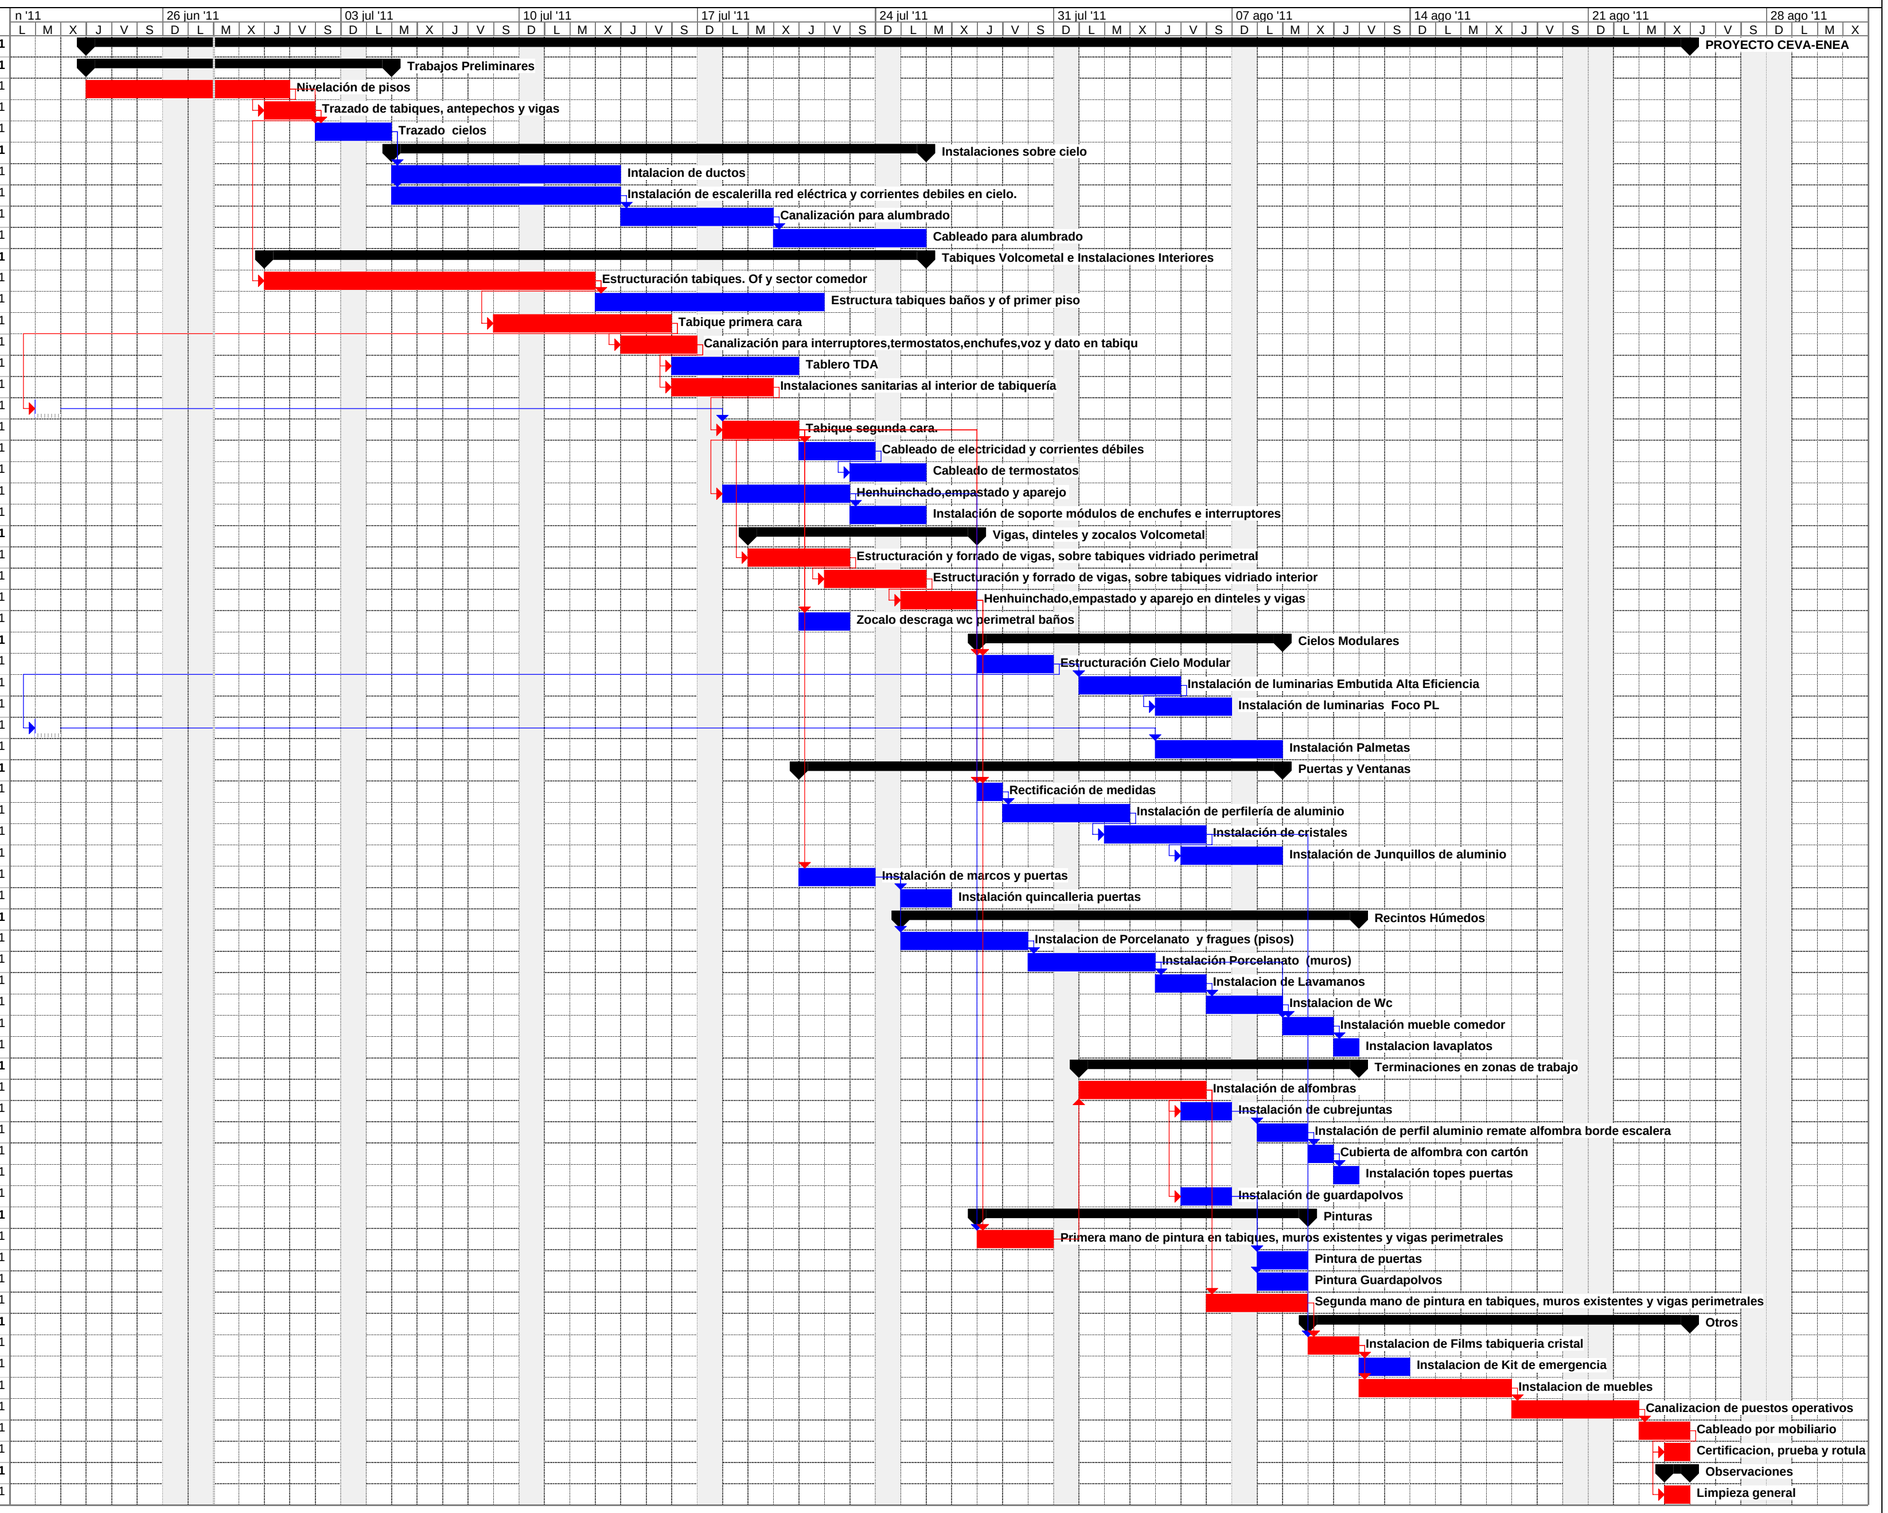

Fecha: mar 28/06/11

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite
