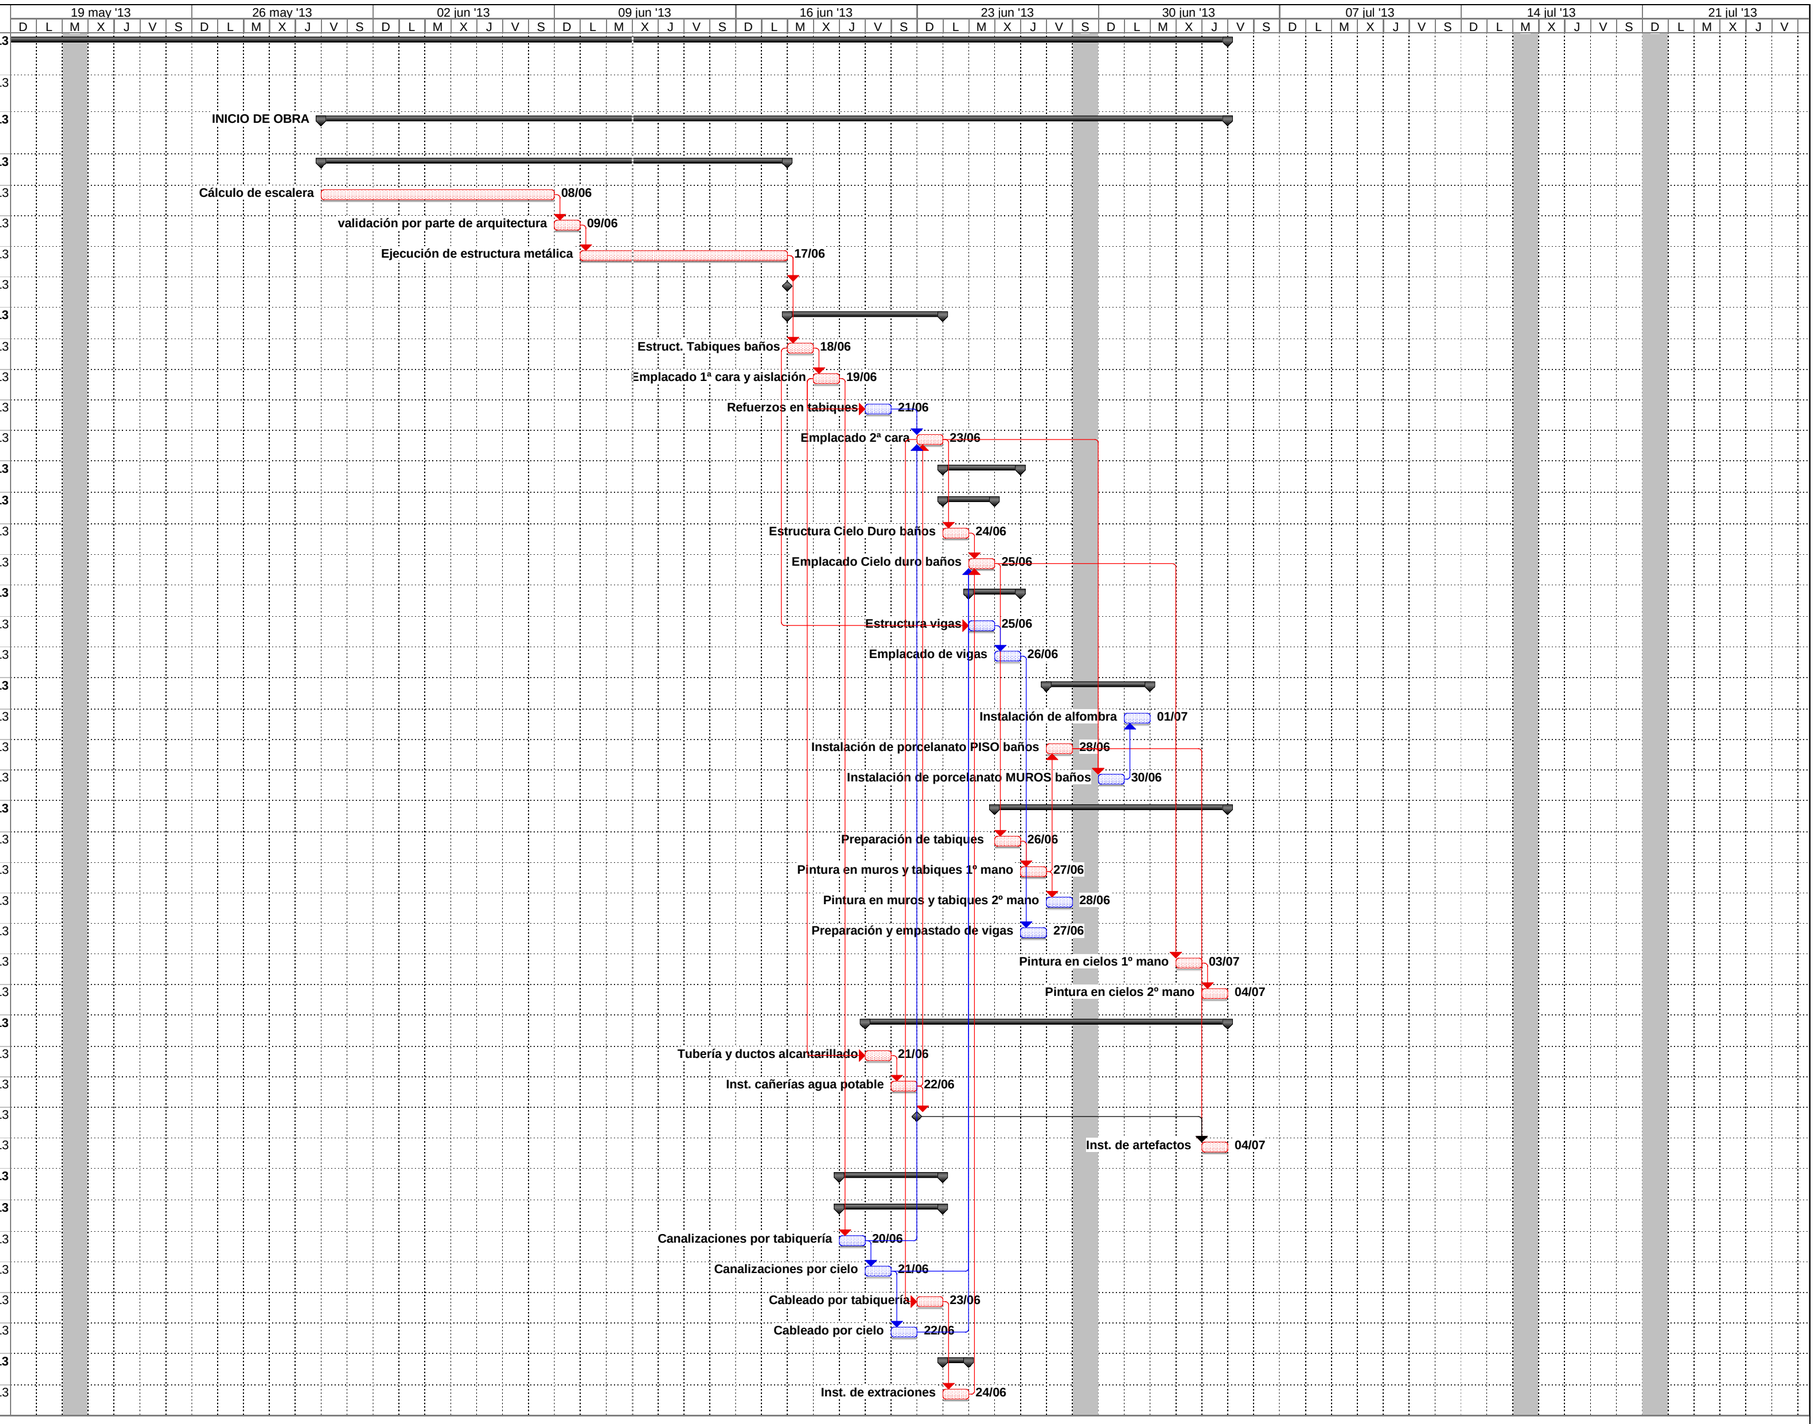Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	**INDENOR**	**68 días**	**mar 23/04/13**
2	REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO	0 días	mar 23/04/13
3	**INICIO DE OBRA**	**34 días**	**vie 31/05/13**
4	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**18 días**	**vie 31/05/13**
5	Cálculo de escalera	9 días	vie 31/05/13
6	validación por parte de arquitectura	1 día	dom 09/06/13
7	Ejecución de estructura metálica	8 días	lun 10/06/13
8	Revestimientos por definir	0 días	lun 17/06/13
9	**TABIQUES**	**6 días**	**mar 18/06/13**
10	Estruct. Tabiques baños	1 día	mar 18/06/13
11	Emplacado 1ª cara y aislación	1 día	mié 19/06/13
12	Refuerzos en tabiques	1 día	vie 21/06/13
13	Emplacado 2ª cara	1 día	dom 23/06/13
14	**CIELO, VIGA Y CENEFAS**	**3 días**	**lun 24/06/13**
15	**Cielo Duro**	**2 días**	**lun 24/06/13**
16	Estructura Cielo Duro baños	1 día	lun 24/06/13
17	Emplacado Cielo duro baños	1 día	mar 25/06/13
18	**Vigas Volcometal para baños**	**2 días**	**mar 25/06/13**
19	Estructura vigas	1 día	mar 25/06/13
20	Emplacado de vigas	1 día	mié 26/06/13
21	**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS**	**3 días**	**vie 28/06/13**
22	Instalación de alfombra	1 día	lun 01/07/13
23	Instalación de porcelanato PISO baños	1 día	vie 28/06/13
24	Instalación de porcelanato MUROS baños	1 día	dom 30/06/13
25	**PINTURA**	**8 días**	**mié 26/06/13**
26	Preparación de tabiques	1 día	mié 26/06/13
27	Pintura en muros y tabiques 1º mano	1 día	jue 27/06/13
28	Pintura en muros y tabiques 2º mano	1 día	vie 28/06/13
29	Preparación y empastado de vigas	1 día	jue 27/06/13
30	Pintura en cielos 1º mano	1 día	mié 03/07/13
31	Pintura en cielos 2º mano	1 día	jue 04/07/13
32	**INSTALACION SANITARIA**	**13 días**	**vie 21/06/13**
33	Tubería y ductos alcantarillado	1 día	vie 21/06/13
34	Inst. cañerías agua potable	1 día	sáb 22/06/13
35	Prueba hidraulica	0 días	sáb 22/06/13
36	Inst. de artefactos	1 día	jue 04/07/13
37	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	**4 días**	**jue 20/06/13**
38	**Electricidad y dato**	**4 días**	**jue 20/06/13**
39	Canalizaciones por tabiquería	1 día	jue 20/06/13
40	Canalizaciones por cielo	1 día	vie 21/06/13
41	Cableado por tabiquería	1 día	dom 23/06/13
42	Cableado por cielo	1 día	sáb 22/06/13
43	**CLIMA**	**1 día**	**lun 24/06/13**
44	Inst. de extraciones	1 día	lun 24/06/13
