OBRA BANCO INDUSTRIAL- OCAMPO

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1					
2		**Inicio de Obra**	**34 días**	**jue 08/05/14**	**sáb 21/06/14**
3		**Demolición**	**3 días**	**jue 08/05/14**	**lun 12/05/14**
4		varios	3 días	jue 08/05/14	lun 12/05/14
5		**Tabiquería**	**3 días**	**lun 12/05/14**	**jue 15/05/14**
6		Terminaciones	3 días	lun 12/05/14	jue 15/05/14
7		**Zócalos**	**2 días**	**jue 15/05/14**	**lun 19/05/14**
8		Colocación	2 días	jue 15/05/14	lun 19/05/14
9		**Piso Técnico**	**21 días**	**jue 15/05/14**	**jue 12/06/14**
10		Apertura para instalaciones	3 días	jue 15/05/14	mar 20/05/14
11		Cierre del piso técnico	2 días	mar 10/06/14	jue 12/06/14
12		**Solados**	**4 días**	**jue 12/06/14**	**mié 18/06/14**
13		Nivelación piso técnico para solado	2 días	jue 12/06/14	lun 16/06/14
14		Colocación de piso de madera	2 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14
15		**Pintura**	**10 días**	**jue 15/05/14**	**jue 29/05/14**
16		Preparación de la superficie	3 días	jue 15/05/14	mar 20/05/14
17		Pintura base	2 días	mar 20/05/14	jue 22/05/14
18		Pintura Terminación	5 días	jue 22/05/14	jue 29/05/14
19		**Cristales**	**12 días**	**jue 15/05/14**	**sáb 31/05/14**
20		Medición en obra	1 día	jue 15/05/14	vie 16/05/14
21		Montaje	1 día	vie 30/05/14	sáb 31/05/14
22		**Instalación Electrica + Cableado estructurado**	**22 días**	**lun 12/05/14**	**mar 10/06/14**
23		Canalizaciones + cañerías por piso	6 días	mar 20/05/14	mié 28/05/14
24		Canalizaciones + cañerías por pared	4 días	lun 12/05/14	vie 16/05/14
25		Canalizaciones + cañerías por cielorraso	8 días	lun 12/05/14	jue 22/05/14
26		Cableado eléctrico	10 días	mié 28/05/14	mar 10/06/14
27		Cableado UTP	8 días	mié 28/05/14	sáb 07/06/14
28		Efectos iluminación	2 días	jue 15/05/14	lun 19/05/14
29		Modificación Tableros	5 días	mié 28/05/14	mar 03/06/14
30		Adecuación e inst. artefactos iluminación	5 días	jue 29/05/14	mié 04/06/14
31		Montaje de Face Plate/ cajas	1 día	mié 28/05/14	jue 29/05/14
32		**Aire Acondicionado**	**7 días**	**lun 12/05/14**	**mié 21/05/14**
33		Instalacion de equipos nuevos	7 días	lun 12/05/14	mié 21/05/14
34		**Mobiliario**	**3 días**	**mié 18/06/14**	**sáb 21/06/14**
35		Montajes muebles especiales	3 días	mié 18/06/14	sáb 21/06/14
36		**Limpieza de Obra**	**34 días**	**jue 08/05/14**	**sáb 21/06/14**
37		Diaria	32 días	jue 08/05/14	jue 19/06/14
38		Final	2 días	jue 19/06/14	sáb 21/06/14

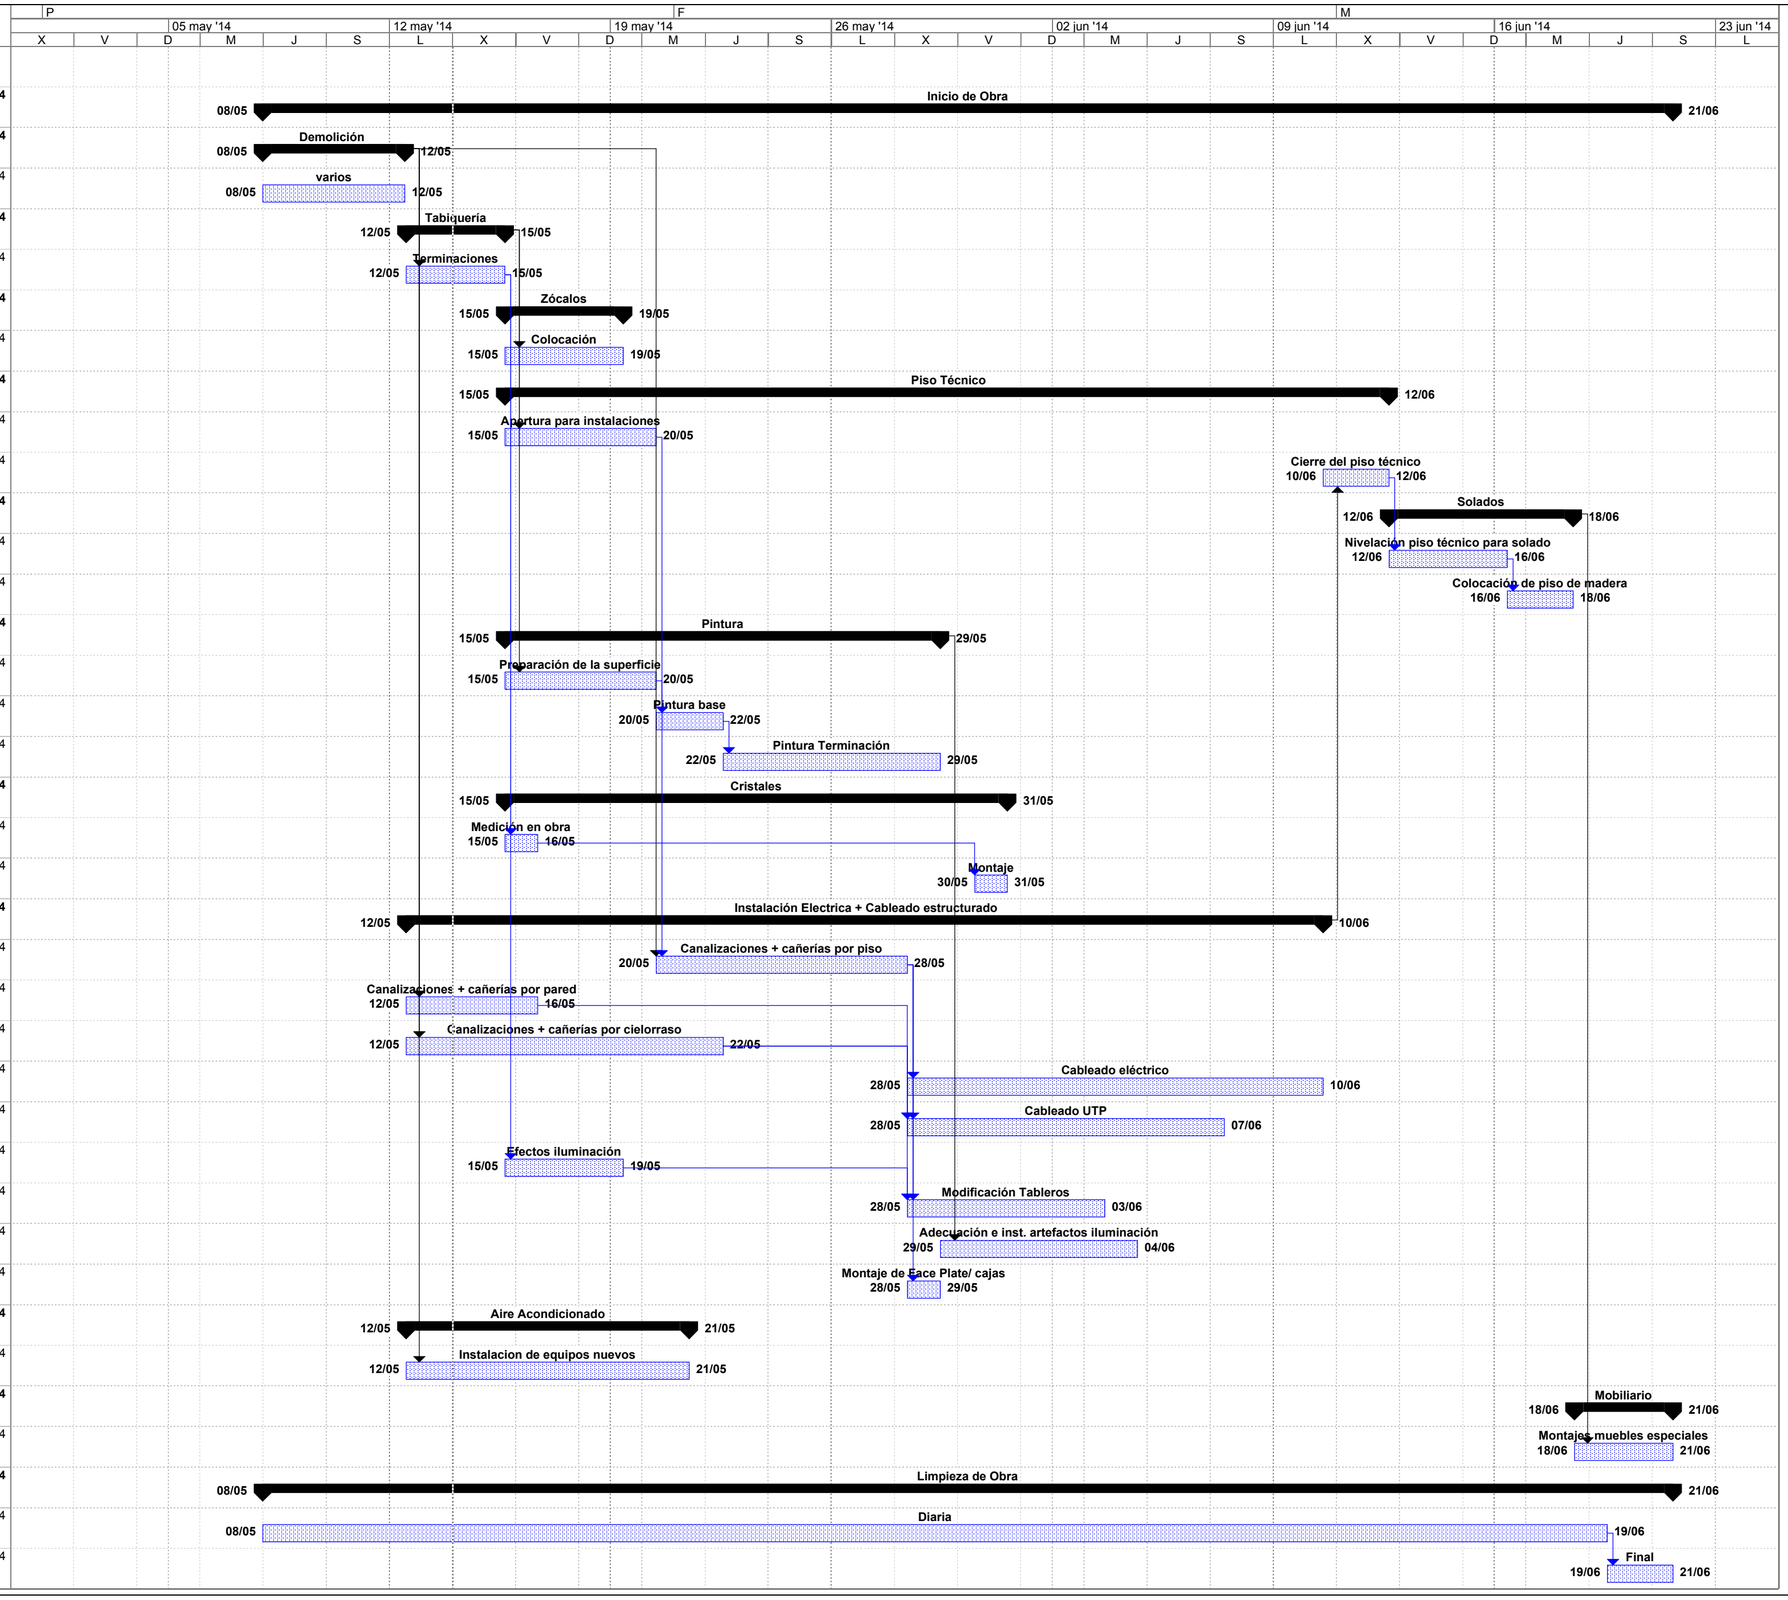

Proyecto: Obra Ocampo
Fecha: mié 14/05/14

Tarea | Hito | Resumen | Tarea resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Tarea inactiva | Progreso | Fecha límite
