OBRA: SANGARI
TEMA: CRONOGRAMA DE OBRA

contract

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**PRELIMINARES**	**27,5 días**	**lun 05/01/09**	**dom 01/02/09**
2	FIRMA CONTRATO	0 días	lun 05/01/09	lun 05/01/09
3	NUEVO CONTRATO	0 días	mar 20/01/09	mar 20/01/09
4	AVISO DE OBRA	19,5 días	mar 13/01/09	dom 01/02/09
5	ACOPIO	2 días	jue 22/01/09	vie 23/01/09
6	**OBRA**	**70 días**	**lun 02/02/09**	**dom 12/04/09**
7	INICIO DE OBRA	0 días	lun 02/02/09	lun 02/02/09
8	DEMOLICIONES Y DESMONTES	8 días	lun 02/02/09	lun 09/02/09
9	ALBAÑILERIA	6 días	dom 08/02/09	vie 13/02/09
10	TABIQUERIA	13 días	mar 10/02/09	dom 22/02/09
11	COLOCACION ZOCALOS	5 días	vie 06/03/09	mar 10/03/09
12	AIRE ACONDICIONADO CONDUCTOS	8 días	sáb 21/02/09	sáb 28/02/09
13	CIELORRASOS	8 días	dom 01/03/09	dom 08/03/09
14	ELECTRICIDAD ILUMINACION	26 días	mar 10/02/09	sáb 07/03/09
15	ELECTRICIDAD AIRE ACONDICIONADO	15 días	mar 10/02/09	mar 24/02/09
16	ELECTRICIDAD PUESTOS TRABAJO	10 días	sáb 14/02/09	lun 23/02/09
17	CABLEADO ESTRUCTURADO	10 días	mar 24/02/09	jue 05/03/09
18	DETECCION DE INCENDIOS	24 días	dom 08/03/09	mar 31/03/09
19	INSTALACION SANITARIA	7 días	mar 10/02/09	lun 16/02/09
20	COLOCACION REVESTIMIENTOS	6 días	mar 17/02/09	dom 22/02/09
21	COLOCACION ARTEFACTOS SANITARIOS Y MESADAS	6 días	mar 17/03/09	dom 22/03/09
22	CIERRES DESPACHOS	8 días	lun 09/03/09	lun 16/03/09
23	CRISTALES	4 días	mar 17/03/09	vie 20/03/09
24	PINTURA	20 días	jue 12/03/09	mar 31/03/09
25	COLOCACION ARTEFACTOS ILUMINACION	10 días	lun 09/03/09	mié 18/03/09
26	GRAFICA	4 días	sáb 21/03/09	mar 24/03/09
27	COLOCACION ALFOMBRAS	4 días	mié 01/04/09	sáb 04/04/09
28	LIMPIEZA OBRA DIARIA	55 días	lun 02/02/09	sáb 28/03/09
29	ARMADO DE EQUIPAMIENTO STANDARD	5 días	dom 05/04/09	jue 09/04/09
30	LIMPIEZA OBRA FINAL	3 días	vie 10/04/09	dom 12/04/09
31	FINAL DE OBRA	0 días	dom 12/04/09	dom 12/04/09

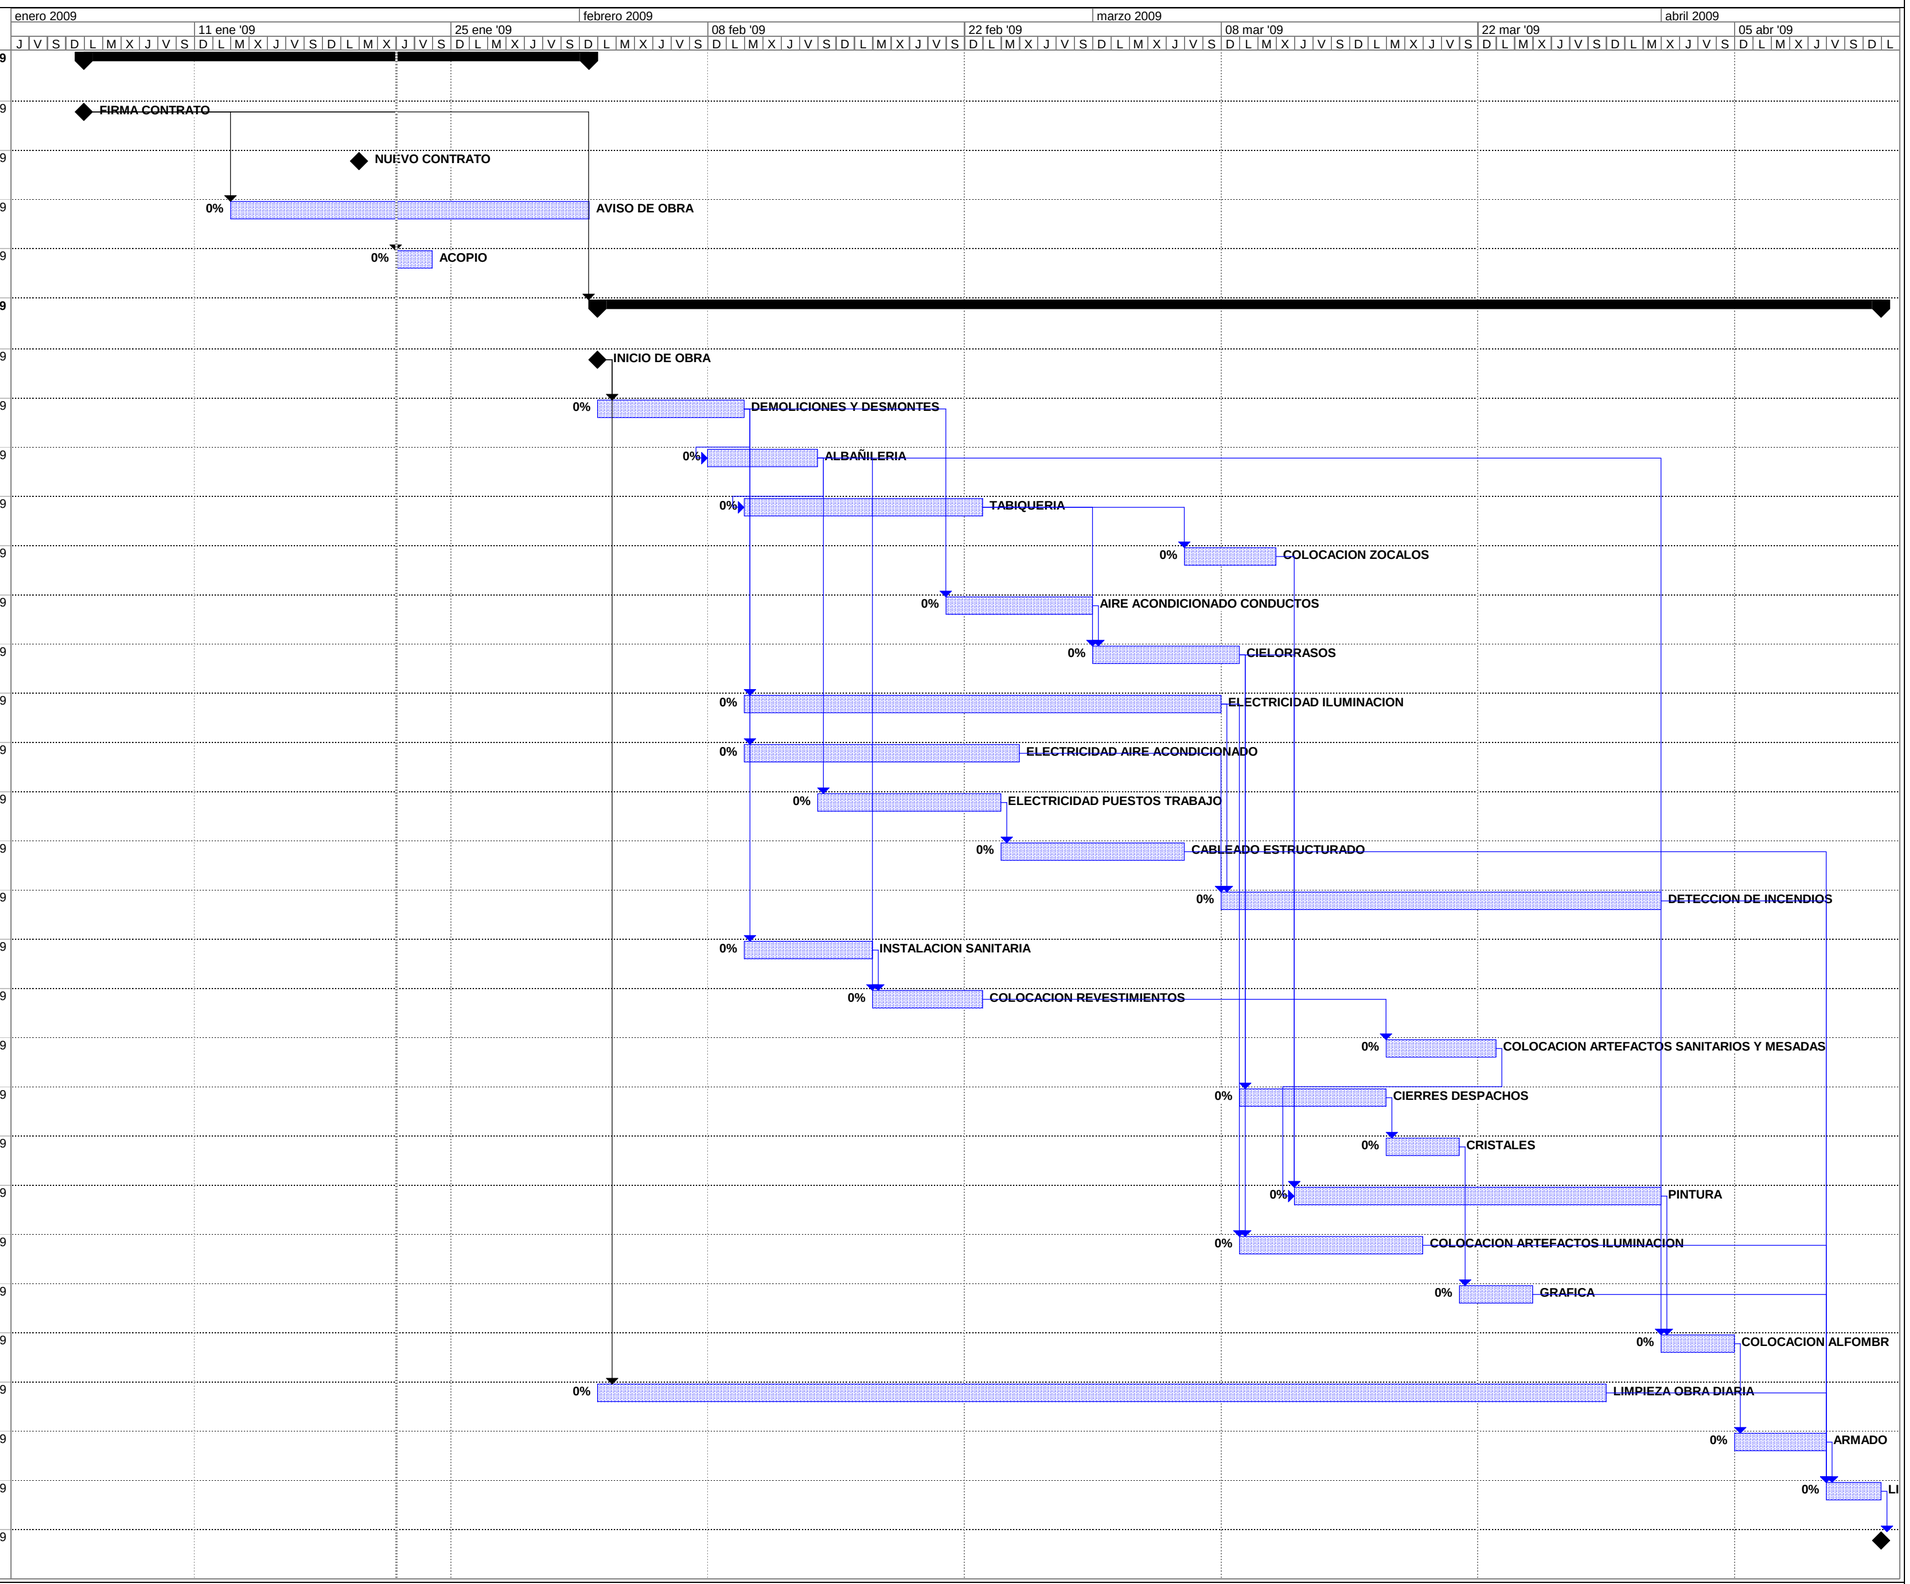

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	

EN ROJO PROVISIONES AJENAS A CONTRACT
