


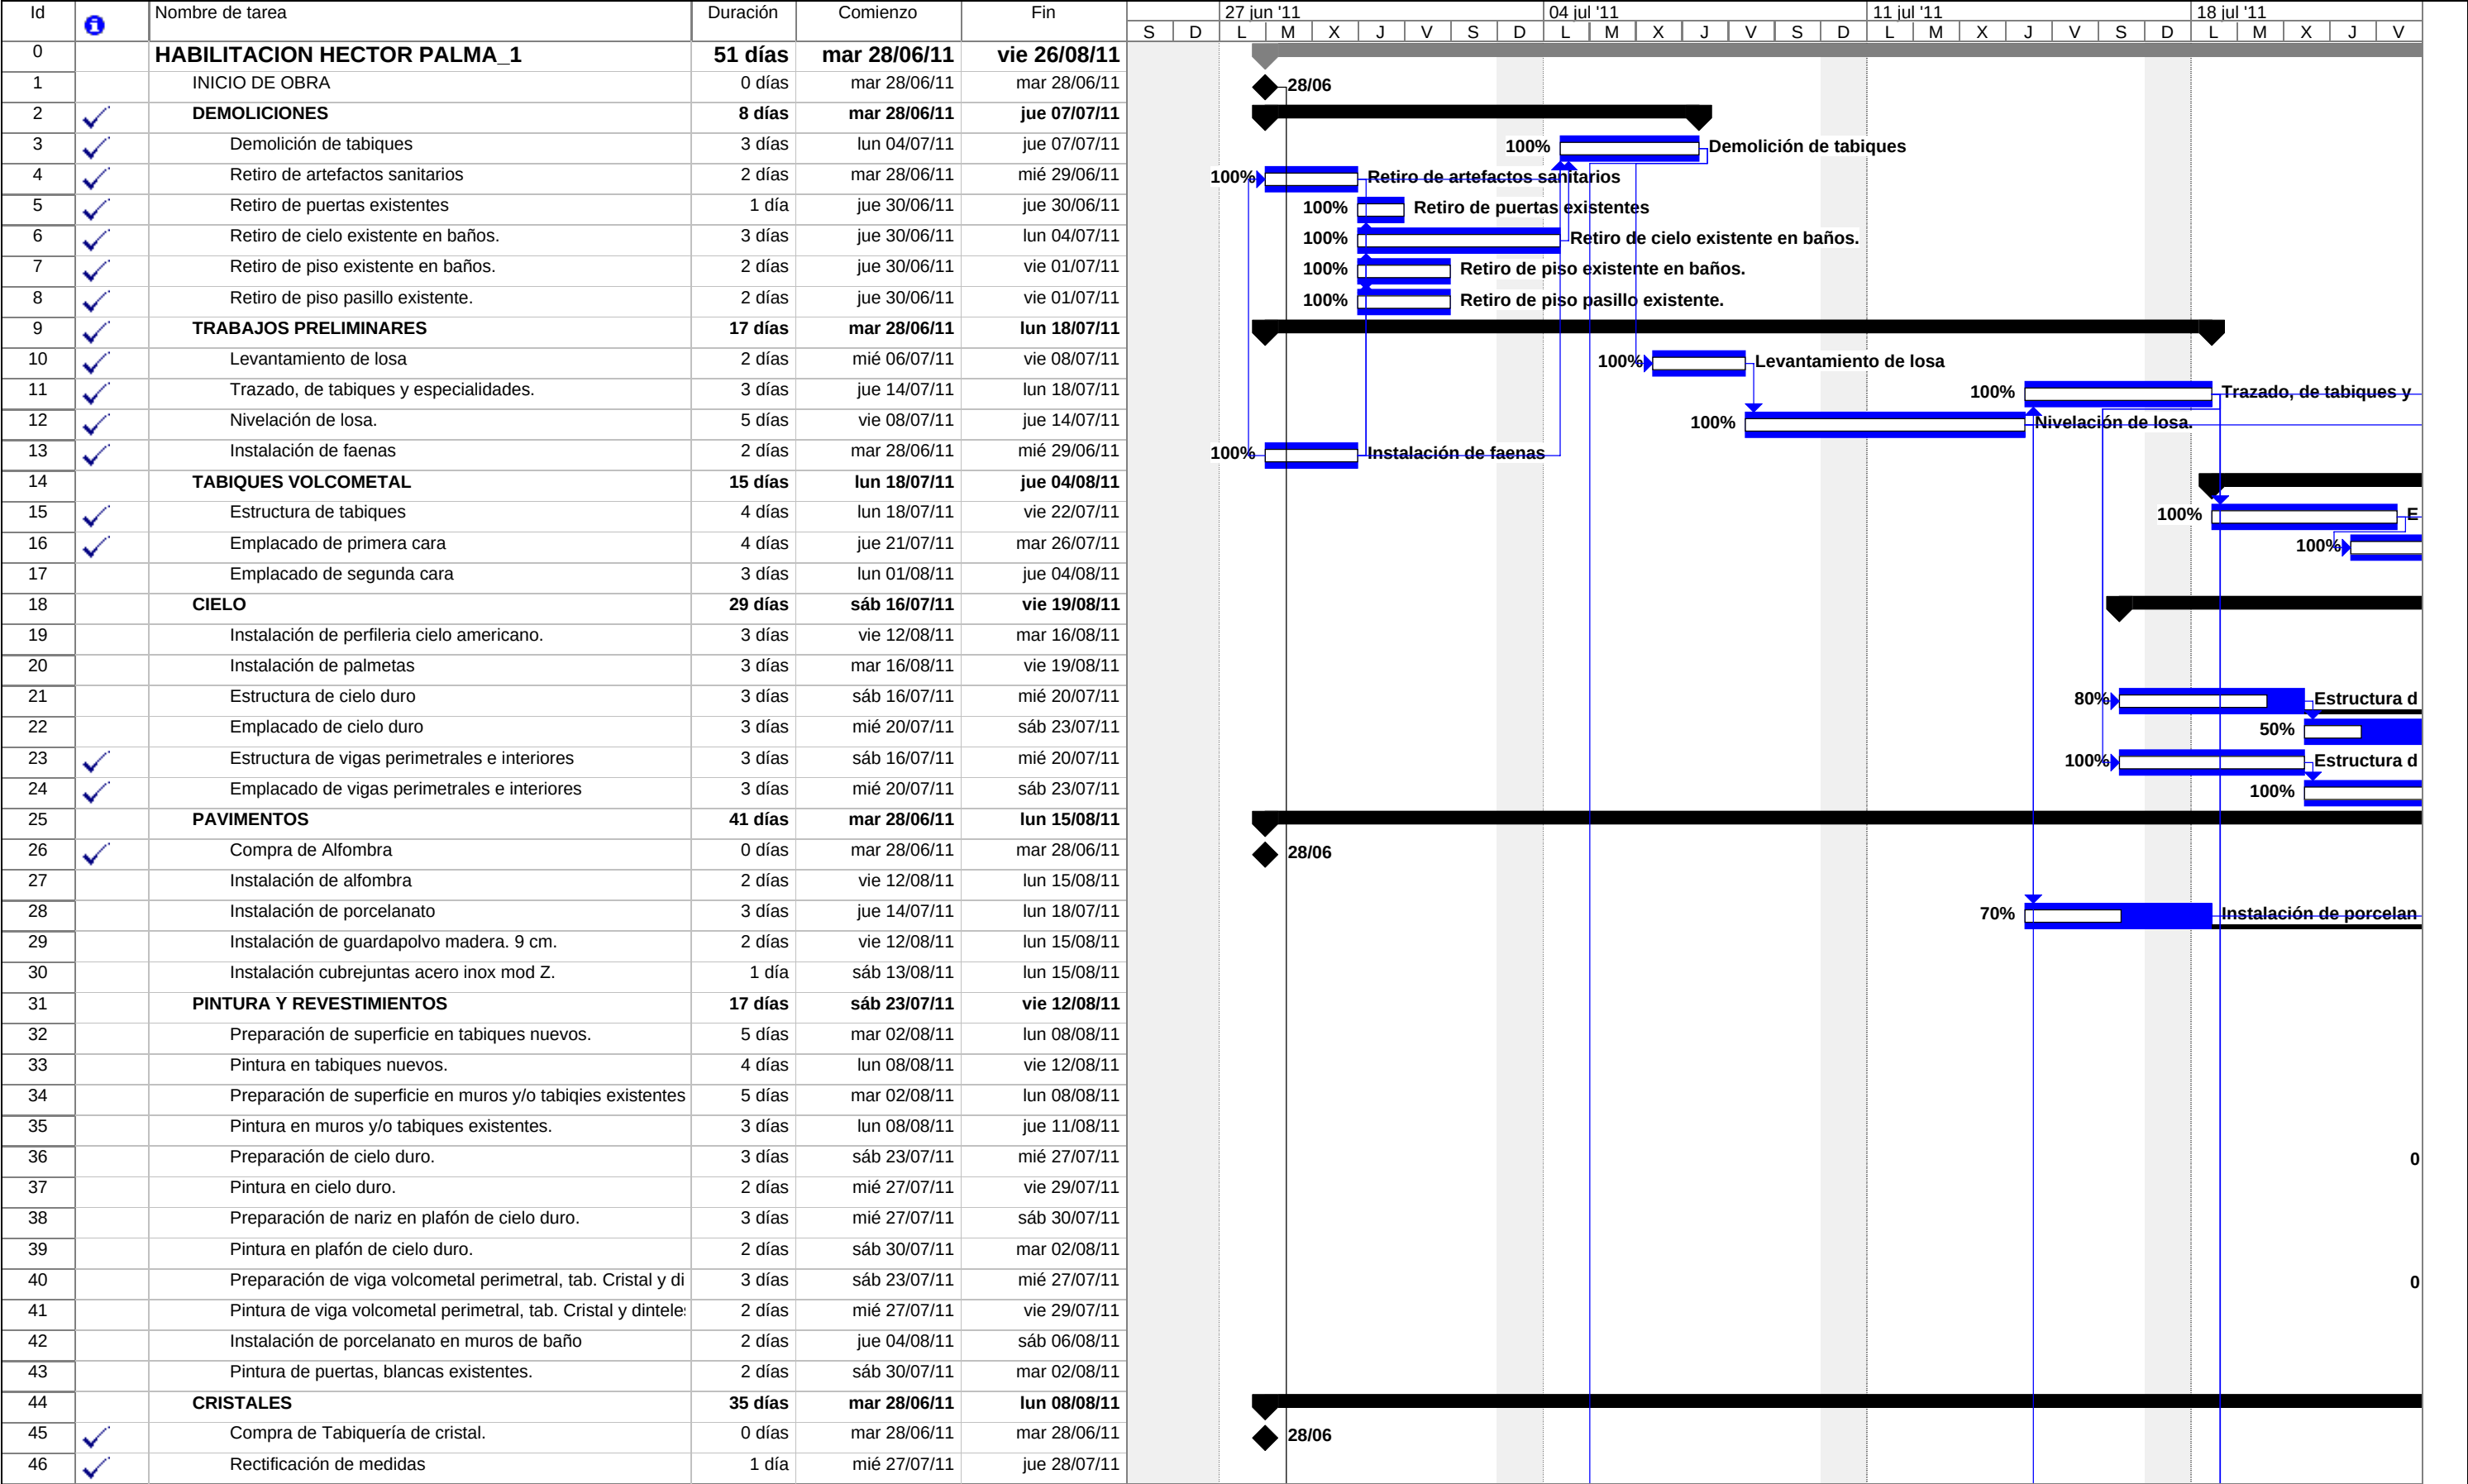

Proyecto: HABILITACION HECTOR P.
Fecha: jue 01/09/11

Tarea

Progreso de tarea

Tarea crítica

Progreso de tarea crítica

Margen de demora

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas


Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1

Id	i	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	27 jun '11							04 jul '11							11 jul '11							18 jul '11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
47		Instalación de Tabiquería de cristal.	2 días	mié 03/08/11	vie 05/08/11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

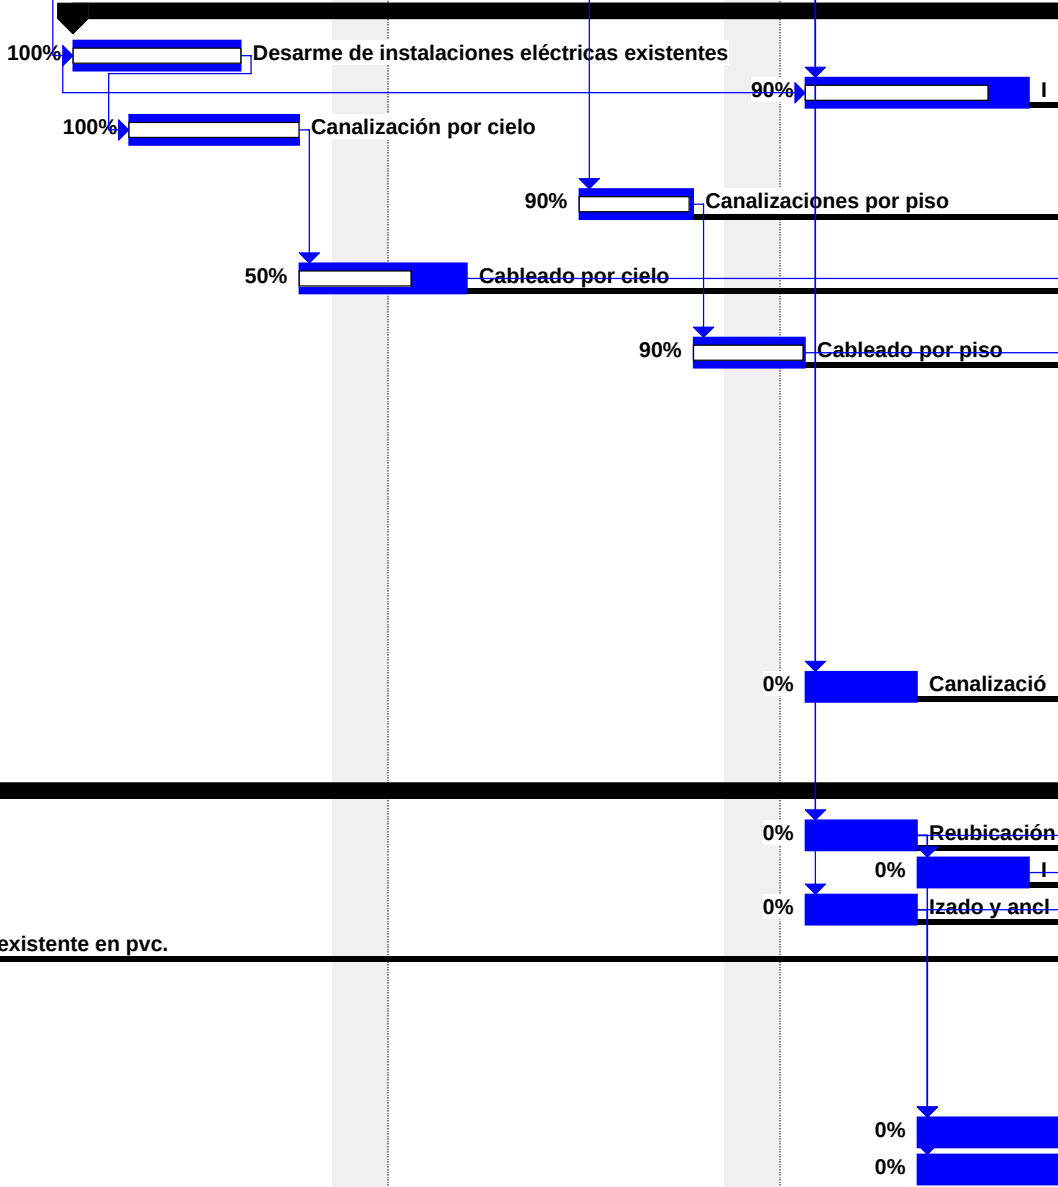

Proyecto: HABILITACION HECTOR P.
Fecha: jue 01/09/11

Tarea

Progreso de tarea

Tarea crítica

Progreso de tarea crítica

Margen de demora

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin			27 jun '11							04 jul '11							11 jul '11							18 jul '11				
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
94		MOBILIARIO	50 días	mar 28/06/11	jue 25/08/11																												
95		Compra de mobiliario y sillería	0 días	mar 28/06/11	mar 28/06/11																												
96		Rectificación de medidas	1 día	jue 04/08/11	vie 05/08/11																												
97		Llegada de mobiliario de línea a obra	1 día	lun 08/08/11	mar 09/08/11																												
98		Llegada de sillería a obra	1 día	mié 24/08/11	jue 25/08/11																												
99		Instalación de mobiliario especial	3 días	vie 12/08/11	mar 16/08/11																												
100		Instalación de Mobiliario de línea	4 días	vie 12/08/11	mié 17/08/11																												
101		Pintura final	5 días	mié 17/08/11	mar 23/08/11																												
102		VARIOS	1 día	vie 12/08/11	sáb 13/08/11																												
103		Instalación de Soporte para LCD	1 día	vie 12/08/11	sáb 13/08/11																												
104		LIMPIEZA DE OBRA	3 días	mar 23/08/11	vie 26/08/11																												
105		Limpieza de Obra final	2 días	mar 23/08/11	jue 25/08/11																												
106		Entrega provisoria	1 día	jue 25/08/11	vie 26/08/11																												

Proyecto: HABILITACION HECTOR P.
Fecha: jue 01/09/11

Tarea

Margen de demora

Tarea crítica resumida

Tareas externas

Progreso de tarea

Hito

Hito resumido

Resumen del proyecto

Tarea crítica

Resumen

Progreso resumido


Agrupar por síntesis

Progreso de tarea crítica

Tarea resumida

División

Fecha límite

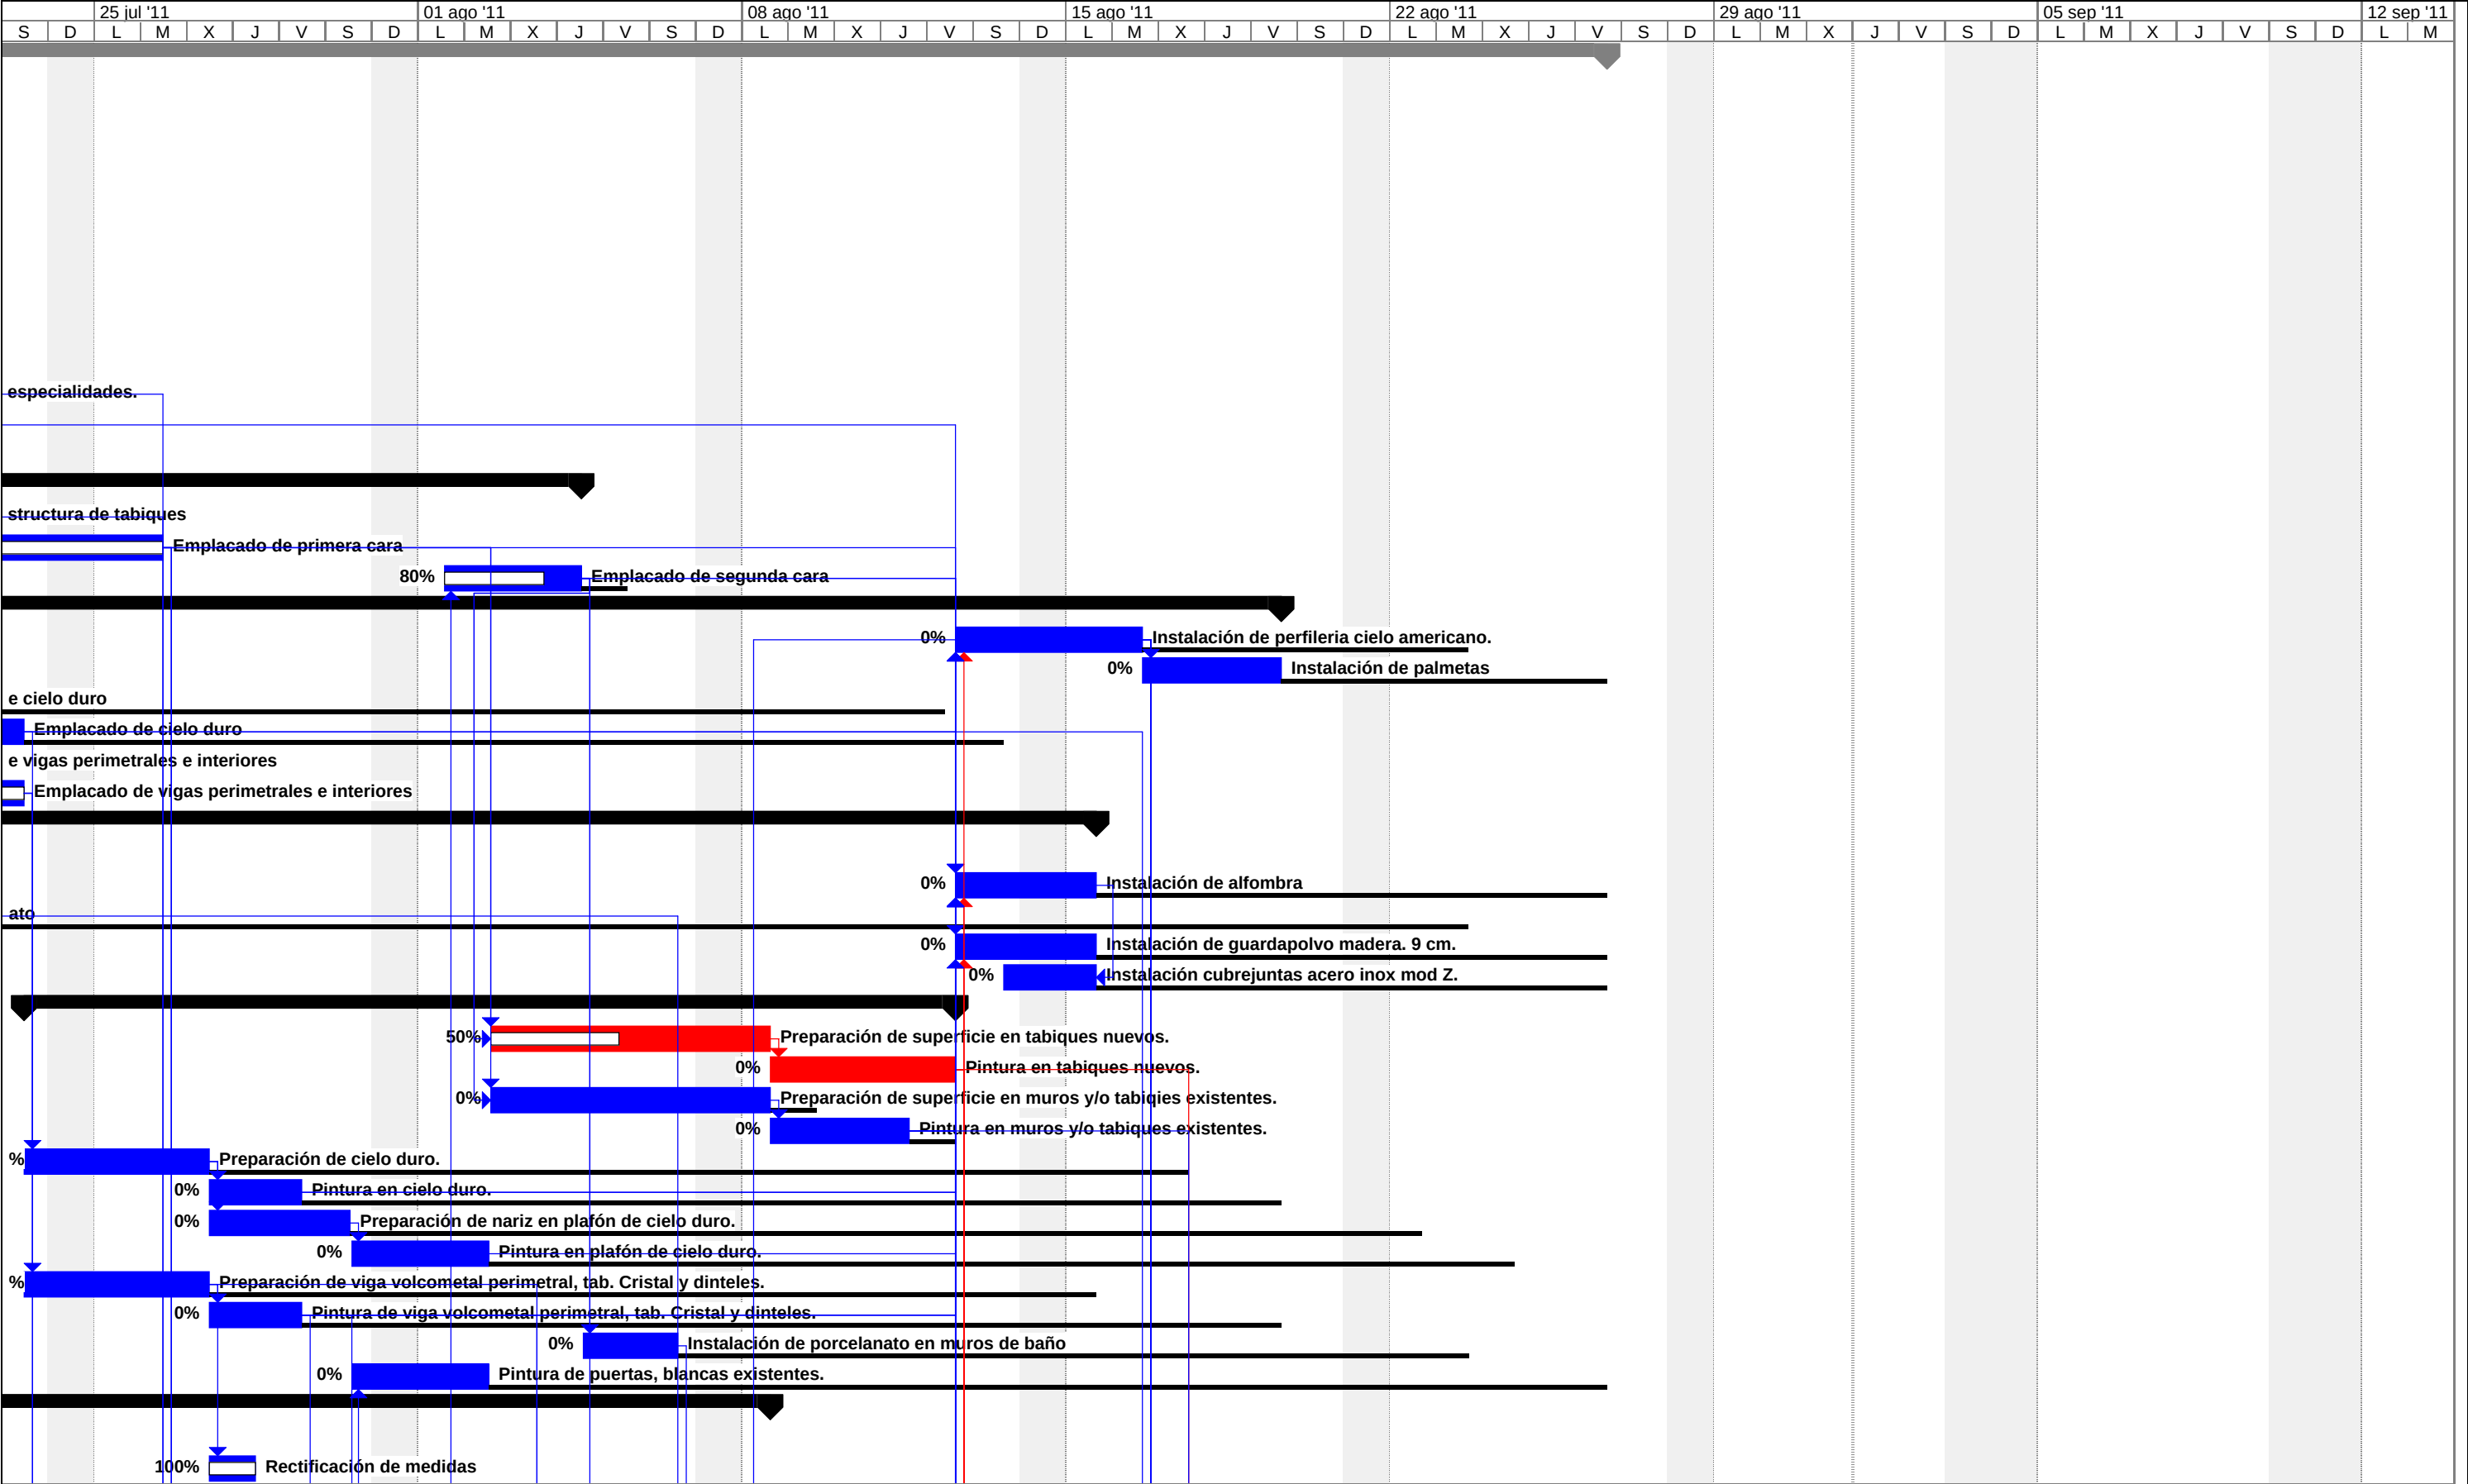

Proyecto: HABILITACION HECTOR P.
Fecha: jue 01/09/11

Tarea		Margen de demora		Tarea crítica resumida		Tareas externas	
Progreso de tarea		Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto	
Tarea crítica		Resumen		Progreso resumido		Agrupar por síntesis	
Progreso de tarea crítica		Tarea resumida		División		Fecha límite	



Proyecto: HABILITACION HECTOR P.
Fecha: jue 01/09/11

Tarea

Progreso de tarea

Tarea crítica

Progreso de tarea crítica

Margen de demora

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido


División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

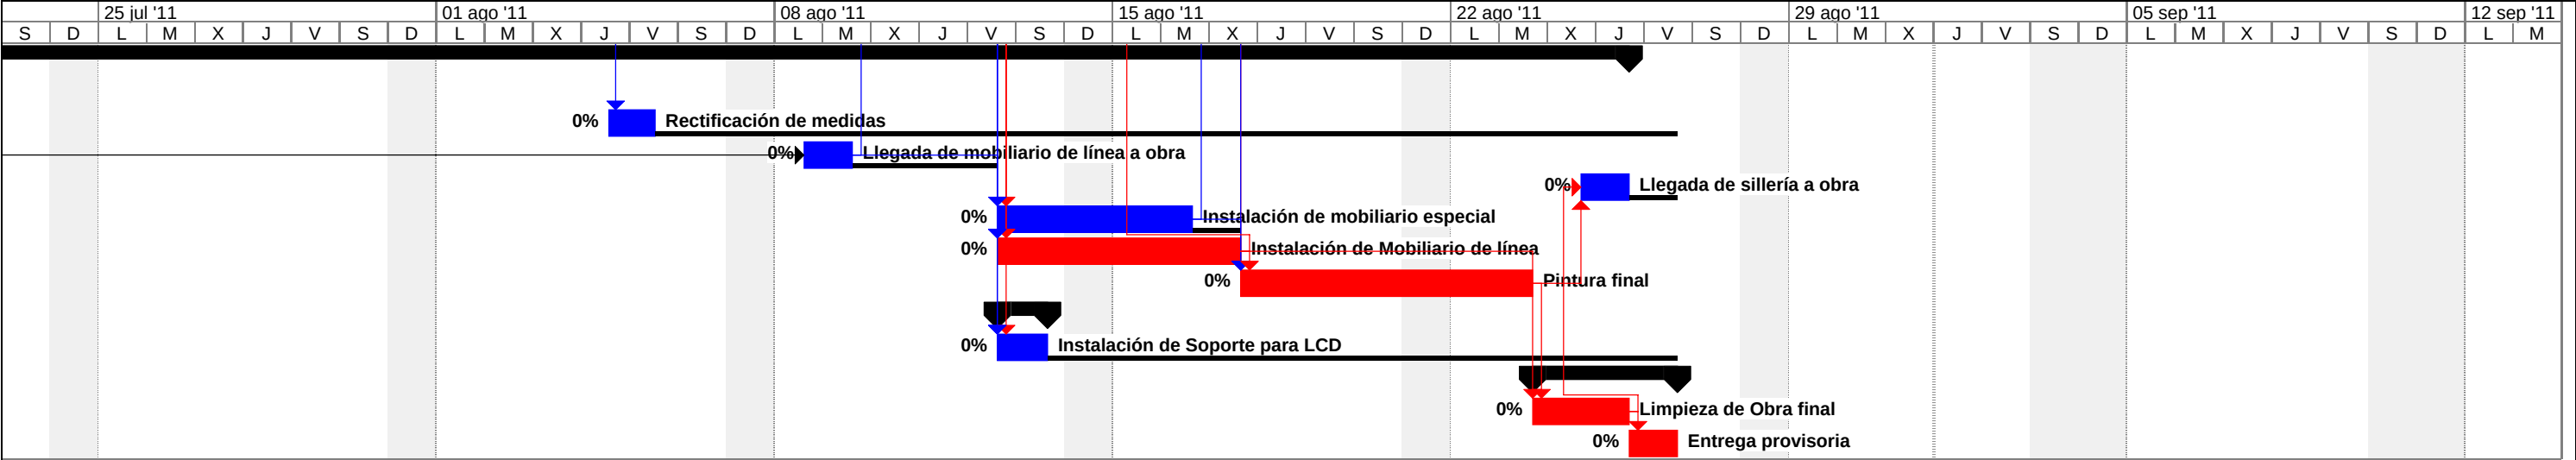

Proyecto: HABILITACION HECTOR P.
Fecha: jue 01/09/11

Tarea		Margen de demora		Tarea crítica resumida		Tareas externas	
Progreso de tarea		Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto	
Tarea crítica		Resumen		Progreso resumido		Agrupar por síntesis	
Progreso de tarea crítica		Tarea resumida		División		Fecha límite	
