



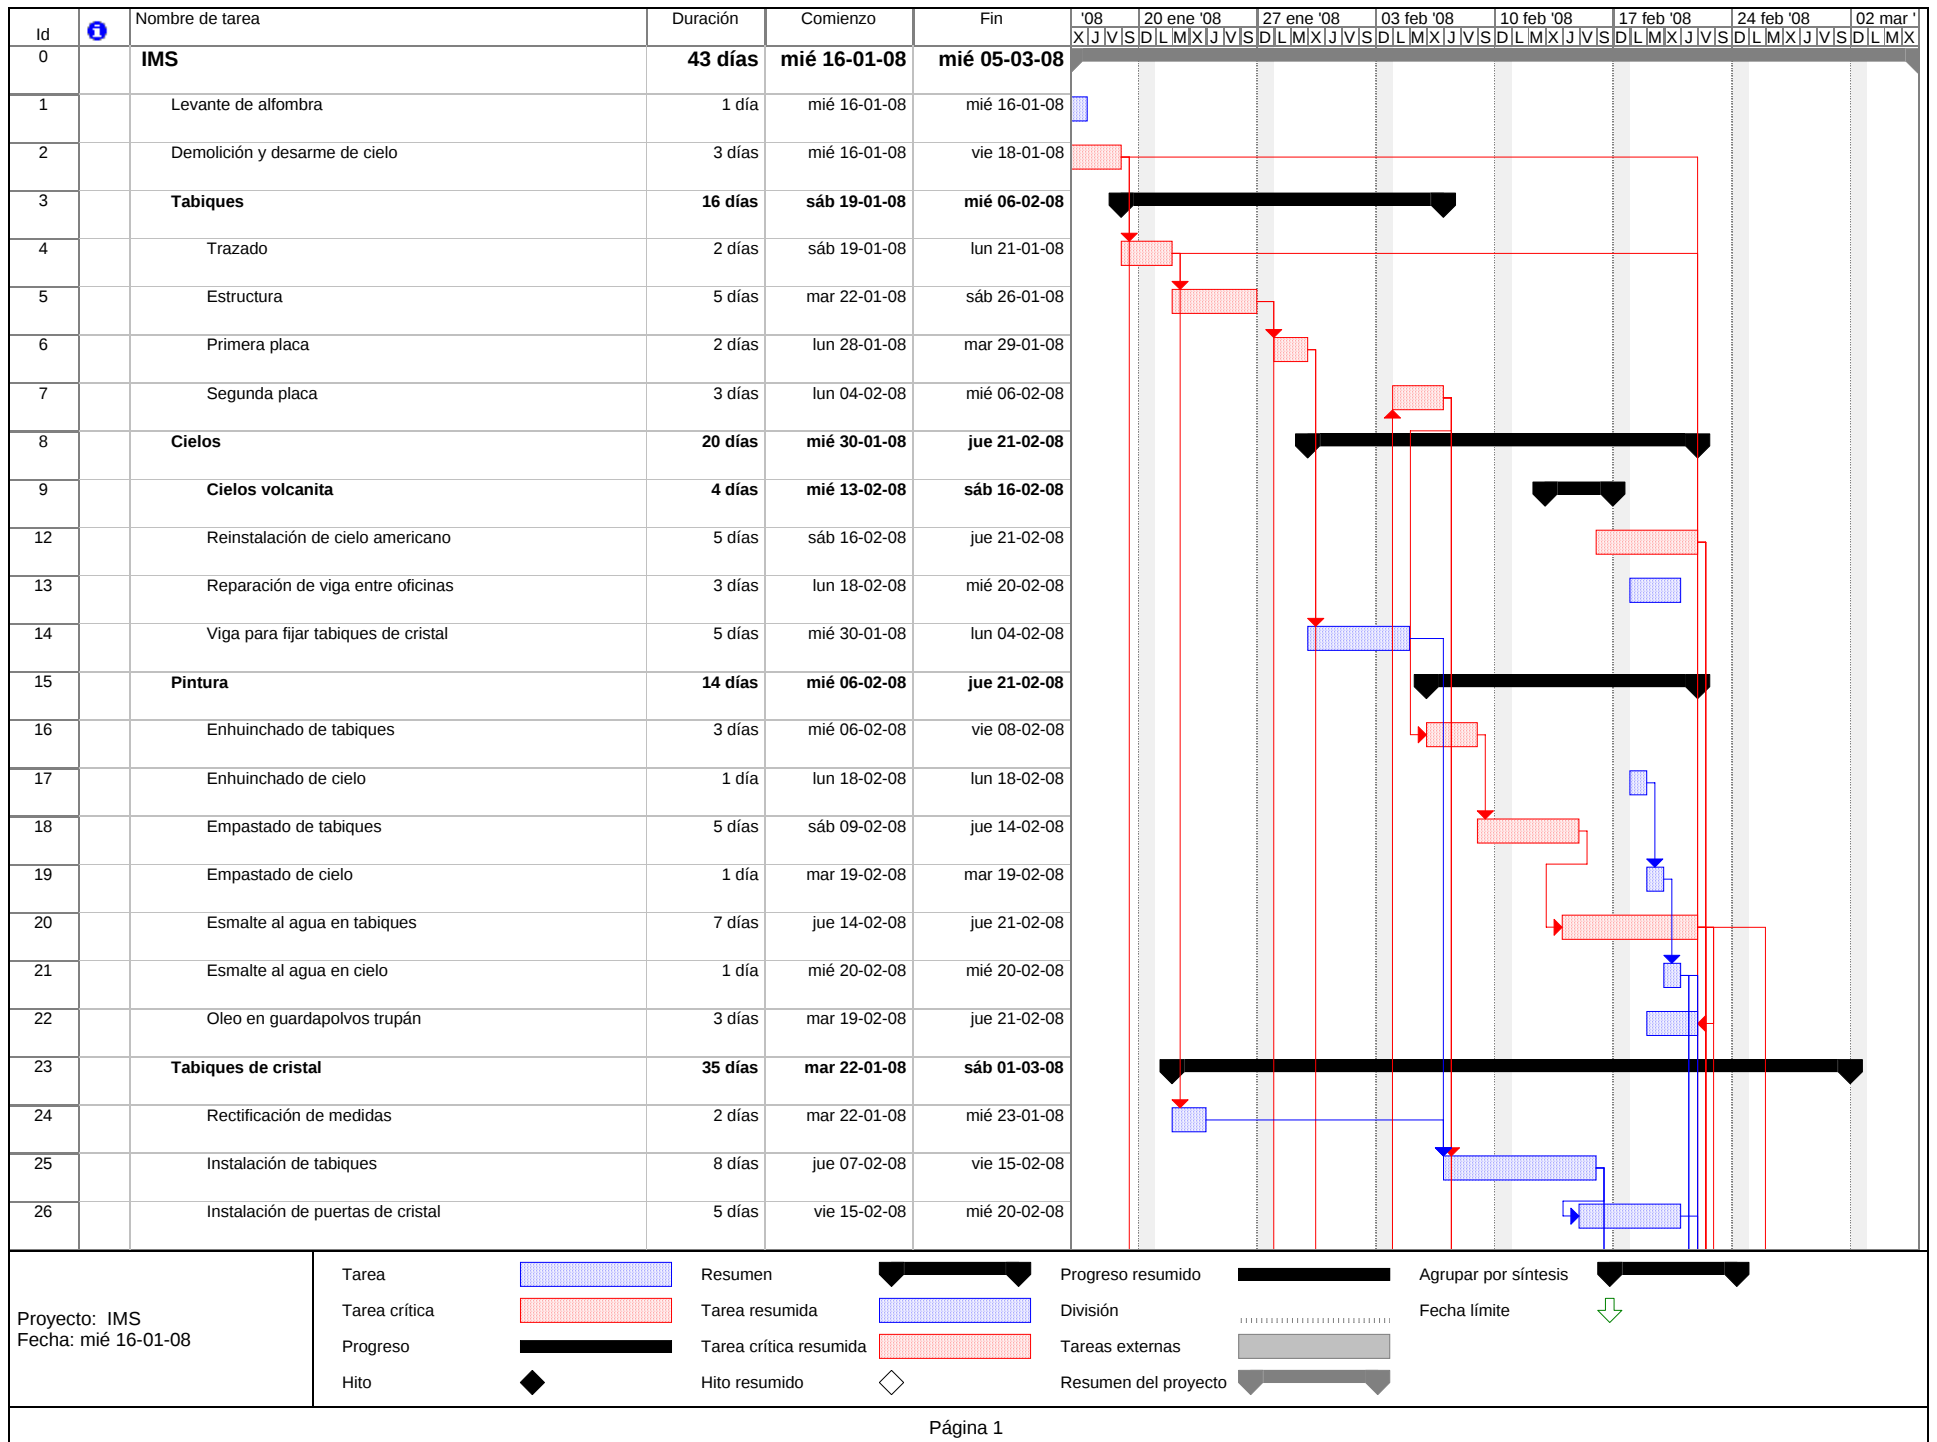

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	'08	20 ene '08	27 ene '08	03 feb '08	10 feb '08	17 feb '08	24 feb '08	02 mar '08
					XJVVSD	DLMXJJVS	DLMXJJVS	DLMXJJVS	DLMXJJVS	DLMXJJVS	DLMXJJVS	DLMXJJVS
27	Instalación de films	2 días	vie 29-02-08	sáb 01-03-08								
28	Pavimentos	32 días	sáb 19-01-08	lun 25-02-08								
29	Picado de losa	2 días	sáb 19-01-08	lun 21-01-08								
30	Colocación de alfombra	3 días	vie 22-02-08	lun 25-02-08								
31	Colocación porcelanato en cafetería	3 días	jue 07-02-08	sáb 09-02-08								
32	Colocación vinilico en server	2 días	sáb 16-02-08	lun 18-02-08								
33	Colocación guardapolvos	6 días	jue 07-02-08	mié 13-02-08								
34	Instalaciones	33 días	lun 28-01-08	mié 05-03-08								
35	Electricidad y corrientes débiles	31 días	mié 30-01-08	mié 05-03-08								
36	Canalizaciones	6 días	mié 30-01-08	mar 05-02-08								
37	Embutidas en tabique	3 días	mié 30-01-08	vie 01-02-08								
38	Sobre cielo	3 días	sáb 02-02-08	mar 05-02-08								
39	Cableado	23 días	mié 06-02-08	lun 03-03-08								
40	Cableado	10 días	mié 06-02-08	sáb 16-02-08								
41	Cableado por estaciones de trabajo	3 días	vie 29-02-08	lun 03-03-08								
42	Instalación de artefactos de iluminación	4 días	vie 22-02-08	mar 26-02-08								
43	Trabajos en el tablero	2 días	mar 04-03-08	mié 05-03-08								
44	Trabajos en el rack de comunicaciones	2 días	mar 04-03-08	mié 05-03-08								
45	Climatización	24 días	mié 06-02-08	mar 04-03-08								
46	Cableado de termostatos	3 días	mié 06-02-08	vie 08-02-08								
47	Redistribución de mangas	7 días	vie 22-02-08	vie 29-02-08								
48	Instalación de difusores y rejillas	3 días	sáb 01-03-08	mar 04-03-08								
49	Puesta en marcha	2 días	vie 29-02-08	sáb 01-03-08								
50	Detección y extinción	30 días	lun 28-01-08	sáb 01-03-08								
51	Sprinklers	23 días	lun 28-01-08	vie 22-02-08								

Proyecto: IMS Fecha: mié 16-01-08	Tarea		Resumen		Progreso resumido		Agrupar por síntesis	
	Tarea crítica		Tarea resumida		División		Fecha límite	
	Progreso		Tarea crítica resumida		Tareas externas			
	Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto			

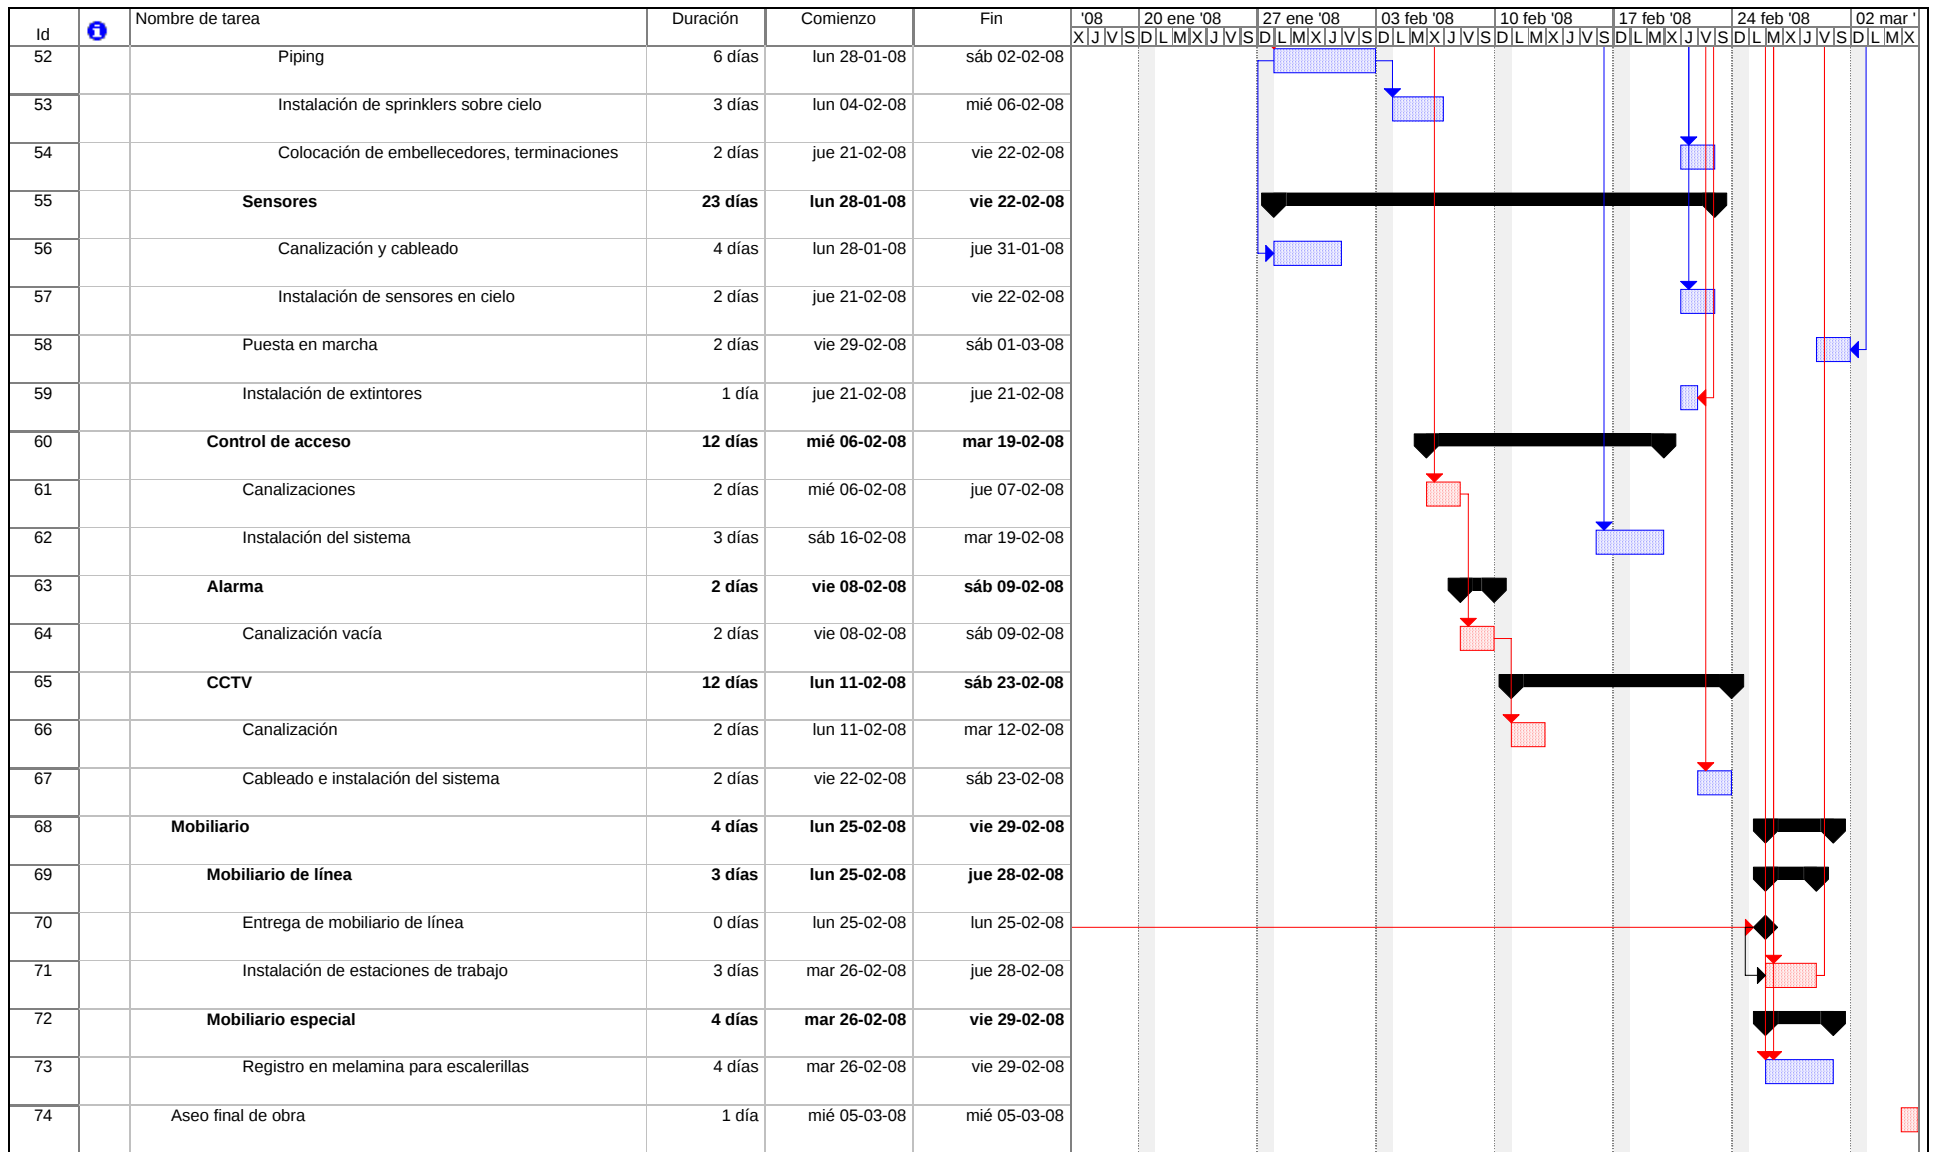

Proyecto: IMS

Fecha: mié 16-01-08

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
