


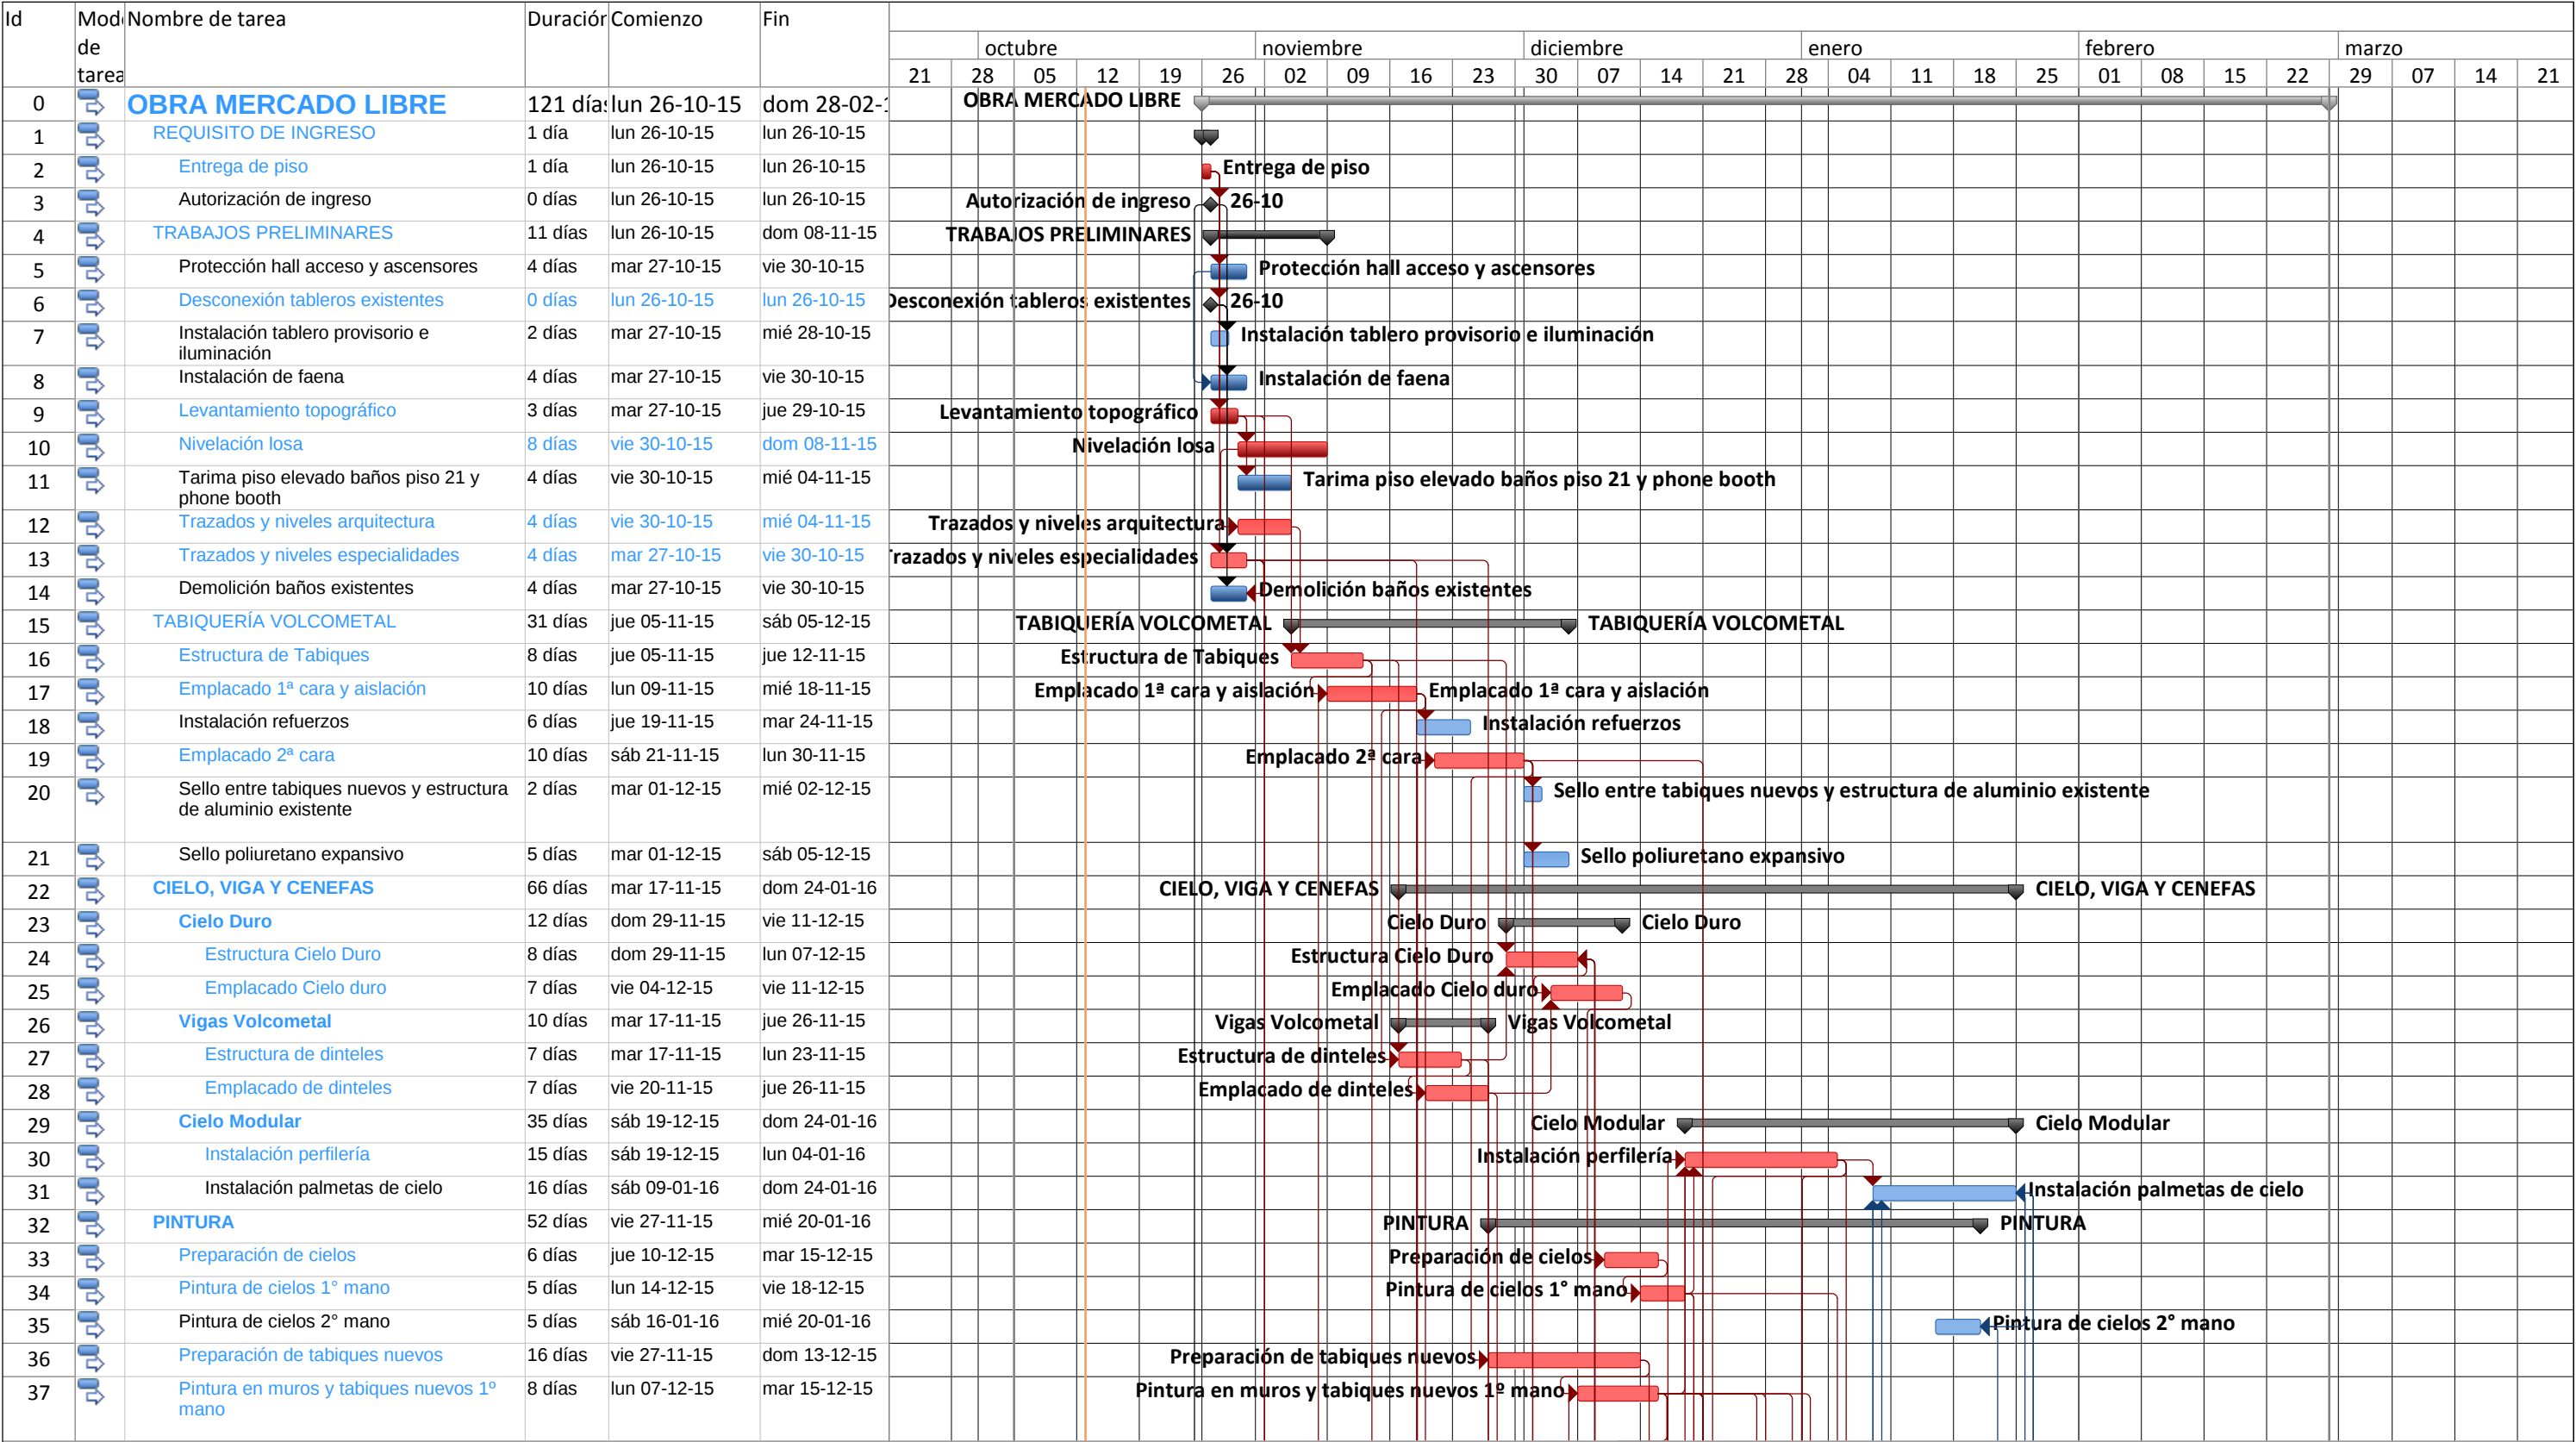

Proyecto: OBRA MERCADO LIBRE
Fecha: mar 13-10-15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

◀▶

◀▶

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◆

◀▶

◀▶

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

↓

Id	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duraciór	Comienzo	Fin																												
						octubre							noviembre				diciembre				enero					febrero				marzo			
						21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	07	14	21	
112		PUERTAS	18 días	sáb 12-12-15	jue 31-12-15																												
113		Rectificación de medidas en terreno	0 días	sáb 12-12-15	sáb 12-12-15																												
114		Instalación de puertas madera	10 días	lun 21-12-15	jue 31-12-15																												
115		Instalación de puertas cristal (picado quicio e instalación hoja cristal)	6 días	lun 21-12-15	dom 27-12-15																												
116		ESTRUCTURA DE LAVAPLATO	2 días	jue 31-12-15	sáb 02-01-16																												
117		Instalación estructura de lavaplatato	2 días	jue 31-12-15	sáb 02-01-16																												
118		MOBILIARIO ESPECIAL	43,5 días	lun 16-11-15	jue 31-12-15																												
119		Llegada de mobiliario a Obra	0 días	mié 30-12-15	mié 30-12-15																												
120		Instalación y armado	20 días	jue 31-12-15	mié 20-01-16																												
121		Muebles especiales kitchenette	6 días	dom 27-12-15	sáb 02-01-16																												
122		MOBILIARIO EDE LÍNEA	27 días	dom 03-01-16	vie 29-01-16																												
123		Llegada de mobiliario de línea a Obra	3 días	dom 03-01-16	mar 05-01-16																												
124		Instalación y armado mobiliario línea	25 días	mar 05-01-16	vie 29-01-16																												
125		CORTINAS	53 días	lun 23-11-15	lun 18-01-16																												
126		Perforaciones para fijaciones	9 días	sáb 12-12-15	dom 20-12-15																												
127		Instalación de cortinas	6 días	vie 29-01-16	mié 03-02-16																												
128		ASEO DE OBRA	10 días	vie 29-01-16	dom 07-02-16																												
129		Aseo final	10 días	vie 29-01-16	dom 07-02-16																												
130		ENTREGA DE OBRA 21 Y 22	1 día	lun 08-02-16	lun 08-02-16																												
131		Entrega provisoria de obra PISOS 21 Y 22 día 101	1 día	lun 08-02-16	lun 08-02-16																												
132		ENTREGA DE OBRA 20	1 día	dom 28-02-16	dom 28-02-16																												
133		Entrega provisoria de obra PISO 20 día 121	1 día	dom 28-02-16	dom 28-02-16																												

Proyecto: OBRA MERCADO LIBRE
Fecha: mar 13-10-15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

[illegible]

Proyecto: OBRA MERCADO LIBRE Fecha: mar 13-10-15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		División crítica	
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo		Progreso	

TURADO

Proyecto: OBRA MERCADO LIBRE
Fecha: mar 13-10-15

[illegible]

Proyecto: OBRA MERCADO LIBRE Fecha: mar 13-10-15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		División crítica	
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo		Progreso	

[illegible]

Proyecto: OBRA MERCADO LIBRE Fecha: mar 13-10-15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		División crítica	
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo		Progreso	
