CLIENTE: MWH
OBRA: REMODELACION OFICINAS
DIR.: MARCELO T. ALVEAR 612. ENTREPISO.

contract

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**MWH**	**50 días**	**mié 28/10/09**	**mar 29/12/09**
2	Aprobación de presupuesto	0 días	mié 28/10/09	mié 28/10/09
3	Fin de Demolición	0 días	jue 29/10/09	jue 29/10/09
4	Firma Contrato	0 días	mar 03/11/09	mar 03/11/09
5	Tablero de obra	2 días	jue 29/10/09	vie 30/10/09
6	LayOut final	0 días	mié 28/10/09	mié 28/10/09
7	Canalizaciones eléctricas	7 días	lun 09/11/09	lun 16/11/09
8	Reparaciones electricas	8 días	mié 11/11/09	jue 19/11/09
9	Cableado	8 días	vie 20/11/09	sáb 28/11/09
10	Armado de tableros	6 días	lun 30/11/09	sáb 05/12/09
11	Tablero Aire	3 días	jue 19/11/09	sáb 21/11/09
12	Armado de fichas y tomas	3 días	lun 07/12/09	mié 09/12/09
13	Armado de iluminación	7 días	lun 30/11/09	lun 07/12/09
14	Armado de puestos de trabajo	5 días	lun 21/12/09	mar 29/12/09
15				
16	**CONTRACT**	**54 días**	**jue 29/10/09**	**mar 05/01/10**
17	S e H.	5 días	jue 29/10/09	mié 04/11/09
18	Relevamiento de piso	2 días	jue 29/10/09	vie 30/10/09
19	Inicio de obra	0 días	mié 04/11/09	mié 04/11/09
20	Replanteo en obra	3 días	jue 05/11/09	sáb 07/11/09
21	Estructura tabiques	5 días	lun 09/11/09	vie 13/11/09
22	Estructura cielorrasos	5 días	sáb 14/11/09	jue 19/11/09
23	Reparación de carpetas	4 días	lun 09/11/09	jue 12/11/09
24	Montaje equipos Aire	4 días	sáb 14/11/09	mié 18/11/09
25	Desagües de equipos	5 días	jue 19/11/09	mar 24/11/09
26	Conductos de equipos	5 días	lun 23/11/09	vie 27/11/09
27	Emplacado tabiques	4 días	mar 17/11/09	vie 20/11/09
28	Emplacado Cielorrasos	4 días	sáb 21/11/09	mié 25/11/09
29	Provisión artefactos iluminación	2 días	vie 27/11/09	sáb 28/11/09
30	Provisión y colocación alfombra	4 días	jue 26/11/09	lun 30/11/09
31	Provisión y colocación zócalos	4 días	mar 01/12/09	vie 04/12/09
32	Preparación de superficies p/ pintar	9 días	jue 26/11/09	sáb 05/12/09
33	Puesta a punto baños	3 días	lun 07/12/09	mié 09/12/09
34	Pintura	14 días	lun 07/12/09	mar 22/12/09
35	Provisión y armado de puestos	5 días	jue 17/12/09	mar 22/12/09
36	Provision y colocacion film	3 días	lun 21/12/09	mié 23/12/09
37	Varios y terminaciones	7 días	lun 28/12/09	mar 05/01/10

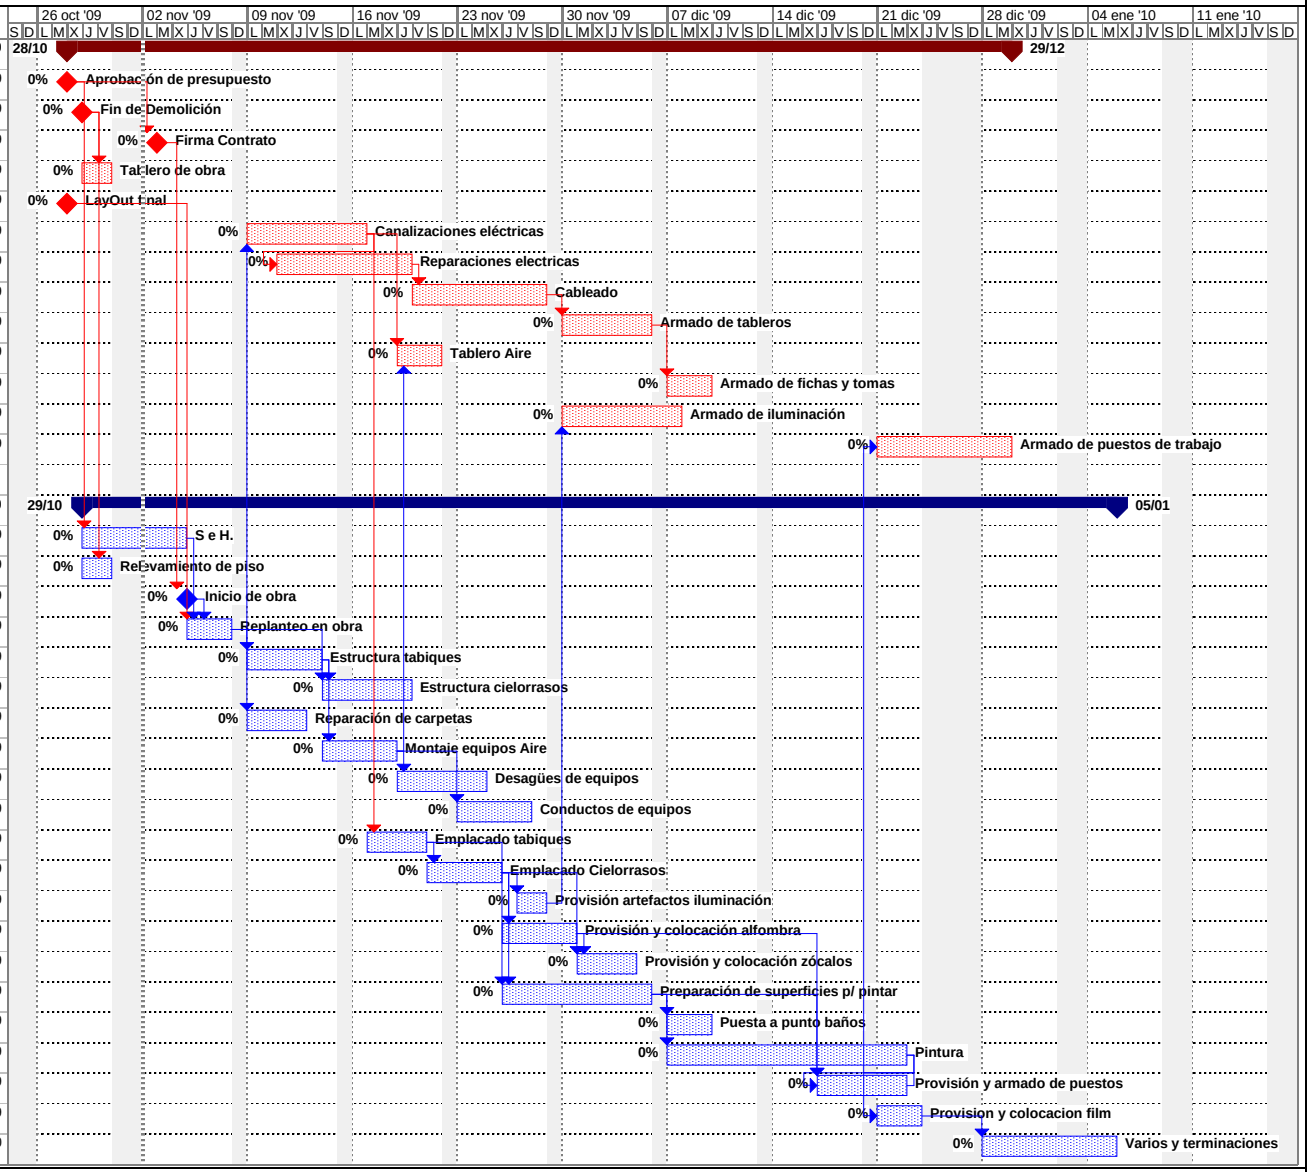

Proyecto: MWH_Proyect 00
Fecha: lun 02/11/09

Tarea		Resumen		Progreso resumido		Resumen del proyecto	
Progreso		Tarea resumida		División		Agrupar por síntesis	
Hito		Hito resumido		Tareas externas		Fecha límite	
