Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**OBRA PHILIPS**	**101 días**	**lun 21/11/11**	**mié 29/02/12**
2	**ETAPA 1**	**50 días**	**lun 21/11/11**	**lun 30/01/12**
3	**Hitos de entregas**	**31 días**	**mié 23/11/11**	**vie 06/01/12**
4	Definiciones de proyecto	0 días	vie 25/11/11	vie 25/11/11
5	Catalogos de luminarias a instalar	0 días	mié 23/11/11	mié 23/11/11
6	Entrega de alfombra	0 días	lun 26/12/11	lun 26/12/11
7	Entrega de muebles de linea	0 días	vie 06/01/12	vie 06/01/12
8	Entrega de Luminarias	0 días	mar 20/12/11	mar 20/12/11
9	Entrega de equipos de clima	0 días	jue 24/11/11	jue 24/11/11
10	**PISO 4**	**44 días**	**lun 21/11/11**	**vie 20/01/12**
11	Servidor	44 días	lun 21/11/11	vie 20/01/12
12	Cierre Hall	44 días	lun 21/11/11	vie 20/01/12
13	Piso Hall	44 días	lun 21/11/11	vie 20/01/12
14	Cielo hall	44 días	lun 21/11/11	vie 20/01/12
15	**PISO 6 y 7**	**50 días**	**lun 21/11/11**	**lun 30/01/12**
16	Puestos de trabajo operativos	44 días	lun 21/11/11	vie 20/01/12
17	Baños terminados.	44 días	lun 21/11/11	vie 20/01/12
18	Entrega provisoria etapa 1	0 días	sáb 21/01/12	sáb 21/01/12
19	Ajuste y terminaciones	6 días	sáb 21/01/12	lun 30/01/12
20	**ETAPA 2**	**28,89 días**	**sáb 21/01/12**	**mié 29/02/12**
21	**PISO 4**	**28 días**	**sáb 21/01/12**	**mié 29/02/12**
22	Entrega de showroom completo (excepto muebles	28 días	sáb 21/01/12	mié 29/02/12
23	Mueble de recepción	28 días	sáb 21/01/12	mié 29/02/12
24	**PISO 5, 6 y 7**	**28 días**	**sáb 21/01/12**	**mié 29/02/12**
25	Salas de reunión pisos 5, 6 y 7	28 días	sáb 21/01/12	mié 29/02/12
26	Salas Touch Down	28 días	sáb 21/01/12	mié 29/02/12
27	Revestimientos de madera	28 días	sáb 21/01/12	mié 29/02/12
28	**Pisos 4, 5, 6 y 7**	**28,89 días**	**sáb 21/01/12**	**mié 29/02/12**
29	Muebles especiales	28 días	sáb 21/01/12	mié 29/02/12
30	Separadores acrilicos	28 días	sáb 21/01/12	mié 29/02/12
31	Entrega provisoria etapa 2	0 días	mar 21/02/12	mar 21/02/12
32	Detalles de terminacion general	7 días	mar 21/02/12	mié 29/02/12

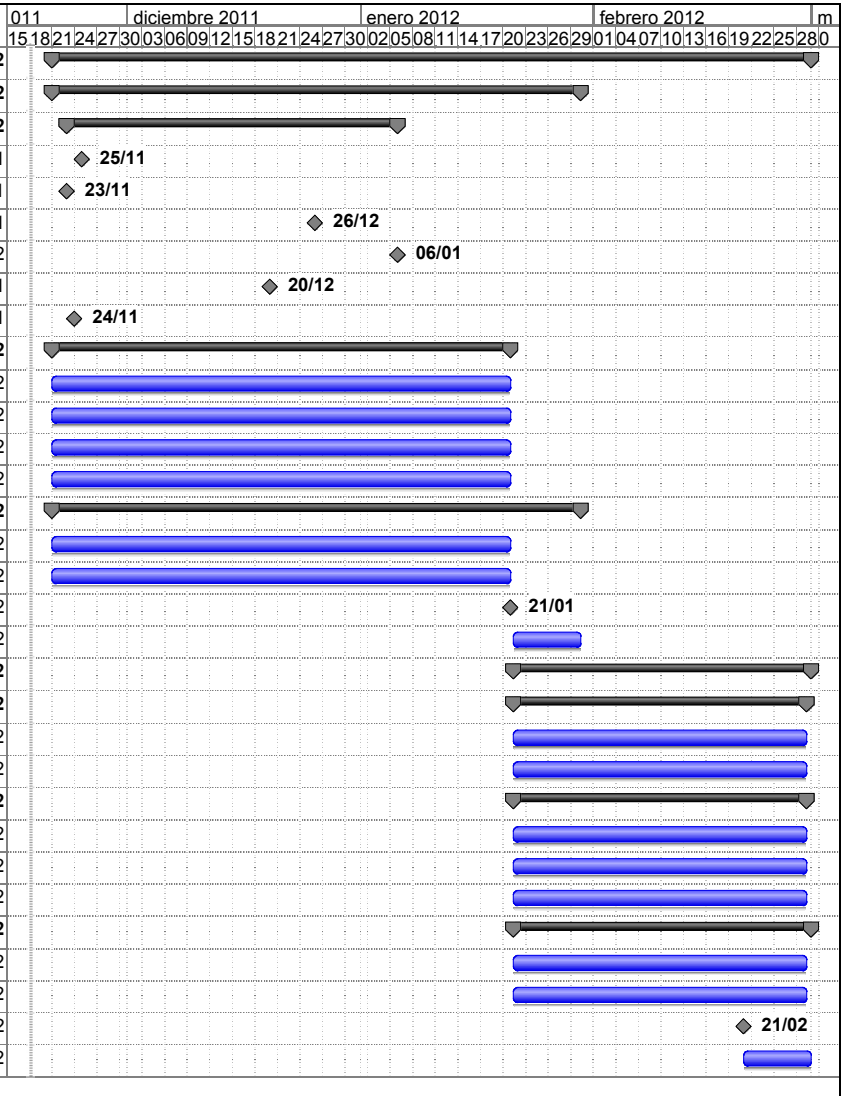

Proyecto: Philips Comercial 1
Fecha: vie 18/11/11

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Progreso		Hito resumido		Resumen del proyecto	
Hito		Progreso resumido		Agrupar por síntesis	
Resumen		División		Fecha límite	

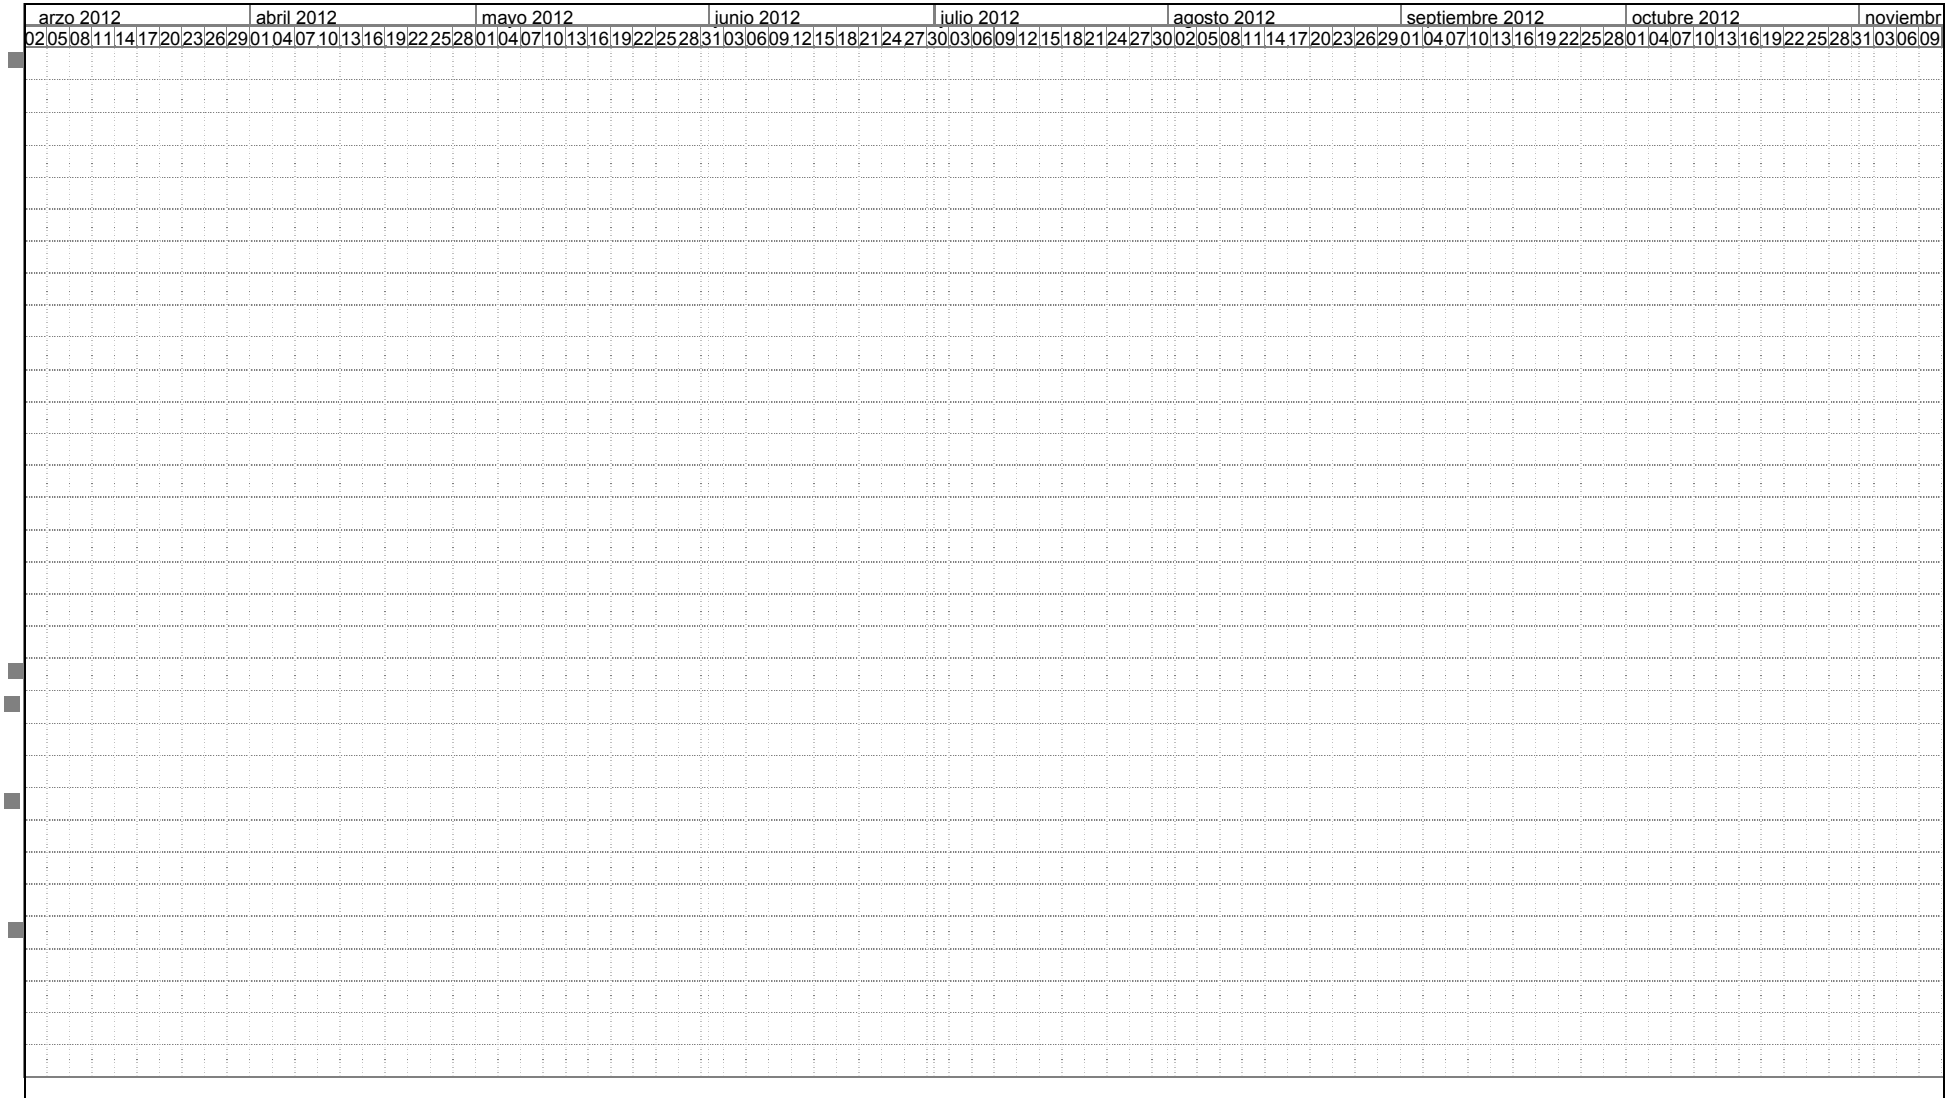

Proyecto: Philips Comercial 1
Fecha: vie 18/11/11

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Progreso		Hito resumido		Resumen del proyecto	
Hito		Progreso resumido		Agrupar por síntesis	
Resumen		División		Fecha límite	
