CRONOGRAMA GENERAL DE TAREAS - GE EDIFICIO DOT

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1				
2	**TAREAS DE OBRAS**	**97 días**	**mié 30/11/11**	**lun 05/03/12**
3	START POINT	1 día	mié 30/11/11	mié 30/11/11
4	PRELIMINARES / ART/ SEGUROS	1 día	jue 01/12/11	jue 01/12/11
5	DESARMES C y PT EXISTENTES	4 días	vie 02/12/11	lun 05/12/11
6	ALBAÑILERIA AYUDA GREMIOS	4 días	mié 30/11/11	sáb 03/12/11
7	INSTALAC. ELECTRICA ILUMINACION	16 días	mar 06/12/11	lun 26/12/11
8	INSTALAC. ELECTRICA ILUM.CABLEADOS	15 días	mar 27/12/11	mar 10/01/12
9	INSTALAC. ELECTRICA ENERGIA	24 días	mar 06/12/11	jue 29/12/11
10	INSTAL.ELECTRICA ENERGI A CABLEADOS	15 días	vie 30/12/11	vie 13/01/12
11	INSTALAC. AIRE ACONDICIONADO	20 días	jue 08/12/11	mar 27/12/11
12	INSTALAC. DETECCION DE INCENDIO	12 días	dom 04/12/11	jue 15/12/11
13	INSTALAC. ESPECIALES	12 días	dom 04/12/11	jue 15/12/11
14	INSTALAC ESPECIALES CABLEADOS	17 días	vie 16/12/11	dom 01/01/12
15	TERMINACIONES DE INSTALACIONES	7 días	mié 25/01/12	mar 31/01/12
16	TABIQUES DURLOCK	16 días	mar 06/12/11	mié 21/12/11
17	CIELORRASOS GENERALES	14 días	vie 30/12/11	jue 12/01/12
18	CIELORASOS EXISTENTES AJUSTES	5 días	vie 13/01/12	mar 17/01/12
19	SOLADOS /ALFOMBRAS	11 días	jue 26/01/12	dom 05/02/12
20	PISO TECNICO AJUSTES	15 días	jue 22/12/11	jue 05/01/12
21	ZOCALOS	3 días	lun 06/02/12	mié 08/02/12
22	PINTURA Y REVESTIMIENTOS	35 días	jue 22/12/11	mié 25/01/12
23	CARPINTERIAS Y HERRAJES	15 días	dom 25/12/11	dom 08/01/12
24	HERRERIAS	3 días	jue 22/12/11	sáb 24/12/11
25	TABIQUERIA VIDRIADA FABRICAC	39,5 días	jue 01/12/11	lun 09/01/12
26	TABIQUERIA VIDRIADA COLOCAC. OBRA	15 días	lun 09/01/12	mar 24/01/12
27	TABIQUES DATA CENTER	3 días	jue 22/12/11	sáb 24/12/11
28	PISO TECNICO DATA CENTER	3 días	dom 25/12/11	mar 27/12/11
29	INSTALAC. DATA CENTER	10 días	mié 28/12/11	vie 06/01/12
30	PUERTA F60 DATA CENTER	3 días	dom 25/12/11	mar 27/12/11
31	AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER	8 días	mié 28/12/11	mié 04/01/12
32	CABLEADO ESTUCTURADO GRAL	22 días	vie 30/12/11	vie 20/01/12
33	CABLEADO ESTRUCTURADO WORKSTAT.	8 días	sáb 18/02/12	sáb 25/02/12
34	COLOCAC ARTEFACTOS ILUMINACION	12 días	vie 13/01/12	mar 24/01/12
35	GRAFICA GENERAL	9 días	lun 06/02/12	mar 14/02/12
36	CORTINAS GENERALES	12 días	lun 06/02/12	vie 17/02/12
37	MUEBLES ESPECIALES (EN OBRA)	10 días	mié 25/01/12	vie 03/02/12
38	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	6 días	vie 24/02/12	mié 29/02/12
39	LIMPIEZA FINA DE OBRA	5 días	jue 01/03/12	lun 05/03/12

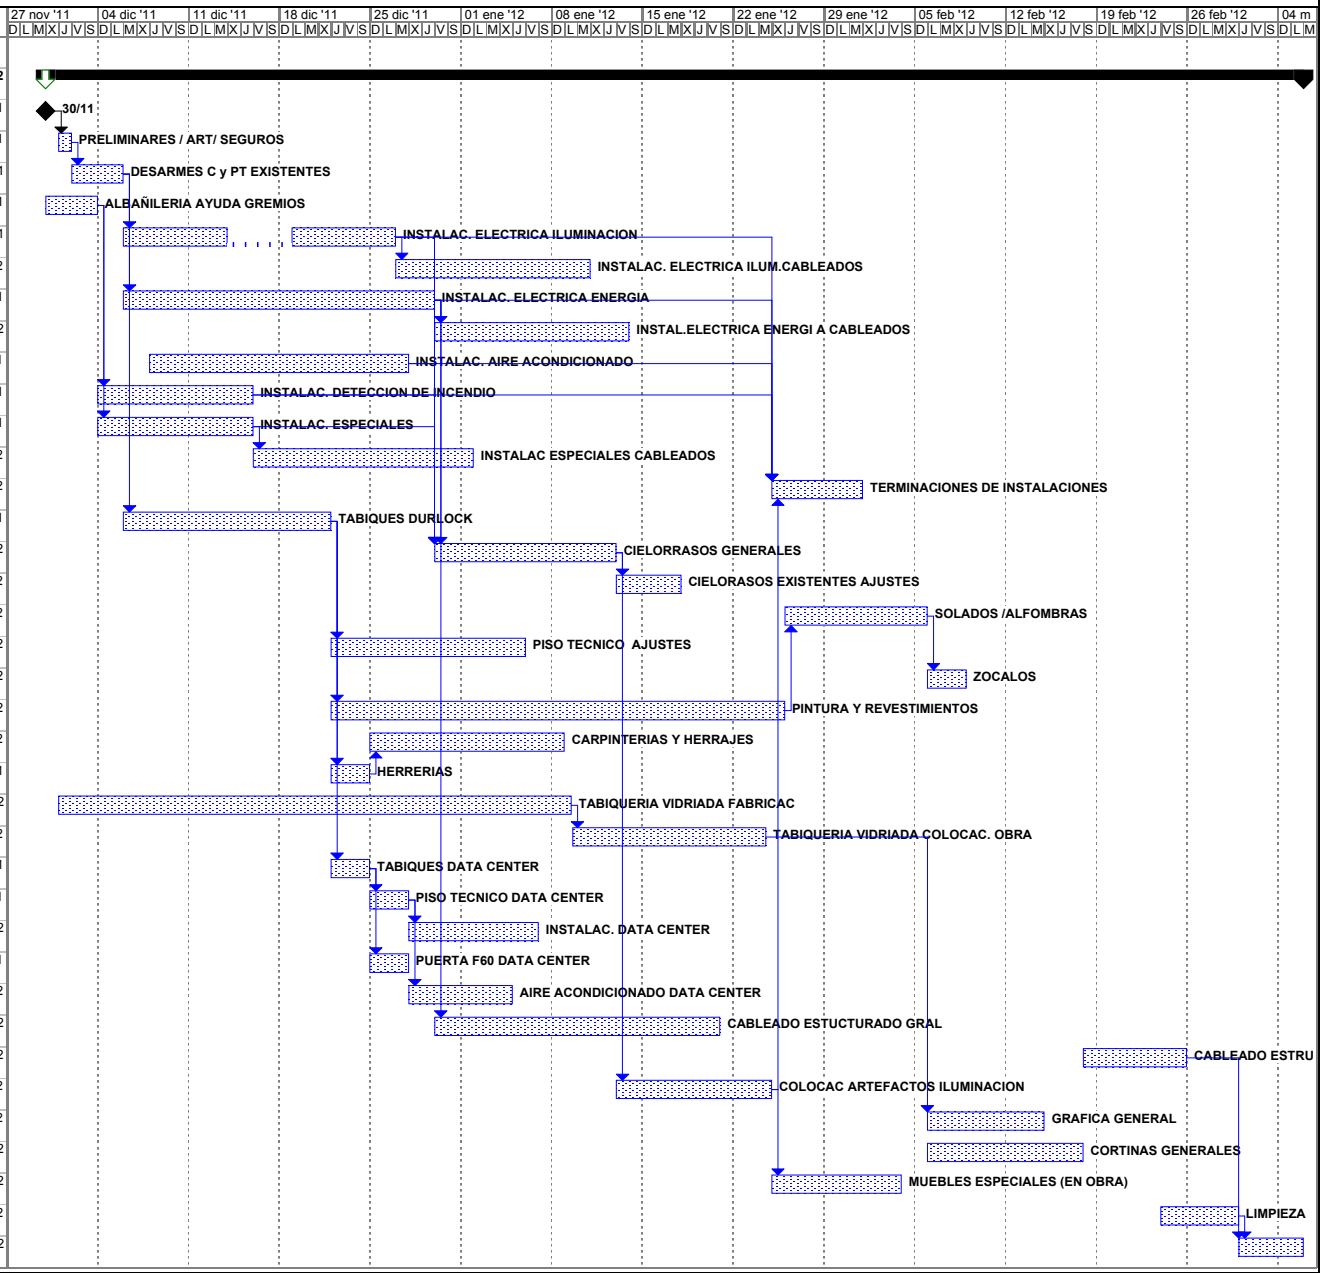

Proyecto: GE DOT CRONOGRAMA GENERAL v3
Fecha: vie 25/11/11

Tarea		Progreso		Resumen		Tareas externas		Fecha límite
División		Hito		Resumen del proyecto		Hito externo	
